



# 민선7기 공약사업 추진실적 점검결과

[2019. 3월말 기준]



# 민선 7기 공약사업 추진실적 점검결과

◇ 2019년 3월말 기준 민선7기 군수 공약 추진실적 점검결과임

## I 민선7기 공약사업 목표

꿈과 희망이 넘치는 **레인보우** 영동

전국 제일의  
농업군 영동

청정 관광 브랜드  
일번지 영동


일등 자치단체  
영동

### 5대분야 9개 핵심과제

분야별	핵심과제	건수
5대 분야	9개 핵심과제	73
육아·청소년	○ 안전하고 바르게 성장하는 영·유아	6
	○ 건강한 청소년 교육환경 조성	4
농업·산업경제	○ 군민이 체감하는 일등 농업군 육성	10
	○ 모두가 잘사는 민생경제 활성화	4
문화·체육·관광 지역개발	○ 명실상부한 문화관광도시 완성	8
	○ 안전하고 균형 있는 지역발전	20
	○ 편리한 생활체육환경 조성	3
사회복지	○ 다 함께 행복한 복지 실현	13
군정혁신	○ 깨끗하고 공정한 공직문화 조성	5

## II 추진현황

### < 민선7기 공약사업 추진현황( '19. 3.말 기준) >

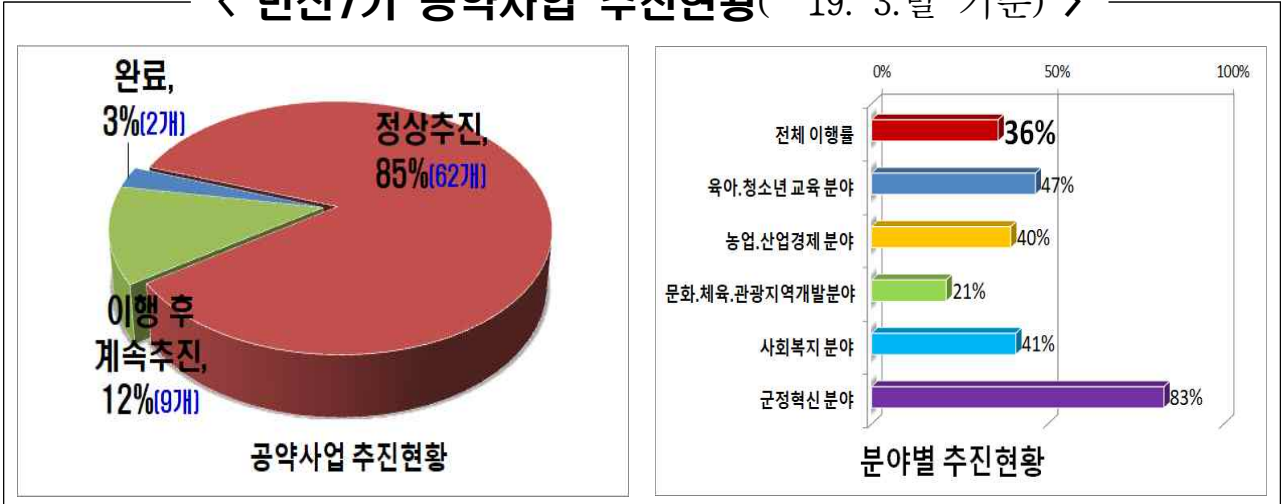

### 1 분야별 현황

분야별	핵심과제	공약 이행 상황				비고		
		완료) (이행후계 속추진)	정상 추진	일부 추진	미착수			
<b>5대분야</b>	<b>73</b>	<b>9개 핵심과제</b>	<b>73</b>	<b>11(9)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
육아·청소년	10	1. 안전하고 바르게 성장하는 영유아	6	1	5			
		2. 건강한 청소년 교육환경 조성	4	1(1)	3			
농업·산업 경제	14	3. 군민이 체감하는 일등 농업군 육성	10	2(2)	8			
		4. 모두가 잘사는 민생경제 활성화	4		4			
문화·체육 ·관광지역 개발	31	5. 명실상부한 문화관광도시 완성	8		8			
		6. 안전하고 균형있는 지역발전	20		20			
		7. 편리한 생활체육환경 조성	3		3			
사회복지	13	8. 다함께 행복한 복지실현	13	4(3)	9			
군정혁신	5	9. 깨끗하고 공정한 공직문화 조성	5	3(3)	2			

1) 완료기준 : (완료) 공약이행이 완료되어 종료된 사업, (이행 후 계속추진) 공약내용 이행완료 후 추가목표를 세워 추진 중인 사업, 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복하는 사업(현재까지의 실적으로 공약을 이행했다고 판단할 수 있는 사업)

## 2 부서별 현황

추진부서	공 약 사업수	공 약 이 행 상 황				비고
		완 료 (이행후계속추진)	정상추진	일부추진	미착수	
<b>계</b>	<b>73</b>	<b>11(9)</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
기획감사담당관	2	1(1)	1			
행정과	4	3(2)	1			
국악문화체육과	6		6			
주민복지과	5		5			
가족행복과	9	1(1)	8			
민원과	1		1			
경제과	6	1(1)	5			
농정과	7	2(2)	5			
산림과	1		1			
건설교통과	9	1(1)	8			
안전관리과	6		6			
도시건축과	5		5			
보건소	2	2(1)	-			
농업기술센터	3		3			
상수도사업소	3		3			
시설사업소	3		3			
힐링사업소	1		1			

## 3 완료 및 이행 공약사업(11건)

분야별	공 약 명
육아·청소년(2)	◇ 출산·보육담당부서 신설 <b>[완료]</b>
	◇ 저소득 청소년 건강증진비 지원 <b>[이행후계속추진]</b>

분야별	공 약 명
농업.산업경제(2)	◇ 과일통일포장재 확대 지원 <b>(이행후계속추진)</b>
	◇ 과수원예농가 수분용 별 지원 <b>(이행후계속추진)</b>
사회복지(4)	◇ 청년, 노인, 여성 취업지원센터 설치 <b>(이행후계속추진)</b>
	◇ 오지마을 100원 무지개 택시 주 6일 확대 <b>(이행후계속추진)</b>
	◇ 영동병원 내 안과 신설 <b>(완료)</b>
	◇ 치매안심센터 확대 운영으로 건강한 노후 <b>(이행후계속추진)</b>
군정혁신(3)	◇ 지속적 규제개혁, 발전 저해요소 혁파 <b>(이행후계속추진)</b>
	◇ 공무원 성과중심 발탁 인사시스템 운영 <b>(이행후계속추진)</b>
	◇ 군민과의 소통 강화 확대 <b>(이행후계속추진)</b>

### III 예산확보 현황 (2019. 3월말 기준)

#### 1 투자계획

##### ○ 연도별

(단위:백만원)

분야별	합 계	연 도 별						
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
<b>합 계</b>	<b>581,610</b>	<b>136,538</b>	<b>68,247</b>	<b>91,585</b>	<b>114,831</b>	<b>106,609</b>	<b>53,370</b>	<b>10,430</b>
육아.청소년	10,206	190	297	1,868	3,442	3,714	695	-
농업.산업경제	63,551	400	6,909	9,945	11,498	20,299	14,500	-
문화.체육.관광지역개발	475,795	134,863	57,311	70,140	84,923	81,279	36,849	10,430
사회복지	32,058	1,085	3,730	9,632	14,968	1,317	1,326	-
군정혁신	0	-	-	-	-	-	-	-

##### ○ 재원별


(단위:백만원)

분야별	합 계	재 원 별			
		국비	도비	군비	기타
<b>합 계</b> (구성비)	<b>581,610</b> (100%)	<b>230,228</b> (40%)	<b>90,084</b> (15%)	<b>228,935</b> (39%)	<b>32,363</b> (6%)
육아.청소년	10,206	3,151	372	6,676	7
농업.산업경제	63,551	13,961	4,277	25,989	19,324
문화.체육.관광지역개발	475,795	201,656	85,030	189,000	109
사회복지	32,058	11,460	405	7,270	12,923
군정혁신	0	-	-	-	-

## 2 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

### < 분야별(자원별) 예산 확보 현황( '19. 3.말 기준) >

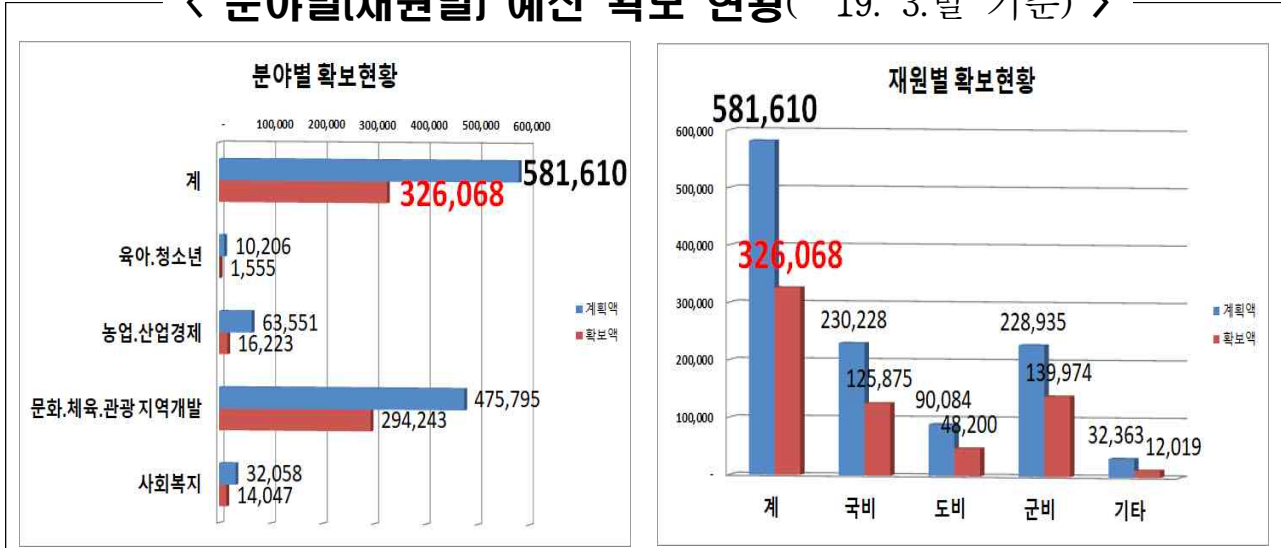

분야별	계획액	확보액					계획대비 확보(%)
		계	국비	도비	군비	기타	
<b>합 계 (구성비)</b>	<b>581,610</b>	<b>326,068 (100%)</b>	<b>125,875 (39%)</b>	<b>48,200 (15%)</b>	<b>139,974 (43%)</b>	<b>12,019 (3%)</b>	<b>56%</b>
육아.청소년	10,206	1,555	61	27	1,460	7	15%
농업.산업경제	63,551	16,223	1,213	280	8,118	6,612	26%
문화.체육.관광지역개발	475,795	294,243	119,649	47,593	127,001	-	62%
사회복지	32,058	14,047	4,952	300	3,395	5,400	44%
군정혁신	-	0	-	-	-	-	-

### ③ 세부사업별 확보액

공 약 명	투자계획 (A)	확보예산 (B)	확보율(%) (B/A)	주관부서
<b>합 계</b>	<b>581,610</b>	<b>326,068</b>	<b>56%</b>	
1-1 출산.보육담당부서 신설	-	-	비예산	행 정 과
1-2 영유아 돌봄서비스 추진	269	89	33%	가 족 행 복 과
1-3 육아종합지원센터 건립	2,500	-	0%	가 족 행 복 과
1-4 청소년종합문화센터 건립	2,500	-	0%	가 족 행 복 과
1-5 어린이집, 아동센터 공기청정기 설치 추진	42	42	100%	가 족 행 복 과
1-6 어린이 안심공원 조성	1,500	-	0%	산 립 과
2-1 초.중.고 입학 축하금 지원	1,223	326	27%	가 족 행 복 과
2-2 저소득 청소년 건강증진비 지원	432	108	25%	가 족 행 복 과
2-3 청소년 해외 연수 및 영어캠프 확대 시행	1,425	675	47%	가 족 행 복 과
2-4 각급 학교 CCTV설치 및 통합관제센터 연계	315	315	100%	안 전 관 리 과
3-1 농업인 안전재해보험 확대 지원	4,844	1,259	26%	농 정 과
3-2 친환경 농산물 생산 지원 확대	2,923	932	32%	농 정 과
3-3 농촌 일손해결 시스템 구축	904	82	9%	농 정 과
3-4 과일통일포장재 확대 지원	24,500	9,236	38%	농 정 과
3-5 농산물 산지유통센터 시설보완	8,500	-	0%	농 정 과
3-6 과수원예농가 수분용 별 지원	270	70	26%	농 정 과
3-7 어서실 악취 저감 시설 설치	1,200	300	25%	농 정 과
3-8 농가소득 증대를 위한 아미노산 액비 공급 확대	600	255	43%	농 업 기 술 센 터



공 약 명	투자계획 (A)	확보예산 (B)	확보율(%) (B/A)	주관부서
3-9 농기계 임대 및 순회 수리 확대 운영	2,503	1,905	76%	농업기술센터
3-10 콩탈곡기, 잔가지 파쇄기 임대 확대	280	157	56%	농업기술센터
4-1 전통시장, 안전시설 강화 및 맞춤형 지원으로 지역상권 활성화	718	718	100%	경 제 과
4-2 영동산업단지 조기 분양 완료	-	-	비예산	경 제 과
4-3 기업유치 가속화로 일자리 창출을 통한 서민생활 안정	-	-	비예산	경 제 과
4-4 일라이트 활용 고부가가치산업 육성	16,309	1,309	8%	경 제 과
5-1 영동문화원 신축 이전	7,000	-	0%	국악문화체육과
5-2 국악과 과일을 활용한 축제.관광 산업화	1,125	505	45%	국악문화체육과
5-3 도마령 일원 관광자원 개발(용화,상촌)	100	56	56%	국악문화체육과
5-4 송호 관광지 출렁다리 설치 조기 보완 추진	5,400	5,400	100%	국악문화체육과
5-5 4번국도 영동군 홍보관문 조기 착공	1,800	1,800	100%	국악문화체육과
5-6 국립 난계국악원 유치	-	-	비예산	국악문화체육과
5-7 각 면소재지 경관조명 설치	400	200	50%	도 시 건 축 과
5-8 레인보우힐링타운 2021년 완공	140,100	140,100	100%	힐 링 사 업 소
6-1 가로.보안등 조도 개선	1,460	560	38%	건 설 교 통 과
6-2 교통난 해소를 위한 공영주차장 증설	6,350	6,679	105%	건 설 교 통 과
6-3 국도 19호선 확포장 공사 조기 착공	-	-	비예산	건 설 교 통 과
6-4 교통난 해소를 위한 회전교차로 설치 확대	1,000	1,000	100%	건 설 교 통 과
6-5 군도 확포장공사 추진	5,250	1,700	32%	건 설 교 통 과

공 약 명	투자계획 (A)	확보예산 (B)	확보율(%) (B/A)	주관부서
6-6 농어촌도로 확포장공사 추진	7,150	3,350	47%	건설교통과
6-7 농촌중심지 활성화 사업 조기 완공	77,485	47,105	61%	건설교통과
6-8 창조적마을 만들기사업 추진 (학산면 압치리, 철동리 및 심천면 고당1리)	1,473	1,473	100%	건설교통과
6-9 황간 큰쭉골 소하천 정비사업 조기 착공	3,000	3,000	100%	안전관리과
6-10 자연재해위험지구 정비사업 추진	53,546	32,394	60%	안전관리과
6-11 영동천, 용화천 지방하천 정비사업 조기 착공	74,184	8,100	11%	안전관리과
6-12 시항천 정비사업 추진	10,500	-	0%	안전관리과
6-13 마을 안전용 CCTV 설치 확대 설치	258	258	100%	안전관리과
6-14 철길주변 햇살가득 다담길 정비사업 조기 완공	3,145	3,145	100%	도시건축과
6-15 경부선 영동가도교 확장공사 조기 착공	11,000	11,000	100%	도시건축과
6-16 도시재생(뉴딜)사업 적극 추진	23,400	-	0%	도시건축과
6-17 새뜰마을 조기완공	2,416	2,416	100%	도시건축과
6-18 영동산업단지 주변마을 지방상수도 공급	11,780	480	4%	상수도사업소
6-19 심천면 구탄, 장동리 지방상수도 공급	1,412	1,412	100%	상수도사업소
6-20 황산리 일원 지방상수도 공급	2,561	-	0%	상수도사업소
7-1 그라운드 골프장, 정구장 등 스포츠시설 현대화 추진	2,200	2,200	100%	시설사업소
7-2 영동체육공원 조성사업 조기 착공	19,800	19,800	100%	시설사업소
7-3 각종 생활체육시설 태양광 설치 및 경관 조성 추진	500	110	22%	시설사업소

공 약 명	투자계획 (A)	확보예산 (B)	확보율(% (B/A)	주관부서
8-1 자원봉사센터 빨래방차 증차 운영	382	61	16%	행 정 과
8-2 대중목욕탕, 사우나 등 군민 편의시설 확충	200	200	100%	주 민 복 지 과
8-3 어르신 보청기 지원	520	130	25%	주 민 복 지 과
8-4 장애인전용 건강지원센터 건립	2,500	-	0%	주 민 복 지 과
8-5 장애인전용차량 증차로 중증장애인지원사업 확대 추진	200	80	40%	주 민 복 지 과
8-6 장애인 등록 검사비 지원	160	-	0%	주 민 복 지 과
8-7 여성 안심 환경 조성사업	157	50	32%	가 족 행 복 과
8-8 한부모 가족 지원 강화	80	20	25%	가 족 행 복 과
8-9 산단형 행복주택 200호 조기공급	21,560	9,400	44%	경 제 과
8-10 청년, 노인, 여성 취업지원센터 설치	1,934	885	46%	경 제 과
8-11 오지마을 100원 무지개 택시 주 6일 확대 운행	981	621	63%	건 설 교 통 과
8-12 영동병원 내 안과 신설	-	-	비예산	보 건 소
8-13 치매안심센터 확대 운영으로 건강한 노후 보장	3,384	2,600	77%	보 건 소
9-1 지속적 규제개혁, 발전 저해요소 혁파	-	-	비예산	기획감사담당관
9-2 민.관 합동, 공직감찰 운영	-	-	비예산	기획감사담당관
9-3 공무원 성과중심 발탁 인사시스템 운영	-	-	비예산	행 정 과
9-4 군민과의 소통 강화 확대	-	-	비예산	행 정 과
9-5 원스톱 행정처리 확대 시행	-	-	비예산	민 원 과

IV

# 사업별 자체점검 결과 <2019. 3월말 기준>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황						
1-1	출산보육담당부서 신설 <b>[완료]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>부서 내 사무분장을 재조정하여 출산·양육 맞춤형 서비스 지원</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">기 존</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">신 설(안)</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     &lt;생활지원과&gt; - 여성정책팀, 아동청소년팀 ,평생학습팀, 식품안전팀                 </td> <td></td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     &lt;가족행복과&gt; - 여성정책팀, 청소년드림팀 평생학습팀, <b>영유아보육팀</b> 식품안전팀                 </td> </tr> </table>	기 존	⇒	신 설(안)	<생활지원과> - 여성정책팀, 아동청소년팀 ,평생학습팀, 식품안전팀		<가족행복과> - 여성정책팀, 청소년드림팀 평생학습팀, <b>영유아보육팀</b> 식품안전팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>조례 및 규정 개정                             <ul style="list-style-type: none"> <li>영동군 행정기구설치 조례 개정 : 2018. 11. 19.</li> <li>영동군 지방공무원 정원관리 등에 관한 규정 개정 : 2018. 11. 30.</li> </ul> </li> <li>조직개편 시행 및 인사발령통지 : 2019. 1. 1.</li> </ul>
기 존	⇒	신 설(안)							
<생활지원과> - 여성정책팀, 아동청소년팀 ,평생학습팀, 식품안전팀		<가족행복과> - 여성정책팀, 청소년드림팀 평생학습팀, <b>영유아보육팀</b> 식품안전팀							
1-2	영유아 돌봄서비스 추진 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>기간 : 2018. ~ 2022.</li> <li>내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>시간연장형어린이집운영 : 아침7:30~21:30분까지 시간연장하여 영유아돌봄(2개소)</li> <li>시간제보육운영 : 어린이집 미이용 아동(6-36개월미만) 최대4시간까지 일시보육(1개소)</li> <li>아이돌봄서비스지원 : 맞벌이,한부모 다자녀가정의 양육공백시 시간제 또는 종일제로 신청하여 돌봄(1개소)</li> </ul> </li> <li>사업비 : 269백만원 (국비135, 지방비134)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>'19.03. : 시간연장형 3개소 운영                             <ul style="list-style-type: none"> <li>해나라, 동화나라, 심천 : 시간제보육 1개소 운영</li> <li>한빛 : 아이돌봄지원 1개소 운영</li> <li>다문화가족지원센터</li> </ul> </li> </ul>						
1-3	육아종합지원센터 건립 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>기간 : 2019. ~ 2022.</li> <li>위치 : 영동읍 시내적정 소재지</li> <li>사업규모 : 연면적1,000㎡(지상2층)</li> <li>내용 : 영유아를 위한 장난감대여실, 맘카페, 시간제보육실, 부모교육실, 놀이터 등</li> <li>사업비 : 2,500백만원 (국비1,000, 지방비1,500)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>'18.12 : 세부사업계획 및 부지선정 검토, 지역국회의원 방문 및 자료준비</li> <li>'19.03                             <ul style="list-style-type: none"> <li>복지부, 지역국회의원 방문하여 사업계획서 설명(1~3월중) : 3회</li> <li>지방육아종합지원센터 수요조사서 제출(복지부) : 3월</li> </ul> </li> </ul>						
1-4	청소년종합문화센터 건립 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>기간 : 2021. ~ 2022.</li> <li>내용 : 청소년들의 건전한 여가와 취미활동을 위한 청소년 종합문화 센터 건립</li> <li>사업비 : 2,500백만원 (국비 2,000, 군비 500)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>현 영동문화원의 이전이 선행되어야 사업 추진 가능</li> <li>영동문화원 이전 예정 : 2022년</li> </ul>						
1-5	어린이집, 지역아동센터 공기청정기 설치 추진 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>기간 : 2018.10 ~ 2019.</li> <li>대상 : 25개소 (어린이집16,지역아동센터9)</li> <li>내용 : 공기청정기 구입비용지원</li> <li>사업비 : 42백만원 (국비17, 지방비25)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>'18.12. : 어린이집 지원완료 (16개소 59대)</li> <li>'19.03. : 지역아동센터 공기청정기 구입계획 및 보조 결정 (9개소 9,000천원)</li> </ul>						

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
1-6	어린이 안심공원 조성 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 영동읍 동정리 93-7번지</li> <li>○ 기간 : 2018. ~ 2021.</li> <li>○ 사업량 : 88,054㎡</li> <li>○ 사업비 : 1,500백만원 (토지매입 : 800 , 시설공사 700)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자연체험형 시설 (징검다리 및 출렁다리, 나무오르기 등)</li> <li>- 조합놀이대 시설 (창의력 향상을 위한 그네, 시소 등)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농촌중심지활성화 사업(영동읍)계획에 따른 업무 협의 완료 (2018.10.4.)</li> <li>○ 매도의향서(영동읍 동정리 93-7번지) 제출 확인(2018.12.12.)</li> <li>○ 공원 조성계획을 위한 지역주민 여론 조사 완료(2019.03.04.)</li> </ul>
2-1	초·중·고 입학축하금 지원 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2019. 1.~</li> <li>○ 지원내용 : 입학일 기준 부모와 자녀가 군내 주민등록을 두고 실제 거주하면서 초·중·고등학교에 최초 입학하는 경우 입학축하금 지원</li> <li>○ 지원금액 : 초등학교 입학생 20만원 중 학교 입학생 30만원 고등학교 입학생 50만원</li> <li>○ 사업비 : 326백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.12. : 영동군 인구늘리기시책 지원 조례 개정</li> <li>○ '19.03. : 입학축하금 신청.접수</li> </ul>
2-2	저소득 청소년 건강증진비 지원 <b>[이행후계속추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2019. ~</li> <li>○ 내용 : 관내 기초생활수급가구의 청소년에게 월 30,000원 건강 증진비 지원</li> <li>○ 사업비 : 연 108백만원(군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.10 : 영동군 저소득 청소년 건강증진비 지원 조례제정 및 예산확보</li> <li>○ '19.02 : 매월 25일(30,000원 지원)</li> </ul>
2-3	청소년 해외연수 및 영어캠프 확대 시행 <b>[정상추진]</b>	<p><b>[영어캠프]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 매년 여름방학</li> <li>○ 참여인원 : 230명</li> <li>○ 사업내용 : 원어민 중심의 합숙형 영어캠프</li> <li>○ 사업비 : 115백만원</li> </ul> <p><b>[해외연수]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 매년 겨울방학</li> <li>○ 참여인원 : 30명</li> <li>○ 사업내용 : 영어능력향상과 현지교육·문화교류를 위한 해외연수</li> <li>○ 사업비 : 135백만원</li> </ul>	<p><b>[영어캠프]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.07. : 영어캠프 추진/기수별 4박5일 / 인천영어마을</li> <li>○ 참여인원 : 초 100명 / 중 100명</li> </ul> <p><b>[해외연수]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.01 : 초·중학생 해외연수 추진 /20명 / 미국</li> <li>○ '18.09 : 대상자 선발(영어캠프 우수 중학생 30명)</li> <li>○ '18.11. : 연수 추진 위탁업체 선정 / (주)하나투어</li> <li>○ '19.01. : 중학생 30명 연수실시</li> </ul>
2-4	각급학교CCTV 설치 및 통합관제센터 연계 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 학교내 각종 사건·사고등 범죄 예방 CCTV 설치 및 통합관제센터 연계</li> <li>○ 기간 : 2019. 1. ~ 6.</li> <li>○ 대상 : 관내 초·중·고교 28개소</li> <li>○ 대수 : 고성능 CCTV 14식 56대</li> <li>○ 사업비 : 315백만원(군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년 사업예산 확보 : 18. 12. 현재</li> <li>○ 영동교육지원청과 사업추진일정 협의 추진중</li> </ul>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
3-1	농업인 안전재해보험 확대 지원 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2018 ~ 2022</li> <li>○ 사업대상 : 만15세 ~ 87세의 영농 활동에 종사하는 농업인</li> <li>○ 사업비 : 4,844백만원 (국비 2,422, 도비 361, 군비 714, 기타 1,347)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 피보험자당 주계약 보험료 지원</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18. 12 : 2018년 보험가입자 보조금 지급 - 5,265명 / 813백만원</li> <li>○ '19년 농업인 안전보험 보조지원비율 확대 - 보조비율 : 65% ⇒ 70%</li> <li>- 1회추경 군비확보(보조비율확대분) : 46,400천원</li> </ul>
3-2	친환경 농산물 생산지원 확대 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2018. ~ 2022.</li> <li>○ 사업대상 : 친환경인증을 받은 농업인, 농업법인, 생산자단체 등</li> <li>○ 사업비 : 2,923백만원 (국비 434, 도비 476, 군비 1,321, 기타 692)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 친환경농업 직접지불제 외 6개 사업</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.12. : 사업완료 및 정산 및 '19년 예산 확보</li> <li>○ '19.01. : 사업 지침시달, 신청접수</li> <li>○ '19.03. : 대상자 선정 및 보고</li> <li>○ '19.04. : 사업비 배정 및 사업시행</li> </ul>
3-3	농촌 일손해결 시스템 구축 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2022년</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농업인력지원센터 운영</li> <li>- 일손봉사 긴급지원반 운영</li> <li>- 외국인계절근로자 사업 확대</li> <li>- 봄·가을 농촌일손돕기 추진</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.11. : 인력지원센터 부지 검토</li> <li>○ '18.12. <ul style="list-style-type: none"> <li>- '19년 당초예산 확보</li> <li>- 농업인력지원센터 사업계획 수립</li> </ul> </li> </ul>
3-4	과일통일포장재 확대 지원 <b>[이행후계속추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2018. ~ 2022.</li> <li>○ 사업대상 : 포도 등 5개 품목을 표준규격에 맞게 우리군 통일포장재로 출하하는 생산자 조직</li> <li>○ 사업비 : 24,500백만원 (군비 12,000, 기타 12,500)</li> <li>○ 사업내용 : 포도 등 5개 품목을 표준규격에 맞게 사용하는 생산자 조직에 과일 통일포장재 제작지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년 과일 통일포장재 보조액 25억 확보를 통한 보조비율 50% 달성</li> </ul>
3-5	농산물 산지유통센터 시설보완 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2018.~2022.</li> <li>○ 위치 : 영동군 일원</li> <li>○ 사업규모 : 1개소</li> <li>○ 사업비 : 8,500백만원 (국비 1,800, 도비 900, 군비 2,900, 기타 2,900)</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국비공모 : 소방·전기·토목시설, 선별장, 저온창고 등</li> <li>- 군비지원 : 선별시스템, 세척기등 기계장비류</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부지확보 완료(설계리 377-1)</li> <li>○ 확인지표 ①②③ 요건사항 충족</li> <li>○ 농림축산식품부 1차 협의 : 2018.7.30.</li> <li>○ 도지사 공약연계추진협의 : 2018.12월</li> <li>○ 농림축산식품부 2차협의 : 2019. 1.10(허동웅서기관)</li> <li>○ 예비신청서 제출 : 2019. 2. 19</li> <li>○ 사업계획수립중 : 2019. 2 ~</li> <li>○ 사업성진단 컨설팅 : 2019. 3 ~</li> </ul>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
3-6	과수원예농가 수분용 벌 지원 <b>[이행후계속추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업대상 : 포도를 제외한 관내 과수원에 시설하우스 재배농가</li> <li>○ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년</li> <li>○ 사업규모 : 270ha</li> <li>○ 사업비 : 270백만원 (보조 50%, 자담 50%)</li> <li>○ 주요내용 : 과수원에 시설재배농가에 수정용 벌 구입비 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년 사업 수요조사 : 2018. 9.</li> <li>○ 2019년 사업 예산확보 : 2018. 12 - 70백만원 (보조 35백만원, 자담 35백만원)</li> <li>○ 2019년 사업 보조금 교부결정 - 93농가 56.7ha 65.5백만원 (보조 32.75백만원, 자담 32.75백만원)</li> <li>○ 사업완료 : 5농가 2.9ha 2.6백만원</li> </ul>
3-7	어서실 약취 저감 시설 설치 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2022년</li> <li>○ 위치 : 영동읍 부용리(어서실)</li> <li>○ 내용 : 어서실 양돈농가 실정에 맞는 축산약취 저감을 위한 시설·장비 설치</li> <li>○ 사업비 : 1,200백만원 (군비600, 자담600)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '19.01. : 약취저감 선진지 담당팀장 현장컨설팅 실시</li> <li>○ '19.03. : 약취개선 선진지견학 실시 (경남 고성군)-2차</li> <li>○ '19.03. : '19년 사업계획 농가협의</li> </ul>
3-8	농가소득 증대를 위한 이미노산 액비 공급 확대 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018~2022년</li> <li>○ 내용 : 다양한 홍보활동을 통한 액비 수령 농가 확대</li> <li>○ 사업비 : 600백만원(군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018년도 추진실적 - 액비 수령농가 증가 : 114호</li> <li>○ 2019년도 1분기 : 43농가</li> </ul>
3-9	농업기계 임대 및 순회 수리 확대 운영 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018~2022년</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농업기계 임대사업 확대 운영을 위한 임대사업장 신축</li> <li>- 농업기계 순회수리반 증설을 통한 순회수리 확대 운영</li> </ul> </li> <li>○ 사업비 : 2,503백만원 (도비 20, 군비 2,483)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.10. : 임대사업장 신축 공유재산 심의 완료</li> <li>○ '18.12. : 임대사업장 신축 예산 확보 1,500백만원</li> <li>○ '18.12. : 농업기계 순회수리 장비 예산 확보 291백만원</li> <li>○ '19.2. : 신축공사 설계용역계약</li> <li>○ '19.3. : 순회수리 근무자 증원 5명</li> <li>○ 2019년도 1분기 추진실적 - 순회수리 20회, 477농가, 810대</li> </ul>
3-10	콩탈곡기, 잔가지파쇄기 임대 확대 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2019~2022년</li> <li>○ 내용 : 농업기계 임대장비 추가 확보를 통한 임대 확대로 농민들의 적기 영농도모</li> <li>○ 사업비 : 280백만원(군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.12. : 3회 추경 예산 30백만원 (잔가지파쇄기 3대)</li> <li>○ '18.12. : 19년 본 예산 80백만원 (잔가지파쇄기 5대, 콩탈곡기 3대)</li> <li>○ '19.03. : 콩탈곡기 3대, 잔가지파쇄기 5대 구입</li> </ul>
4-1	전통시장, 안전시설 강화 및 맞춤형 지원으로 지역상권 활성화 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 영동전통시장</li> <li>○ 사업기간 : 2018.~2019.</li> <li>○ 사업규모 : 718백만원 (국305.2,도39.24,군373.63)</li> <li>○ 사업내용 -영동전통시장 화재알림시설 설치사업 (148개/116백만원)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018년 국도비예산확보 (91.64백만원)</li> <li>○ 2019년 국도비 공모사업 신청완료 (252.8백만원)</li> <li>○ 2018.12월 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전통시장 소화기 설치사업 완료</li> <li>- 전통시장 이정표 설치사업 완료</li> </ul> </li> </ul>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
		<ul style="list-style-type: none"> <li>-전통시장 아케이트 및 점포 노후전선 교체사업 (2개시장/320백만원)</li> <li>-전통시장 가판대(이동용) 설치 지원 (110대/72백만원)</li> <li>-전통시장구역 도로 전면재포장 (600m/200백만원)</li> <li>-전통시장 소화기 설치사업 (140대/6백만원)</li> <li>-전통시장 이정표 설치사업 (1개소/3백만원)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019.3월 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전통시장 아케이트 및 노후전선 교체사업 예산확보</li> <li>- 전통시장 가판대 설치 지원 추진중</li> <li>- 전통시장구역 도로 전면재포장 추진중</li> </ul> </li> </ul>
4-2	<b>영동산업단지 조기분양 완료 [정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 영동군 용산면 영동산업단지</li> <li>○ 분양면적 : 593,593㎡</li> <li>○ 사업내용 : 조기분양 완료 (2020년 까지)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 분양현황 : 22개사 471,008㎡ (총 분양면적의 80%)</li> <li>○ 상담 중 기업 : 2개사 (분양 시 분양률 84%)</li> </ul>
4-3	<b>기업유치 가속화로 일자리 창출을 통한 서민생활 안정 [정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 영동군 (영동산업단지, 황간물류단지 중점)</li> <li>○ 고용목표 : 800명(2022년까지)</li> <li>○ 사업내용 : 기업유치를 통한 일자리 창출</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고용인원 : 252명(이행률 31%)</li> <li>○ 입주율 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 황간물류단지 : 59%</li> <li>- 영동산업단지 : 29%</li> </ul> </li> </ul>
4-4	<b>일라이트 활용 고부가가치 산업 육성 [정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2022년</li> <li>○ 일라이트 안정적 공급기반 구축</li> <li>○ 일라이트 성분분석 및 제품적용 실증테스트</li> <li>○ 일라이트 연구 센터 구축</li> <li>○ 사업비 : 16,309백만원 (국 9,000, 도 2,300, 군 3,809, 기타 : 1,200)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 채굴권 5개소, 탐사권 1개소 허가·등록 완료</li> <li>○ 일라이트 고부가가치 상용화 연구용역 완료</li> </ul>
5-1	<b>영동문화원 신축 이전 [정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2019 ~ 2022년</li> <li>○ 위치 : 영동읍 계산리 463번지외 3필지</li> <li>○ 내용 : 영동문화원 신축 이전</li> <li>○ 사업비 : 7,000백만원 (국비2,000 / 군비5,000)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019. : '20년 농촌중심지활성화 사업 (농림축산식품부) 예산 공모 신청 완료(2019.02.)</li> <li>향후 공모 확정후 기본계획 수립 용역 집행 예정</li> </ul>
5-2	<b>국약과 과일을 활용한 축제관광 산업화 [정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산업관광(소소한 농가 와이너리 투어 추진)</li> <li>○ 4대축제 관광가이드 북 제작</li> <li>○ 4대축제기간 영동사랑상품권 제작 및 활용</li> <li>○ 관광안내사 활용확대(기존 영동역 안내소 외 와인터널 근무 추가)</li> <li>○ 관광안내사 교육강화(분기별 1회 현장 관광 해설교육)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.10. : 산업관광 1차컨설팅</li> <li>○ '18.10. : 영동에 가고싶다 여행 1일코스 리플릿 제작(5,000부)</li> <li>○ '18.12. : 산업관광 2차컨설팅</li> <li>○ '19. 3. : 산업관광 국비 300천원 예산편성 및 교부완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 찾아가는 와인박람회 참가(3회)</li> <li>- 산업관광 프로그램 진행중</li> </ul> </li> <li>○ '19. 2.~3. : 4대축제 관광가이드북 제작중.</li> <li>○ '19.1.~3. : 관광안내사 와인터널 2명 근무중.</li> </ul>



관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
5-3	도마령 일원 관광자원 개발(용화, 상촌) 상촌 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 도마령 일원(용화, 상촌)</li> <li>○ 기간 : 2019 ~ 2022년</li> <li>○ 내용 : 타당성 조사 1식</li> <li>○ 사업비 : 100백만원(군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 용역계획 수립 중</li> <li>○ '19.04. : 1회 추경 확보</li> </ul>
5-4	송호 관광지 출렁다리 설치 조기 보완 추진 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 양산면 송호관광지~양산팔경 금강둘레길</li> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2019년</li> <li>○ 내용 : 보행교 설치 L=290m, 안전위생 시설 정비 및 주차장 조성 등</li> <li>○ 사업비 : 5,400백만원 (국비 2,700, 군비 2,700)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.10. : 실시설계 용역 일시정지, 토질조사 용역 착수</li> <li>○ '18.11. : 토질조사 용역 완료</li> <li>○ '19.01. : 공법·자재 선정 기술자문 위원회 개최(서면심의)</li> <li>○ '19.04. : 하천점용 협의</li> </ul>
5-5	4번국도 영동군 홍보관문 조기 착공 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 추풍령면 추풍령리(국도4호선), 학산면 서산리(국도19호선)</li> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2019년</li> <li>○ 내용 : 홍보관문 설치 2개소</li> <li>○ 사업비 : 1,800백만원(군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.09. : '18년 2회추경 예산확보</li> <li>○ '19.04. : 디자인 및 실시설계 용역 진행(19. 3. ~ 19. 7)</li> </ul>
5-6	국립 난계국악원 유치 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2019년 ~ 2022년</li> <li>○ 위치 : 심천면 고당리 일원</li> <li>○ 내용 : 국립 난계국악원 유치 - 국악연구·제작시설, 국악교육, 연수 시설, 기타 편의시설 등 설치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 04. 25 : 국립 난계국악원 (가칭) 유치 중앙기관 관계자 영동 방문 (국립국악원 4명, 문광부 2명, 도 3명)</li> <li>○ 2018. 07. 24 : 국립 난계국악원 (가칭) 유치 국립국악원장 면담 (도 3명, 군 4명)</li> <li>○ 2018. 11. 14 : 국립 난계국악원 (가칭) 유치 박덕흠 의원 사무실 방문 (군 3명)</li> <li>○ 2018. 11. 18 : 국립 난계국악원 유치 기획재정부(문화예산과) 담당사무관 면담 (도 2명, 군 3명) - 국립국악원 영동 건립을 위한 타당성 용역비(2억) 반영 건의</li> </ul>
5-7	각 면소재지 경관조명 설치 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)</li> <li>○ 사업내용 : 건축물, 교량, 도로, 가로등에 대한 경관조명 설치</li> <li>○ 총사업비 : 400백만원(군비) - 2019년 예산 : 100백만원(군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수요조사 : 2018. 8. 28. ~ 11. 15. (황간면 외 4곳) 황간면(도시재생공모 예정지), 매곡면(노천교), 양강면(면소재지 가로등, 면민회관 건물외벽 경관조명), 용화 면(남대천교), 학산면(면사무소 주변 체육공원 내 경관조명)</li> <li>○ '18.12. : '19년 본예산 확보</li> <li>○ 시범사업 : 황간역일원 (도시재생사업연계) - 2019년 1월 : 주민의견수렴 - 2019년 2월~3월 : 디자인설계 중</li> </ul>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
5-8	레인보우 힐링타운 2021년 완공 [정상추진]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 영동읍 매천리 35-1번지 일원</li> <li>○ 사업기간 : 2014 ~ 2021</li> <li>○ 사업비 : 140,100백만원</li> <li>○ 사업내용 : 영동와인터널, 힐링센터, 문화예술회관, 웰니스단지, 문화마당, 도로, 주차장 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.06 : 투자선도지구 지구지정</li> <li>○ '18.08 : 영동와인터널 임시개장</li> <li>○ '18.10. : 영동와인터널 정식개장</li> <li>○ '18.10. : 지역개발사업계획 승인고시</li> <li>○ '18.11. : 투자선도지구 실시계획 승인</li> <li>○ '18.12. : 지역개발사업 실시계획 승인</li> <li>○ 웰니스단지 소성사업 2차분 준공 및 3차분 착공</li> <li>○ 투자선도지구 기반시설 구축사업 착공</li> </ul>
6-1	가로·보안 조도개선 [정상추진]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2022년</li> <li>○ 내용 : 11개 읍·면 주민의 야간 보행자편의 제공 및 노후 가로 등의 조도효율 개선</li> <li>○ 사업비 : 1,460백만원(군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018년 4월 11개 읍·면 조도개선 214개소 사업추진 완료</li> <li>○ 2018년 12월 영동읍외 4개면 225개소 조도개선 사업추진 완료</li> <li>○ 2019년도 조도개선 사업비 (군비) 300백만원 확보</li> <li>○ 2019년도 읍·면별 사업수요대상지 수요조사 추진</li> </ul>
6-2	교통난 해소를 위한 공영주차장 증설 [정상추진]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2021년</li> <li>○ 위치 : 영동읍 계산리 484-6번지 외 3개소</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영산동 공영주차장 복층화 사업</li> <li>- 영동읍 구교리 주차장 조성 사업</li> <li>- 매천리 공영주차장 조성 사업</li> <li>- 황간면 남성리 공영주차장 조성 사업</li> </ul> </li> <li>○ 사업비 : 6,679백만원 (국비 1,701 / 군비 5,078)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.06. : 영동읍 구교리 주차장 조성 사업 착공</li> <li>○ '18.08. : 공모사업 선정(영산동 공영주차장 조성 사업)</li> <li>○ '18.11. : 매천리 공영주차장 조성 사업 토지매입 및 실시설계</li> <li>○ '18.11. : 황간면 남성리 공영주차장 조성 사업 착공</li> </ul>
6-3	국도19호선 확포장 공사 조기 착공 [정상추진]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2023년</li> <li>○ 위치 : ㉠영동IC ~ 영동산업단지 ㉡영동병원 ~ 울리교차로</li> <li>○ 내용 : 도로확포장 : ㉠ L=4.58km ㉡ L=7.34km</li> <li>○ 사업비 : 177,000백만원(국비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.12.:영동병원~U1대교차로 착공</li> <li>○ U1대교차로 ~ 영동IC 실시설계용역 추진 중 (2019년 12월 준공)</li> </ul>
6-4	교통난 해소를 위한 회전교차로 설치확대 [정상추진]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2020년</li> <li>○ 위치 : 관내일원 (구교3, 구교4, 부용4거리)</li> <li>○ 내용 : 회전교차로 3개소 설치</li> <li>○ 사업비 : 1,000백만원 (군비800백만원, 조정교부금200백만원)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.1:회전교차로 3개소 실시설계 용역 준공</li> <li>○ '18.2:주민설명회 개최</li> <li>○ '18.3:관계기관 및 보상협의 추진 중</li> <li>○ '19.4:부용사거리회전교차로 공사집행</li> </ul>
6-5	군도 확포장공사 추진 [정상추진]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018~2021년</li> <li>○ 위치 : 관내일원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '183:실시설계용역 준공(사부리)</li> <li>○ '18.6:기공승낙서 징구(구강-죽산)</li> </ul>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
		(구강~죽산, 추풍령(사부리), 추풍령(계룡리)) ○ 내용 : 도로확포장 L=2.8km ○ 사업비 : 6,250백만원(군비)	○ '18.10:보상금지금결정(사부리) ○ '18.11:주민설명회개최(구강-죽산) ○ '19.2추풍령(사부리)도로확포장공사 공사집행
6-6	농어촌도로 확포장공사 추진 [정상추진]	○ 기간 : 2018~2022년 ○ 위치 : 관내 일원 (어촌리, 학촌-마곡, 명덕-영국사) ○ 내용 : 도로확포장 L=3.6km ○ 사업비 : 7,000백만원 (군비6,850, 도비150)	○ '18.1~12:보상협의(어촌도로) ○ '18.3:실시설계용역 준공(계룡리) ○ '18.2:주민설명회개최(학촌~마곡) ○ '18.5:보상금지금결정 및 관련법 협의 (계룡리) ○ '18.8:보상협의(학촌~마곡) ○ '18.11:공사착공(계룡리) ○ '18.12:실시설계용역추진(명덕-영국사) ○ '19.2추풍령(사부리)도로확포장공사 공사집행 ○ '19.3:실시설계용역준공(명덕-영국사)
6-7	농촌중심지 활성화사업 조기완공 [정상추진] (입기후)	○ 기 간 : 2012 ~ 2023년 ○ 위 치 : 영동군 1개 읍, 10개면 ○ 내 용 : 기초기반확충, 경관개선, 주민교육등 ○ 사업비 : 77,485백만원 (국비70%, 군비30%)	○ 상촌, 심천, 학산면 준공 ○ 추풍령, 용산면 세부공종별 사업 추진 ○ 매곡, 용화면 시행계획 수립 중 ○ 양강면 기본계획 수립 중
6-8	창조적마을만들기사업추진(학산면 압치리, 철동리 및 심천면 고당1리) [정상추진]	○ 위치 : 영동군 학산면 압치리, 철 동리 및 심천면 고당1리 ○ 사업기간 : 2017~2020년 ○ 사업규모 : 3개 마을 ○ 사업비 : 1,473백만원 (국비 1,031, 도비 6, 군비 436) ○ 내용 - 학산면 압치리: 공동생활홈, 마을 회관 리모델링, 주민역량강화 등 - 학산면 철동리: 자연생태복원, 가 로경관조성, 주민역량강화 등 - 심천면 고당1리 : 수생태경관조성, 가로경관조성, 주민역량강화 등	○ '18.12. : 학산면 철동리, 심천면 고당1리 시행계획 수립 ○ '18.12. : 학산면 압치리 기본계획 (안) 확정 및 주민설명회
6-9	큰썩골소하천 정비사업 [정상추진]	○ 사업위치 : 영동군 황간면 용암리 88-4 번지 일원 ○ 사업기간 : 2019 ~ 2021(3개년) ○ 사업내용 : 소하천 정비 L=2.5km ○ 사 업 비 : 3,000백만원 (국비 1,500, 지방비 1,500)	○ '18.01. : 2019년 소하천 정비사업 수요 조사 내역서 및 관리카드 제출 ○ '18.10. : 2019년도 소하천정비 사업비 확정에 따른 사업계획서 제출 ○ '19.03. : 실시설계용역 착수
6-10	자연재해위험지구 정비사업 추진 [정상추진]	○ 위치 : 황간면, 상촌면, 영동읍 일원 ○ 기간 : 2016~2022 ○ 사업규모 - 하천정비 L=3.78km, 배수펌프시설 및 증설, 우수관거 정비 ○ 사업비 : 53,546백만원	○ 마산재해위험개선지구 정비사업 3차분 발주(3월) 및 2차분 준공(5월예정) ○ 계산2 자연재해위험지구 정비사업 (사전설계심사완료) 1차분 착공(5월예정) ○ 둔전2, 두평 자연재해위험지구 정비 사업 실시설계용역 착수(3월)

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
		(국비 26,773 도비 8,023 군비 18,741) ○ 주요내용 -마산지구 호안정비 L=2.78km, 교량3개소, 배수 펌프시설 1식, 우수관거정비 -계산2지구 배수펌프시설 증설, 우수관거정비 L=1.4km 등 -둔전2지구 축제 및 호안정비 L=600m, 교량 2개소 등 -두평지구 배수펌프시설, 소하천정비 L=600m 등	
6-11	<b>영동천,용화천 지방하천 정비사업 조기 착공 [정상추진] (임기후)</b>	○ 위치 -영동천 : 영동읍 부용리~양강면 산막리 -용화천 : 용화면 용화리~월전리 ○ 기간 -영동천 : 2017년~2022년 -용화천 : 2019년~2023년 ○ 사업규모 -하천정비 L=20.4km ○ 사업비 : 74,184백만원 (국비 33,135, 도비 33,135 군비 7,914) ○ 주요내용 -영동천 제방보강 L=7.89km, 저수호안 L=1.66km, 교량 7개소, 보 및 낙차공 13개소 개량, 배수시설물 25개소 등 -용화천 제방축제 L=5.3km,보축 L=1.1km, 고수호안 3개소., 교량 12개소 및 낙차공 9개소 등	-영동천 ○ 실시설계용역 착수 ○ 주민설명회(1,2차) ○ 소규모영향성평가 접수(금강청) ○ 2019년 2월 1차분 착공 -용화천 ○ 2019년 3월 실시설계 PQ심사
6-12	<b>지방하천(시항천) 정비사업 추진 [정상추진] (임기후)</b>	○ 위치 : 학산면 범화리~도덕리 ○ 기간 : 2020년~2024년 ○ 사업규모 : 하천정비 L=3.0km ○ 사업비 : 10,500백만원 (국비 5,250 도비 5,250) ○ 주요내용 : 축제 및 호안정비 L=3.0km, 교량 5개소, 낙차공 4개소 등	○ 지방하천 정비 중기계획 반영 및 신규사업으로 지방하천(시항천) 정비사업 선정 지속 건의 중
6-13	<b>마을 안전용 CCTV 확대 설치 [정상추진]</b>	○ 농촌마을의 범죄예방 대책의 일환으로 CCTV 설치 ○ 기 간 : 2019. 1. ~ 6. ○ 대 상 : 황간면 43개 자연마을 ○ 대 수 : 고성능 CCTV 43식 172대 ○ 사업비 : 258백만원(군비)	○ 2019년 사업예산 확보 : 18. 12. 현재 ○ 황간면 일원 사업대상지 선정을 위한 CCTV 신규수요 설치대수 조사중

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
6-14	철길주변 햇살가득 다담길 정비사업 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 영동읍 계산리 일원 (중앙지구대 ~ 소화의원)</li> <li>○ 총사업비 : 3,145백만원 (국비 1,435, 군비 1,710)</li> <li>○ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년(3년)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>-옹벽 및 도로 등 기반시설 정비(4,959㎡),</li> <li>-다담길(보행로) 정비(L=575m, B=1.5m)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 10. 30. : 철도시설공단 업무협의</li> <li>○ 2018. 11. 26. : 지역개발사업 시행자 지정</li> <li>○ 2018. 12. 05. : 사업장 현지 점검 (철도공사, 철도시설공단)</li> <li>○ 2018. 12. 20. : 주민설명회, 의견수렴</li> <li>○ 2019. 01. 20. : 실시설계 완료</li> <li>○ 2019. 01. 30. : 공사 일상감사 완료</li> <li>○ 2019. 03. 07. : 공사 계약심사 완료(충북도)</li> <li>○ 2019. 03. 21. : 포장마차 보상결정 및 공사 집행</li> </ul>
6-15	경부선 영동가도교 확장사업 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 영동읍 계산리 56-3 (영동가도교)</li> <li>○ 총사업비 : 11,000백만원 (국비 4,000, 군비 7,000)</li> <li>○ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년(3년)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>-가도교 확장 L=20m, B=20.0m</li> <li>-접속도로 정비 L=180m, B=20.0m</li> <li>-가도교 배수펌프시설 설치 1개소</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 10. 30. : 철도시설공단 업무협의</li> <li>○ 2018. 11. 26. : 지역개발사업 시행자 지정</li> <li>○ 2018. 12. 05. : 사업장 현지 점검 (철도공사, 철도시설공단)</li> <li>○ 2018. 12. 11. : 편입물건 보상협의(1차)</li> <li>○ 2019. 03. 14. : 실시설계 반영 사항 협의(한국철도시설공단)</li> </ul>
6-16	도시재생(뉴딜)사업 적극 추진 <b>[정상추진]</b> <b>(임기후)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년(4년)</li> <li>○ 공모신청 : 영동읍 1개소(84억), 황간면 1개소(150억)</li> <li>○ 사 업 비 : 234억원 (국비 60%, 지방비 40%)</li> <li>○ 주요사업 : 노후주택 및 상가 정비 사업, 공동이용 및 생활편의시설 등 공급, 일자리창출, 지역문화 활성화, 골목경제 활성화, 지역공 동체 활성화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018.05.15. : 업무협약식 - (사)충북남부마을만들기지원센터</li> <li>○ 도시재생 전략화 계획 용역 : 2018. 11. ~ 2019. 11.</li> <li>○ 마을공동체 활성화 사업(황간면) : 2018. 11. ~ 2018. 12.</li> <li>○ 도시재생전략계획 수립 중 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3. 18 : 주민공청회</li> <li>- 3. 22 : 군계획위원회 자문</li> <li>- 3. 28 : 의원간담회</li> <li>- 도 심의 중</li> </ul> </li> </ul>
6-17	새뜰마을 조기 원공 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2016년 ~ 2019년(4년)</li> <li>○ 위치 : 영동읍 부용리 일원</li> <li>○ 사업비 : 2,416백만원 (지특 70%, 도비 9%, 군비 21%)</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기초생활 인프라사업 : 방재/위생, 생활환경, 주민공동</li> <li>- 집수리 사업, 휴먼케어사업, 주민 역량사업</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ CCTV 설치공사 : '17.09.05.~'17.10.08</li> <li>○ 가로등 설치공사 : '17.09.06.~'17.09.26</li> <li>○ 경로당보수 및 교육장 : '17.11.15.~'17.12.11</li> <li>○ 도로확포장 공사 : '17.12.05.~'18.06.14</li> <li>○ 데크설치 공사 : '17.12.14.~'18.04.24</li> <li>○ 주민역량강화 교육 : 수시 · 분 야 : 미술, 다도, 도자기</li> <li>○ 거점공간 건축공사 : 착공 - 토공사 진행 중</li> <li>○ 주민역량강화 교육 : 수시 · 분 야 : 미술, 다도, 스마트폰활용</li> </ul>
6-18	영동산업단지 주변마을 지방상수도공급 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2021년</li> <li>○ 위치 : 용산면 금곡리 외</li> <li>○ 내용 : 수원고갈, 수질불량 등으로 식수공급에 어려움이 있는 지역에 지방상수도 공급</li> <li>○ 사업비 : 11,780백만원(군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.10. : 기본 및 실시설계용역 집행</li> <li>○ '18.12. : 기본 및 실시설계용역 착공</li> <li>○ '19.03. : 주민설명회개최(면사무소)</li> </ul>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
6-19	심천면 구탄, 장동리 지방상수도 공급 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2019 ~ 2021년</li> <li>○ 위치 : 심천면 장동리, 구탄리</li> <li>○ 내용 : 수원고갈, 수질불량 등으로 식수공급에 어려움이 있는 지역에 지방상수도 공급</li> <li>○ 사업비 : 1,412백만원 (국비 983, 지방비 429)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.12. : 기본 및 실시설계 용역 수립중</li> <li>○ '19.01. : 기본 및 실시설계용역 집행</li> <li>○ '19.03. : 기본 및 실시설계용역 준공</li> </ul>
6-20	황산리 일원 지방상수도 공급 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2020 ~ 2022년</li> <li>○ 위치 : 황산면 황산리(죽촌,모정등)</li> <li>○ 내용 : 수원고갈, 수질불량 등으로 식수공급에 어려움이 있는 지역에 지방상수도 공급</li> <li>○ 사업비 : 2,561백만원(군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예산확보 방안 검토 및 추진 중</li> </ul>
7-1	그라운드 골프장, 정구장등 스포츠시설 현대화 추진 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2019년</li> <li>○ 위치 : 영동읍 계산리 745번지 일원</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>-그라운드골프장 막구조 돔 설치,</li> <li>-정구장 코트관리용 스프링클러 설치</li> </ul> </li> <li>○ 사업비 : 2,200백만원 (국비660, 도비770, 군비770)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 18.9 체육진흥시설 지원사업(군특) 신청</li> <li>○ 18.10 사업비 확보 가내시 통보</li> <li>○ 18.11 그라운드골프장 투자심사의뢰</li> <li>○ 18.12 정구장 현대화사업 본예산편성</li> <li>○ 19.02 공유재산 및 지방재정 투자 심의 완료</li> </ul>
7-2	영동체육공원 조성사업 조기착공 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018. ~ 2022년</li> <li>○ 위치 : 영동읍 매천리 125-2번지 일원</li> <li>○ 내용 : 실내배드민턴장,축구장, 풋살장, 다목적구장등 설치</li> <li>○ 사업비 : 19,800백만원 (국비3722, 도비4339, 군비11,739)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 18.9 지장물 및 편입토지 보상</li> <li>○ 18.9 체육진흥시설 지원사업(군특) 신청</li> <li>○ 18.10 사업비 확보 및 가내시 통보</li> <li>○ 18.12 기본 및 실시설계를 위한 본예산 편성(2,334백만원)</li> <li>○ 18.03 기본 및 실시설계 용역 집행</li> </ul>
7-3	각종생활체육시설 태양광 설치 및 경관 조성 추진 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2019. ~ 2021년</li> <li>○ 위치 : 영동체육공원, 군민탁구장, 국궁장(영무정).</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 태양광발전 설비 100kW</li> <li>- 경관조명 및 체육시설 간판 설치 각 1식</li> </ul> </li> <li>○ 사업비 : 500백만원 (군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 군민탁구장 태양광설치사업 추진 (20kW, 경제과 융복합지원사업) - 2019년 1월 완료</li> <li>○ 영동체육공원 군특사업 선정 - 영동체육공원 조성 예산 확보 - 2019년 기본 및 실시설계 예정</li> <li>○ 군민탁구장 경관간판 설치 예산 확보</li> <li>○ 국궁장 태양광 발전 설치 예산 확보</li> </ul>
8-1	자원봉사센터 빨래방차증차운영 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2018. ~ 2022.</li> <li>○ 사업규모 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이동빨래차 2대 / 연 250회 운영</li> </ul> </li> <li>○ 사업비 : 382백만원(국 105, 군 277)</li> <li>○ 대형 빨래를 힘들어하는 노인을 대상으로 11개 읍·면을 순회하며 실시하는 이동빨래 서비스</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018년 이동빨래차 운영 130회 목표 달성</li> <li>○ 기존 이동빨래차 세트키 노후화로 교체(4대)</li> <li>○ 2019년 2월부터 이동빨래차 운영, 140회 목표로 운행 중</li> </ul>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
8-2	대중목욕탕(찜질 및 사우나) 건립 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 황간, 추풍령, 매곡, 용화면</li> <li>○ 사업기간 : 2018. ~ 2022.</li> <li>○ 사업규모 : 1개소(개소당 102㎡)</li> <li>○ 사업비 : 200백만원(군비100%)</li> <li>○ 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1개소 추진 : 찜질방(사우나), 샤워장 등 (2019년 : 추풍령면)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년 본예산 200백만원 확보</li> <li>○ 건축허가 사전협의 : 2019. 02. 14.</li> <li>○ 기본 및 실시설계 발주 : 2019. 02. 21.</li> <li>○ 분할측량 : 2019. 03. 22.</li> </ul>
8-3	어르신 보청기 지원 사업 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2019. ~ 2022.</li> <li>○ 사업대상 : 만70세이상 기초연금 수급자</li> <li>○ 사업비 : 520백만원(군비100%)</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 선정기준 : 순음청력검사 청력 역치가 중도난청(40DBHL)이상</li> <li>- 급여수준 : 1인1측 지원, 실구입비용 최대 1,300천원까지 지원</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년 본예산 130백만원 확보</li> <li>○ 사회보장제도 신설에 따른 중앙부처의 검토 및 협의 요청</li> </ul>
8-4	장애인전용 건강검진센터 건립 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2019 ~ 2021년</li> <li>○ 내용 : 장애인전용 건강검진 센터 건립</li> <li>○ 사업비 ; 2,500백만원(군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부지조성 작업중</li> </ul>
8-5	장애인전용차량중차로 중증장애인지원사업 확대추진 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2019 ~ 2022년</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 리프트차량 1대</li> <li>- 운영에 따른 인건비 및 운영비</li> </ul> </li> <li>○ 사업비 ; 200백만원(군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년 예산 확보</li> <li>○ 19. 4. : 보조금 신청 및 결정.</li> </ul>
8-6	장애인 등록 검사비지원 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2019 ~ 2022년</li> <li>○ 내용 : 장애인등록 검사비 지원</li> <li>○ 사업비 ; 160백만원(군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사회보장제도 신설에 따른 중앙부처의 검토 및 협의 요청</li> </ul>
8-7	여성안심환경조성사업 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018. ~ 2022.</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 여성안심보안관 운영</li> <li>- 몰래카메라 탐지장비 구입 및 안심스크린 설치</li> <li>- 무료 여성위생용품 자판기 설치</li> </ul> </li> <li>○ 사업비 : 157백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.11.: 몰래카메라 탐지장비 구입(13세트)</li> <li>○ '18.12.: 화장실 안심스크린 설치(10개소 183개)</li> <li>○ '19.03.: 여성안심보안관 2명 채용</li> <li>○ '19.04.: 여성안심보안관 운영(~11월)</li> </ul>
8-8	한부모가족 지원강화 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2019. ~ 2022.</li> <li>○ 대상 : 한부모가족 지원법에 따른 지원대상</li> <li>○ 내용 : 안과검진비 및 안경구입비 (1인, 연1회100천원이내) 사고, 질병등 검사비 및 의료비지원 (1인, 연1회100~300천원이내)</li> <li>○ 사업비 : 80백만원(지방비80)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.12. : 세부사업계획 검토</li> <li>○ '19.02. : 의료비지원계획 수립</li> <li>○ '19.03. : 대상자 신청접수 및 지원</li> </ul>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
8-9	산단형 행복주택 200호 조기공급 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 용산면 구촌리 170-1 일원</li> <li>○ 사업기간 : 2017.12.~2020.12.</li> <li>○ 사업규모 : 200호</li> <li>○ 사 업 비 : 21,560백만원</li> <li>○ 시 행 자 : LH공사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 토지보상 협의 완료('18.10.)</li> <li>○ 2018.12. 공사 발주</li> <li>○ 2019. 상반기 공사 착공 예정</li> </ul>
8-10	청년, 노인, 여성 취업지원센터 설치 <b>[이행후계속추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2019 ~</li> <li>○ 내용 : 영동군 일자리센터, 대한노인회, 여성새로일하기센터의 독립성을 유지하는 대신 유관기관 간 주기적 정보 공유 및 적극적 협업</li> <li>○ 사업비 : 1,522백만원 (국 1,214, 군 338)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.03. : 유관기관 직업소개 지도 점검 및 실적공유</li> <li>○ '18.09 : 취업박람회 개최 및 각 기관 행사참여</li> <li>○ '19. 03 : 정기 구인구직실적 공유</li> <li>○ '19. 04. : 여성새로일하기센터 운영위원회 참석</li> </ul>
8-11	오지마을 100원 무지개택시 주6일 확대운영 <b>[이행후계속추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2022년(계속사업)</li> <li>○ 대상 : 25개 마을(농어촌버스 미운행 마을)</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주6일(1일 3회)</li> <li>- 해당마을에서 관할 읍면소재지 또는 최단거리 읍면 소재지 재래시장 까지 운행</li> </ul> </li> <li>○ 사업비 : 1,208.5백만원 (국비 250 / 도비 382.5 / 군비 576)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.11. : 조례 개정</li> <li>○ '19.02. : 확대 운영</li> </ul>
8-12	영동병원 내 안과 신설 <b>[완료]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 의료법인 조운의료재단 영동병원</li> <li>○ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년</li> <li>○ 사업규모 : 안과 1개과</li> <li>○ 사 업 비 : 2,648백만원 (병원자체재원)</li> <li>○ 주요내용 : 영동병원 내 안과 신설</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 12월 : 시설 및 장비 확충 완료</li> <li>○ 2018. 12월 : 안과전문의 채용 중</li> <li>○ 2019. 2월 : 안과 운영</li> </ul>
8-13	치매안심센터 확대 운영으로 건강한 노후보장 <b>[이행후계속추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2022년</li> <li>○ 내용 : 치매안심센터 설치 치매안심센터 운영</li> <li>○ 사업비 : 3,384백만원 (국비 2431, 도비 120, 군비 833)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18. 01 ~ 현재 : 치매안심센터 운영</li> <li>○ '18. 06. : 센터 공사 착공</li> <li>○ '18. 11. : 센터 공사 완료</li> <li>○ '18. 12 ~ 현재 : 인테리어 공사</li> <li>○ '19. 02. : 센터 개소식 및 운영</li> </ul>
9-1	지속적 규제개혁 · 발전저해요소 혁파 <b>[이행후계속추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2022년</li> <li>○ 내용 : 불합리한 법령규제 정비 및 규제혁신 기반 추진역량 강화</li> <li>○ 사업비 : 비예산</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18. 03. ~ '18. 04. : 점검회의 및 규제개선 발굴 토론회 2회 개최</li> <li>○ '18. 05. : 규제개혁 역량강화 공직자 교육 실시 (73명)</li> <li>○ '18. 02. : 규제개혁 위원회 개최(1차)</li> <li>○ '18. 03. : 규제개혁 위원회 개최(2차)</li> <li>○ '18. 04.~ '18. 12. 상·하반기 찾아가는 규제개혁추진단 운영</li> </ul>



관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18. 01. ~ '18. 12.</li> <li>- 조례 규제개선 사례집 중 조례 제·개정 21건</li> <li>○ '19. 02. : 규제혁신 추진계획 수립</li> <li>○ '19. 02. : 3대 테마 규제개선과제 보고회 개최</li> </ul>
9-2	<p style="text-align: center;"><b>민·관 합동, 공직감찰 운영 [정상추진]</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 군민감사관 회의 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상하반기 각1회 이상</li> </ul> </li> <li>○ 군민감사관과의 현장대회 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 군민감사관 제보시 현지 출장</li> </ul> </li> <li>○ 건설사업장 합동점검 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상하반기 각1회</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 군민감사관 신규 의촉 : 2018.4.10. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총 30명(신규 12명, 기존 18명)</li> </ul> </li> <li>○ 군민감사관 회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018년 하반기 : 12. 4 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 참석 22명</li> <li>· 건의 10건 → 추진 8건, 미추진 2건</li> </ul> </li> <li>- 2019년 상반기 : 3. 21 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 참석 24명</li> <li>· 건의 13건 접수</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 군민감사관 현장대회 : 19.2.13 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 하천 내 수목제거사업 후 잔가지 방치 → 파쇄처리 및 제거 완료</li> </ul> </li> </ul>
9-3	<p style="text-align: center;"><b>공무원 성과중심 발탁 인사시스템 운영 [이행후계속추진]</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조직을 일과 성과 중심으로 전환하여 열심히 일하는 조직분위기 조성</li> <li>○ 남들이 하기 싫어하는 업무, 어려운 업무 등을 열심히 일하는 직원에 대한 인센티브 부여</li> <li>○ 근무성적, 근무태도 불량자, 품위 유지 위반자에 대한 페널티 강화</li> <li>○ 공정한 결정을 위한 심사위원회 구성 운영</li> <li>○ 활기찬 조직문화 조성을 위한 경쟁력 강화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년 인사운영계획 수립 (2018.12.26.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실적가점 및 페널티 기준 수립</li> </ul> </li> </ul>
9-4	<p style="text-align: center;"><b>군민과의 소통 강화 확대 [이행후계속추진]</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대상별 간담회를 통한 군정참여 및 공감대 형성</li> <li>○ 군정에 대한 지속적인 관심 제고 및 발전 방향 의견 수렴</li> <li>○ 상생 발전 방향 제시 및 애로사항 청취 및 검토결과 통보로 상호 소통</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018년 간담회 개최 횟수 : 8회</li> <li>○ 2019년 간담회 개최 횟수 : 1회 (2019. 3월 현재)</li> </ul>
9-5	<p style="text-align: center;"><b>원스톱 행정처리 확대 시행 [정상추진]</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2022년</li> <li>○ 내용 : 인허가 민원 처리시 민원인이 여러 부서를 일일이 방문하여 접수해야 하는 불편을 해소하기 위해 사전심사청구제 및 원스톱서비스 시행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원스톱 행정처리 확대시행 업무 발굴 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건물표시변경 등기촉탁 원스톱 서비스</li> <li>- 지적공부정리 원스톱서비스</li> </ul> </li> <li>○ 안심상속 원스톱서비스 재산조회 항목 2종 추가 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설근로자 퇴직공제금 가입여부</li> <li>- 건축물 소유여부</li> </ul> </li> <li>○ 민원안내 도우미제 운영</li> </ul>
