



**민선7기 공약사업 추진실적 점검결과**  
**[2019. 12월말 기준]**



# 민선 7기 공약사업 추진실적 점검결과

◇ 2019년 12월말 기준 민선7기 군수 공약 추진실적 점검결과임

## I 민선7기 공약사업 목표

꿈과 희망이 넘치는 **레인보우** 영동





**5대분야 9개 핵심과제**

분야별	핵심과제	건수
5대 분야	9개 핵심과제	73
육아·청소년	○ 안전하고 바르게 성장하는 영·유아	6
	○ 건강한 청소년 교육환경 조성	4
농업·산업경제	○ 군민이 체감하는 일등 농업군 육성	10
	○ 모두가 잘사는 민생경제 활성화	4
문화·체육·관광 지역개발	○ 명실상부한 문화관광도시 완성	8
	○ 안전하고 균형 있는 지역발전	20
	○ 편리한 생활체육환경 조성	3
사회복지	○ 다 함께 행복한 복지 실현	13
군정혁신	○ 깨끗하고 공정한 공직문화 조성	5

## II 추진현황

### < 민선7기 공약사업 추진현황( '19. 12월말 기준) >

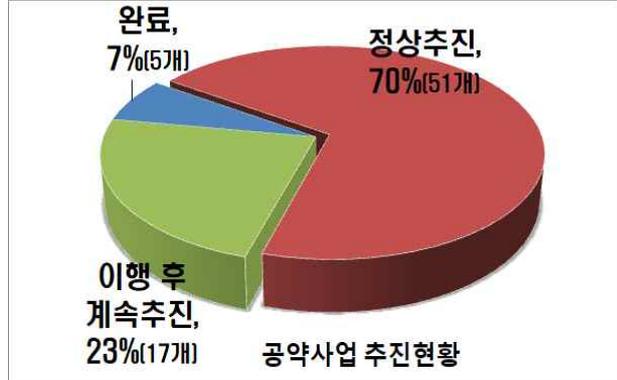

'18.12월말 대비 **16개(증)** / 6개⇒22개

'18.12월말 대비 **31%(증)** / 29%⇒60%

### 1 분야별 현황

분야별	핵심과제	공약 이행 상황				비고		
		완료) (이행후 계속추진)	정상 추진	일부 추진	미착수			
<b>5대분야</b>	<b>73</b>	<b>9개 핵심과제</b>	<b>73</b>	<b>22(17)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
육아·청소년	10	1. 안전하고 바르게 성장하는 영유아	6	3(1)	3			
		2. 건강한 청소년 교육환경 조성	4	4(3)				
농업·산업 경제	14	3. 군민이 체감하는 일등 농업군 육성	10	2(2)	8			
		4. 모두가 잘사는 민생경제 활성화	4		4			
문화·체육 ·관광지역 개발	31	5. 명실상부한 문화관광도시 완성	8		8			
		6. 안전하고 균형있는 지역발전	20	1	19			
		7. 편리한 생활체육환경 조성	3		3			
사회복지	13	8. 다함께 행복한 복지실현	13	8(7)	5			
군정혁신	5	9. 깨끗하고 공정한 공직문화 조성	5	4(4)	1			

1) 완료기준 : (완료) 공약이행이 완료되어 종료된 사업, (이행 후 계속추진) 공약내용 이행완료 후 추가목표를 세워 추진 중인 사업, 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복하는 사업(현재까지의 실적으로 공약을 이행했다고 판단할 수 있는 사업)

## 2 부서별 현황

추진부서	공 약 사업수	공 약 이 행 상 황				비고
		완 료 (이행후 계속추진)	정상추진	일부추진	미착수	
<b>계</b>	<b>73</b>	<b>22(17)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
기 획 감 사 관	2	2(2)				
행 정 과	4	3(2)	1			
국악문화체육과	6		6			
주 민 복 지 과	5	2(2)	3			
가 족 행 복 과	9	7(6)	2			
민 원 과	1		1			
경 제 과	6	1(1)	5			
농 정 과	7	2(2)	5			
산 립 과	1		1			
건 설 교 통 과	9	1(1)	8			
안 전 관 리 과	6	2	4			
도 시 건 축 과	5		5			
농업기술센터	3		3			
보 건 소	2	2(1)	-			
상수도사업소	3		3			
시 설 사 업 소	3		3			
힐링사업소	1		1			

### 3 완료 및 이행 공약사업(22건)

분야별	공약명
육아.청소년(7)	◇ 출산·보육담당부서 신설 <b>(완료)</b>
	◇ 영유아 돌봄서비스 추진 <b>(이행후 계속추진)</b>
	◇ 어린이집, 아동센터 공기청정기 설치 추진 <b>(완료)</b>
	◇ 초·중·고 입학 축하금 지원 <b>(이행후 계속추진)</b>
	◇ 저소득 청소년 건강증진비 지원 <b>(이행후 계속추진)</b>
	◇ 청소년 해외 연수 및 영어캠프 확대 시행 <b>(이행후 계속추진)</b>
	◇ 각급 학교 CCTV설치 및 통합관제센터 연계 <b>(완료)</b>
농업.산업경제(2)	◇ 과일통일포장재 확대 지원 <b>(이행후 계속추진)</b>
	◇ 과수원예농가 수분용 벌 지원 <b>(이행후 계속추진)</b>
문화.체육.관광지역개발(1)	◇ 마을 안전용 CCTV 설치 확대 설치 <b>(완료)</b>
사회복지(8)	◇ 어르신 보청기 지원 <b>(이행후 계속추진)</b>
	◇ 장애인전용차량 증차로 중증장애인지원사업 확대 추진 <b>(이행후 계속추진)</b>
	◇ 여성 안심 환경 조성사업 <b>(이행후 계속추진)</b>
	◇ 한부모 가족 지원 강화 <b>(이행후 계속추진)</b>
	◇ 청년, 노인, 여성 취업지원센터 설치 <b>(이행후 계속추진)</b>
	◇ 오지마을 100원 무지개 택시 주 6일 확대 <b>(이행후 계속추진)</b>
	◇ 영동병원 내 안과 신설 <b>(완료)</b>
	◇ 치매안심센터 확대 운영으로 건강한 노후 <b>(이행후 계속추진)</b>
군정혁신(4)	◇ 지속적 규제개혁, 발전 저해요소 혁파 <b>(이행후 계속추진)</b>
	◇ 민.관 합동, 공직감찰 운영 <b>(이행후 계속추진)</b>
	◇ 공무원 성과중심 발탁 인사시스템 운영 <b>(이행후 계속추진)</b>
	◇ 군민과의 소통 강화 확대 <b>(이행후 계속추진)</b>

### III 예산확보 현황 (2019. 12월말 기준)

#### 1 투자계획

##### ○ 연도별

(단위:백만원)

분야별	합 계	연 도 별						
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
<b>합 계</b>	<b>586,414</b>	<b>137,388</b>	<b>68,537</b>	<b>94,586</b>	<b>127,788</b>	<b>90,732</b>	<b>50,953</b>	<b>16,430</b>
육아.청소년	9,306	190	297	1,068	3,642	3,414	695	-
농업.산업경제	63,051	400	7,349	9,945	19,058	11,799	14,500	-
문화.체육.관광지역개발	481,854	135,713	57,161	74,000	89,942	74,189	34,419	16,430
사회복지	32,203	1,085	3,730	9,573	15,146	1,330	1,339	-
군정혁신	0	-	-	-	-	-	-	-

##### ○ 재원별


(단위:백만원)

분야별	합 계	재 원 별			
		국비	도비	군비	기타
<b>합 계</b> (구성비)	<b>586,414</b> (100%)	<b>232,753</b> (40%)	<b>90,817</b> (15%)	<b>230,317</b> (39%)	<b>32,527</b> (6%)
육아.청소년	9,306	1,641	372	7,286	7
농업.산업경제	63,051	13,829	4,211	25,523	19,488
문화.체육.관광지역개발	481,854	205,928	85,829	189,988	109
사회복지	32,203	11,355	405	7,520	12,923
군정혁신	0	-	-	-	-

## 2 예산확보 현황

(단위 : 백만원)

### < 분야별(자원별) 예산 확보 현황( '19. 12월말 기준) >

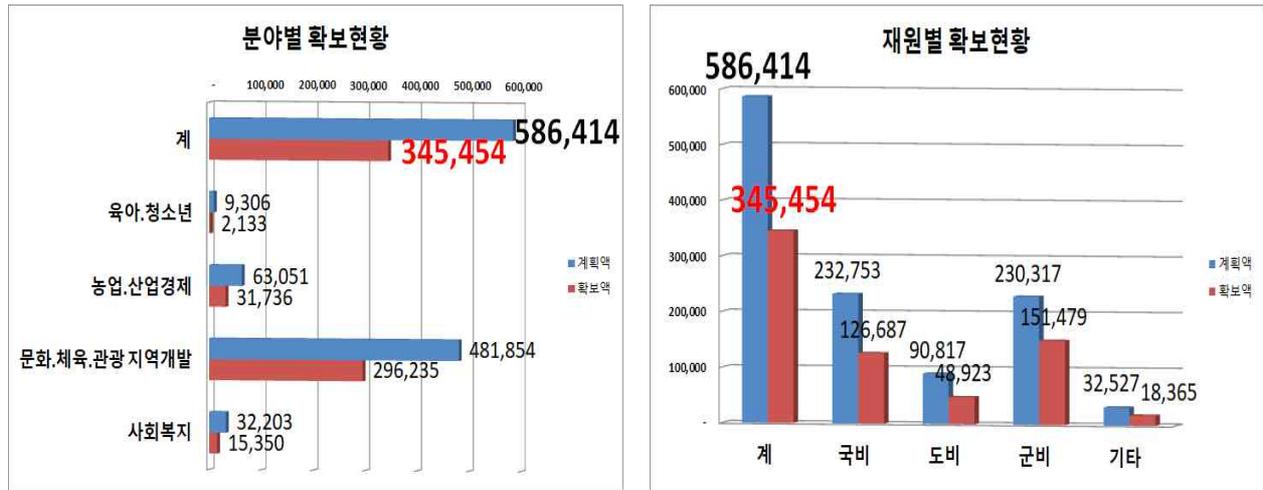

'18.12.말 대비 예산 확보 **223억원(증)** / 323,162백만원 ⇒ 345,454백만원

분야별	계획액	확보액					계획대비 확보(%)
		계	국비	도비	군비	기타	
<b>합 계 (구성비)</b>	<b>586,414</b>	<b>345,454 (100%)</b>	<b>126,687 (37%)</b>	<b>48,923 (14%)</b>	<b>151,479 (44%)</b>	<b>18,365 (5%)</b>	<b>59%</b>
육아.청소년	9,306	2,133	61	27	2,038	7	23%
농업.산업경제	63,051	31,736	3,577	1,258	13,943	12,958	50%
문화.체육.관광 지역개발	481,854	296,235	117,361	47,295	131,579	-	61%
사회복지	32,203	15,350	5,688	343	3,919	5,400	48%
군정혁신	-	-	-	-	-	-	-

### ③ 세부사업별 확보액

공 약 명	투자계획 (A)	확보예산 (B)	확보율(%) (B/A)	주관부서
<b>합 계</b>	<b>586,414</b>	<b>345,454</b>	<b>59%</b>	
1-1 출산.보육담당부서 신설	-	-	비예산	행 정 과
1-2 영유아 돌봄서비스 추진	269	89	33%	가 족 행 복 과
1-3 육아종합지원센터 건립	2,500	-	0%	가 족 행 복 과
1-4 청소년종합문화센터 건립	700	-	0%	가 족 행 복 과
1-5 어린이집, 아동센터 공기청정기 설치 추진	42	42	100%	가 족 행 복 과
1-6 어린이 안심공원 조성	2,400	-	0%	산 림 과
2-1 초.중.고 입학 축하금 지원	1,223	600	49%	가 족 행 복 과
2-2 저소득 청소년 건강증진비 지원	432	162	38%	가 족 행 복 과
2-3 청소년 해외 연수 및 영어캠프 확대 시행	1,425	925	65%	가 족 행 복 과
2-4 각급 학교 CCTV설치 및 통합관제센터 연계	315	315	100%	안 전 관 리 과
3-1 농업인 안전재해보험 확대 지원	4,844	2,548	53%	농 정 과
3-2 친환경 농산물 생산 지원 확대	2,923	1,307	45%	농 정 과
3-3 농촌 일손해결 시스템 구축	904	224	25%	농 정 과
3-4 과일통일포장재 확대 지원	24,500	14,236	58%	농 정 과
3-5 농산물 산지유통센터 시설보완	8,000	8,000	100%	농 정 과
3-6 과수원예농가 수분용 별 지원	270	150	56%	농 정 과
3-7 어서실 악취 저감 시설 설치	1,200	600	50%	농 정 과
3-8 농가소득 증대를 위한 아미노산 액비 공급 확대	600	261	44%	농업기술센터

공 약 명	투자계획 (A)	확보예산 (B)	확보율(%) (B/A)	주관부서
3-9 농기계 임대 및 순회 수리 확대 운영	2,503	2,109	84%	농업기술센터
3-10 콩탈곡기, 잔가지 파쇄기 임대 확대	280	274	98%	농업기술센터
4-1 전통시장, 안전시설 강화 및 맞춤형 지원으로 지역상권 활성화	718	718	100%	경 제 과
4-2 영동산업단지 조기 분양 완료	-	-	비예산	경 제 과
4-3 기업유치 가속화로 일자리 창출을 통한 서민생활 안정	-	-	비예산	경 제 과
4-4 일라이트 활용 고부가가치산업 육성	16,309	1,309	8%	경 제 과
5-1 영동문화원 신축 이전	6,250	-	0%	국악문화체육과
5-2 국악과 과일을 활용한 축제.관광 산업화	1,125	505	45%	국악문화체육과
5-3 도마령 일원 관광자원 개발(용화,상촌)	100	56	56%	국악문화체육과
5-4 송호 관광지 보행교 설치 조기 보완 추진	9,100	5,400	59%	국악문화체육과
5-5 4번국도 영동군 홍보관문 조기 착공	1,800	1,800	100%	국악문화체육과
5-6 국립 난계국악원 유치	-	-	비예산	국악문화체육과
5-7 각 면소재지 경관조명 설치	400	200	50%	도 시 건 축 과
5-8 레인보우힐링타운 2021년 완공	140,100	140,100	100%	힐 링 사 업 소
6-1 가로.보안등 조도 개선	1,460	560	38%	건 설 교 통 과
6-2 교통난 해소를 위한 공영주차장 증설	6,350	7,260	114%	건 설 교 통 과
6-3 국도 19호선 확포장 공사 조기 착공	-	-	비예산	건 설 교 통 과
6-4 교통난 해소를 위한 회전교차로 설치 확대	2,800	1,000	36%	건 설 교 통 과
6-5 군도 확포장공사 추진	5,250	1,800	34%	건 설 교 통 과

공 약 명	투자계획 (A)	확보예산 (B)	확보율(%) (B/A)	주관부서
6-6 농어촌도로 확포장공사 추진	5,465	5,315	97%	건설교통과
6-7 농촌중심지 활성화 사업 조기 완공	77,485	47,105	61%	건설교통과
6-8 창조적마을 만들기사업 추진 (학산면 압치리, 철동리 및 심천면 고당1리)	1,473	1,473	100%	건설교통과
6-9 황간 큰쭉골 소하천 정비사업 조기 착공	3,000	3,000	100%	안전관리과
6-10 자연재해위험지구 정비사업 추진	56,540	27,740	49%	안전관리과
6-11 영동천, 용화천 지방하천 정비사업 조기 착공	74,184	8,100	11%	안전관리과
6-12 시항천 정비사업 추진	10,500	-	0%	안전관리과
6-13 마을 안전용 CCTV 설치 확대 설치	258	258	100%	안전관리과
6-14 철길주변 햇살가득 다담길 정비사업 조기 완공	3,145	3,145	100%	도시건축과
6-15 경부선 영동가도교 확장공사 조기 착공	11,000	11,000	100%	도시건축과
6-16 도시재생(뉴딜)사업 적극 추진	23,400	-	0%	도시건축과
6-17 새뜰마을 조기완공	2,416	2,416	100%	도시건축과
6-18 영동산업단지 주변마을 지방상수도 공급	11,780	4,480	38%	상수도사업소
6-19 심천면 구탄, 장동리 지방상수도 공급	1,412	1,412	100%	상수도사업소
6-20 황산리 일원 지방상수도 공급	2,561	-	0%	상수도사업소
7-1 그라운드 골프장, 정구장 등 스포츠시설 현대화 추진	2,200	2,200	100%	시설사업소
7-2 영동체육공원 조성사업 조기 착공	19,800	19,800	100%	시설사업소
7-3 각종 생활체육시설 태양광 설치 및 경관 조성 추진	500	110	22%	시설사업소

공 약 명	투자계획 (A)	확보예산 (B)	확보율(%) (B/A)	주관부서
8-1 자원봉사센터 빨래방차 증차 운영	427	293	69%	행 정 과
8-2 대중목욕탕, 사우나 등 군민 편의시설 확충	300	300	100%	주 민 복 지 과
8-3 어르신 보청기 지원	520	130	25%	주 민 복 지 과
8-4 장애인전용 건강지원센터 건립	2,500	-	0%	주 민 복 지 과
8-5 장애인전용차량 증차로 중증장애인지원사업 확대 추진	200	80	40%	주 민 복 지 과
8-6 장애인 등록 검사비 지원	160	-	0%	주 민 복 지 과
8-7 여성 안심 환경 조성사업	157	95	61%	가 족 행 복 과
8-8 한부모 가족 지원 강화	80	20	25%	가 족 행 복 과
8-9 산단형 행복주택 200호 조기공급	21,560	9,400	44%	경 제 과
8-10 청년, 노인, 여성 취업지원센터 설치	1,934	909	47%	경 제 과
8-11 오지마을 100원 무지개 택시 주 6일 확대 운행	981	683	70%	건 설 교 통 과
8-12 영동병원 내 안과 신설	-	-	비예산	보 건 소
8-13 치매안심센터 확대 운영으로 건강한 노후 보장	3,384	3,440	102%	보 건 소
9-1 지속적 규제개혁, 발전 저해요소 혁파	-	-	비예산	기 획 감 사 관
9-2 민.관 합동, 공직감찰 운영	-	-	비예산	기 획 감 사 관
9-3 공무원 성과중심 발탁 인사시스템 운영	-	-	비예산	행 정 과
9-4 군민과의 소통 강화 확대	-	-	비예산	행 정 과
9-5 원스톱 행정처리 확대 시행	-	-	비예산	민 원 과

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황						
1-1	출산보육담당부서 신설 <b>(완료)</b>	○ 부서 내 사무분장을 재조정하여 출산·양육 맞춤형 서비스 지원 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">기 존</th> <th style="width: 50%;">신 설(안)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">&lt;생활지원과&gt;</td> <td style="text-align: center;">&lt;가족행복과&gt;</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">- 여성정책팀, 아동청소년팀, 평생학습팀, 식품안전팀</td> <td style="vertical-align: top;">- 여성정책팀, 청소년드림팀 평생학습팀, <b>영유아보육팀</b> 식품안전팀</td> </tr> </tbody> </table>	기 존	신 설(안)	<생활지원과>	<가족행복과>	- 여성정책팀, 아동청소년팀, 평생학습팀, 식품안전팀	- 여성정책팀, 청소년드림팀 평생학습팀, <b>영유아보육팀</b> 식품안전팀	○ 조례 및 규정 개정 - 영동군 행정기구설치 조례 개정 : 2018. 11. 19. - 영동군 지방공무원 정원관리 등에 관한 규정 개정 : 2018. 11. 30. ○ 조직개편 시행 및 인사발령통지 : 2019. 1. 1.
기 존	신 설(안)								
<생활지원과>	<가족행복과>								
- 여성정책팀, 아동청소년팀, 평생학습팀, 식품안전팀	- 여성정책팀, 청소년드림팀 평생학습팀, <b>영유아보육팀</b> 식품안전팀								
1-2	영유아 돌봄서비스 추진 <b>(이행후 계속추진)</b>	○ 기간 : 2018. ~ 2022. ○ 내용 - 시간연장형어린이집운영 : 아침7:30~21:30분까지 시간연장하여 영유아돌봄(2개소) - 시간제보육운영 : 어린이집 미이용 아동(6-36개월미만) 최대4시간까지 일시보육(1개소) - 아이돌봄서비스지원 : 맞벌이, 한부모 다자녀가정의 양육공백시 시간제 또는 종일제로 신청하여 돌봄(1개소) ○ 사업비 : 269백만원 (국비135, 지방비134)	○ '19.03. : 시간연장형 3개소 운영 - 해나라, 동화나라, 심천 : 시간제보육 1개소 운영 - 한빛 : 아이돌봄지원 1개소 운영 - 다문화가족지원센터 ○ '19.12. : 시간연장형 4개소 운영 - 해나라, 동화나라, 심천, 세림 : 시간제보육 1개소 운영 - 한빛 : 아이돌봄지원 1개소 운영 - 다문화가족지원센터						
1-3	육아종합지원센터 건립 <b>(정상추진)</b>	○ 기간 : 2019. ~ 2022. ○ 위치 : 영동읍 시내적정 소재지 ○ 사업규모 : 연면적 1,000㎡(지상2층) ○ 내용 : 영유아를 위한 장난감대여실, 맘카페, 시간제보육실, 부모교육실, 놀이터 등 ○ 사업비 : 2,500백만원 (국비1,000, 지방비1,500)	○ '19.10~11. -국회 정부예산안 예결특위에 영동군 육종 반영되도록 안건 상정 협의 출장 ○ '19.12 - 영동군 육아종합지원센터 건립 국비10억 확보						
1-4	청소년종합문화센터 건립 <b>(정상추진)</b>	○ 기간 : 2020. ~ 2024. ○ 위치 : 영동군 영동읍 영동천2길 29 (현 영동문화원 자리) ○ 사업규모 : 875㎡ ○ 방법 : 현 문화원 건물 리모델링 ○ 사업비 : 700백만원 (국비 490, 군비 210)	○ 현 영동문화원의 이전이 선행되어야 사업 추진 가능 ○ 영동문화원 이전 예정 : 2022년						
1-5	어린이집, 지역아동센터 공기청정기 설치 추진 <b>(완료)</b>	○ 기간 : 2018. ~ 2019. ○ 대상 : 25개소 (어린이집16,지역아동센터9) ○ 내용 : 공기청정기 구입비용지원 ○ 사업비 : 42백만원 (국비16, 지방비25)	○ '18.12. : 어린이집 지원완료 (16개소, 59대) ○ '19.04. : 지역아동센터 지원완료 (9개소, 9대)						

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
1-6	<b>어린이 안심공원 조성</b> <b>(정상추진)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 영동읍 동정리 93-7번지 외 2필지</li> <li>○ 기간 : 2020. ~ 2021.</li> <li>○ 사업량 : 2,764㎡</li> <li>○ 사업비 : 2,400백만원</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자연체험형 시설 (징검다리 및 출렁다리, 나무오르기 등)</li> <li>- 조합놀이대 시설 (창의력 향상을 위한 그네, 시소 등)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농촌중심지활성화 사업(영동읍)계획에 따른 업무 협의 완료 (2018.10.4.)</li> <li>○ 매도의향서(영동읍 동정리 93-7번지) 제출 확인(2018.12.12.)</li> <li>○ 공원 조성계획을 위한 지역주민 여론 조사 완료(2019.03.04.)</li> <li>○ 사업 대상지(동정리 93-7 외 2필지) 선정 완료(2019. 09)</li> </ul>
2-1	<b>초·중·고 입학축하금 지원</b> <b>(이행후 계속추진)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2019. ~</li> <li>○ 지원내용 : 입학일 기준 부모와 자녀가 군내 주민등록을 두고 실제 거주하면서 초·중·고등학교에 최초 입학하는 경우 입학축하금 지원</li> <li>○ 지원금액 : 초등학교 입학생 20만원 중 학교 입학생 30만원 고등학교 입학생 50만원</li> <li>○ 사업비 : 1,223백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.12. : 영동군 인구늘리기시책 지원 조례 개정</li> <li>○ '19.03. : 입학축하금 신청·접수</li> <li>○ '19.05. ~ : 입학축하금 지급 - 280,100천원(810명) (초 243명, 중 260명, 고 307명)</li> <li>○ '19.12. : 영동군 인구늘리기시책 지원 조례 개정 (지원대상 완화)</li> </ul>
2-2	<b>저소득 청소년 건강증진비 지원</b> <b>(이행후 계속추진)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2019. ~</li> <li>○ 내용 : 관내 기초생활수급가구의 청소년에게 월 30,000원 건강 증진비 지원</li> <li>○ 사업비 : 432백만원(군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.10. : 영동군 저소득 청소년 건강증진비 지원 조례제정 및 예산확보</li> <li>○ '19.02. ~ : 매월 25일(30,000원 지원)</li> </ul>
2-3	<b>청소년 해외연수 및 영어캠프 확대 시행</b> <b>(이행후 계속추진)</b>	<p><b>[영어캠프]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 매년 여름방학</li> <li>○ 참여인원 : 230명</li> <li>○ 사업내용 : 원어민 중심의 합숙형 영어캠프</li> <li>○ 사업비 : 115백만원</li> </ul> <p><b>[해외연수]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 매년 겨울방학</li> <li>○ 참여인원 : 30명</li> <li>○ 사업내용 : 영어능력향상과 현지교육·문화교류를 위한 해외연수</li> <li>○ 사업비 : 135백만원</li> </ul>	<p><b>[영어캠프]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.07. : 영어캠프 추진/기수별 4박5일 / 인천영어마을 - 참여인원 : 초 100명 / 중 100명</li> <li>○ '19.07. : 영어캠프 추진/기수별 4박5일 / 인천영어마을 - 참여인원 : 초 110명 / 중 120명</li> </ul> <p><b>[해외연수]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.01. : 초·중학생 해외연수 추진 / 20명 / 미국</li> <li>○ '19.01. : 중학생 해외연수 추진 / 30명 / 미국</li> </ul>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
2-4	각급학교CCTV 설치 및 통합관제센터 연계 <b>[완료]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 학교내 각종 사건·사고등 범죄 예방 CCTV 설치 및 통합관제센터 연계</li> <li>○ 기 간 : 2019. 1. ~ 12.</li> <li>○ 대 상 : 관내 초·중·고교</li> <li>○ 대 수 : 고성능 CCTV 14식 57대</li> <li>○ 사업비 : 315백만원(군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '19년 사업예산 확보 : 18. 12. 현재</li> <li>○ '19.04. : 영동교육지원청 사업협의</li> <li>○ '19.05. : 관내 12개 중·고교 방문 사업개요 설명 및 협의</li> <li>○ '19.05. : 충북교육청 사업협의</li> <li>○ '19.07. : 사업설계 및 발주</li> <li>○ '19.10. : 준공 및 관제센터 연계완료</li> </ul>
3-1	농업인 안전재해보험 확대 지원 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2018 ~ 2022</li> <li>○ 사업대상 : 만15세 ~ 87세의 영농 활동에 종사하는 농업인</li> <li>○ 사업비 : 4,844백만원 (국비 2,422, 도비 361, 군비 714, 기타 1,347)</li> <li>○ 사업내용 - 피보험자당 주계약 보험료 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '19년 농업인 안전보험보조 지원비율 확대 - 보조비율 : 65% ⇒ 70%</li> <li>- 1회추경 군비확보 (보조비율확대분) : 46,400천원</li> <li>○ '19.12. : 집행완료(593백만원)</li> </ul>
3-2	친환경 농산물 생산지원 확대 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2018. ~ 2022.</li> <li>○ 사업대상 : 친환경인증을 받은 농업인, 농업법인, 생산자단체 등</li> <li>○ 사업비 : 2,923백만원 (국비 434, 도비 476, 군비 1,321, 기타 692)</li> <li>○ 사업내용 - 친환경농업 직접지불제 외 6개 사업</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.12. : 사업완료 및 정산 및 '19년 예산 확보</li> <li>○ '19.01. : 사업 지침시달, 신청접수</li> <li>○ '19.03. : 대상자 선정 및 보고</li> <li>○ '19.04. : 사업비 배정 및 사업시행</li> <li>○ '19.10. : 2회추경 예산 확보 및 사업추진</li> <li>○ '19.12. : 사업완료 및 '20년 예산확보</li> </ul>
3-3	농촌 일손해결 시스템 구축 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2019. ~ 2022.</li> <li>○ 내용 - 농촌인력지원센터 운영 - 일손봉사 긴급지원반 운영 - 외국인계절근로자 사업 확대 - 봄·가을 농촌일손돕기 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.11. : 인력지원센터 부지 검토</li> <li>○ '18.12. : 농업인력지원센터 사업계획 수립</li> <li>○ '19.09. : 전문상담원(기간제근로자) 채용</li> <li>○ '19.10. : 인력지원센터 보수공사 완료</li> <li>○ '19.11. : 인력지원센터 홈페이지 구축 완료</li> <li>○ '19.11.6~12.20. : 인력지원센터 시범운영</li> </ul>
3-4	과일통일포장재 확대 지원 <b>[이행후 계속추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2018. ~ 2022.</li> <li>○ 사업대상 : 포도 등 5개 품목을 표준규격에 맞게 우리군 통일포장재로 출하하는 생산자 조직</li> <li>○ 사업비 : 24,500백만원 (군비 12,000, 기타 12,500)</li> <li>○ 사업내용 : 포도 등 5개 품목을 표준규격에 맞게 사용하는 생산자 조직에 과일 통일포장재 제작지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년 과일 통일포장재 보조액 25억 확보를 통한 보조비율 50% 달성</li> <li>○ '19.12. : 품목별 사업 집행실적에 따라 22억원 집행 완료</li> </ul>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
3-5	농산물 산지유통센터 시설보완 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2018.~2020.</li> <li>○ 위치 : 영동군 영동읍 설계리 377-1</li> <li>○ 사업규모 : 1개소</li> <li>○ 사업비 : 8,000백만원 (국비 1,688, 도비 834, 군비 2,434, 기타 3,064)</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국비공모 : 소방·전기·토목시설, 선별장, 저온창고 등</li> <li>- 군비지원 : 선별시스템, 세척기등 기계장비류</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부지확보 완료(설계리 377-1)</li> <li>○ '19.08 : 공모사업확정</li> <li>○ '19.08. : 지방재정투자사업 심사 의뢰 자료제출</li> <li>○ '19.08 : APC지원사업 세부사업 심의</li> <li>○ '19.09. : 지방재정투자 현지심사</li> <li>○ '19.12. : 건축설계 심의</li> <li>○ 기본설계 추진 및 컨설팅</li> </ul>
3-6	과수원에농가 수분용 별 지원 <b>[이행후계속추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업대상 : 포도를 제외한 관내 과수원에 시설하우스 재배농가</li> <li>○ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년</li> <li>○ 사업규모 : 270ha</li> <li>○ 사업비 : 270백만원 (보조 50%, 자담 50%)</li> <li>○ 주요내용 : 과수원에 시설재배농가에 수정용 별 구입비 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년 예산 수립 : 70백만원(보조 35, 자담 35)</li> <li>○ 2019년 사업완료 : 73농가 55.7ha 67.3백만원</li> <li>○ 2020년 사업 수요조사 : 95농가 977군 93.3백만원</li> </ul>
3-7	어서실 약취 저감 시설 설치 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2022년</li> <li>○ 위치 : 영동읍 부용리(어서실)</li> <li>○ 내용 : 어서실 양돈농가 실정에 맞는 축산약취 저감을 위한 시설·장비 설치</li> <li>○ 사업비 : 1,200백만원 (군비600, 자담600)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '19.01. : 약취저감 선진지 담당팀장 현장컨설팅 실시</li> <li>○ '19.03. : 약취개선 선진지견학 실시 (경남 고성군)-2차</li> <li>○ '19.03. : '19년 사업계획 농가협의</li> <li>○ '19.05. : '19년 사업계획확정 및 보조금교부 결정</li> <li>○ '19.08. : '19년 사업 대상 2호 중 1호 완료(125백만원)</li> <li>○ '19.09. : 약취모니터링 장비 설치 완료(3개소)</li> <li>○ '19.11. : '19년 약취저감시설 설치 완료(2개소)</li> </ul>
3-8	농가소득 증대를 위한 아미노산 액비 공급 확대 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018~2022년</li> <li>○ 내용 : 다양한 홍보활동을 통한 액비 수령 농가 확대</li> <li>○ 사업비 : 600백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년 유용미생물 보급현황 총 214톤 / 5,563호 보급 - 아미노산액비 114톤/2,794호 보급 전년대비 126% / 107% 증가</li> </ul>
3-9	농업기계 임대 및 순회 수리 확대 운영 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018~2022년</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농업기계 임대사업 확대 운영을 위한 임대사업장 신축</li> <li>- 농업기계 순회수리반 증설을 통한 순회수리 확대 운영</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.10. : 임대사업장 신축 공유재산 심의 완료</li> <li>○ '18.12. : 임대사업장 신축 예산 확보 1,500백만원</li> <li>○ '18.12. : 농업기계 순회수리 장비 예산 확보 291백만원</li> </ul>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업비 : 2,503백만원 (도비 20, 군비 2,483)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '19.4. : 순회수리교육 차량 구입</li> <li>○ '19.2. : 신축공사 설계용역계약</li> <li>○ '19.3. : 순회수리 근무자 증원 5명</li> <li>○ '19.5. : 설계 완료, 일상 감사 및 계약 심사 완료</li> <li>○ '19.6. : 임대사업장 착공</li> <li>○ '19.12. : 임대사업장 완공</li> <li>○ 2019년도 4분기까지 추진실적               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 순회수리 170회, 3,509농가, 5,994대</li> </ul> </li> </ul>
3-10	<p style="text-align: center;"><b>콩탈곡기, 잔가지파쇄기 임대 확대</b> <b>[정상추진]</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2019~2022년</li> <li>○ 내용 : 농업기계 임대장비 추가 확보를 통한 임대 확대로 농민들의 적기 영농도모</li> <li>○ 사업비 : 280백만원(군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.12. : 3회 추경 예산 30백만원 (잔가지파쇄기 3대)</li> <li>○ '18.12. : 19년 본 예산 80백만원 (잔가지파쇄기 5대, 콩탈곡기 3대)</li> <li>○ '19.03. : 콩탈곡기 3대, 잔가지파쇄기 5대 구입</li> <li>○ '19.04. : 잔가지파쇄기 3대 구입</li> <li>○ '19.09. : 2회 추경예산(국비) 67백만원 확보 (잔가지파쇄기 7대)</li> <li>○ '19.10. : 잔가지파쇄기 7대 구입</li> </ul>
4-1	<p style="text-align: center;"><b>전통시장, 안전시설 강화 및 맞춤형 지원으로 지역상권 활성화</b> <b>[정상추진]</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 영동전통시장</li> <li>○ 사업규모 : 718백만원 (국305.2, 도39.24, 군373.63)</li> <li>○ 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>-영동전통시장 화재알림시설 설치사업 (148개/116백만원)</li> <li>-전통시장 아케이트 및 접포 노후전선 교체사업 (2개시장/320백만원)</li> <li>-전통시장 가판대(이동용) 설치 지원 (110대/72백만원)</li> <li>-전통시장구역 도로 전면재포장 (600m/200백만원)</li> <li>-전통시장 소화기 설치사업 (140대/6백만원)</li> <li>-전통시장 이정표 설치사업 (1개소/3백만원)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018년 국도비예산확보 (91.64백만원)</li> <li>○ 2019년 국도비 공모사업 신청완료 (252.8백만원)</li> <li>○ 2018.12월               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전통시장 소화기 설치사업 완료</li> <li>- 전통시장 이정표 설치사업 완료</li> </ul> </li> <li>○ 2019.5월               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전통시장구역 도로 전면재포장 완료</li> </ul> </li> <li>○ 2019.6월               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전통시장 가판대 설치지원 완료</li> </ul> </li> <li>○ 2019.12월               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전통시장 아케이트 및 노후전선 교체사업 완료</li> </ul> </li> </ul>
4-2	<p style="text-align: center;"><b>영동산업단지 조기분양 완료</b> <b>[정상추진]</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 영동군 용산면 영동산업단지</li> <li>○ 분양면적 : 593,593㎡</li> <li>○ 사업내용 : 조기분양 완료 (2020년 까지)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 분양현황 : 29개사 540,055㎡ (총 분양면적의 91%)</li> <li>○ 상담 중 기업 : 1개사 (분양 시 분양률 96.7%)</li> </ul>
4-3	<p style="text-align: center;"><b>기업유치 가속화로 일자리 창출을 통한 서민생활 안정</b> <b>[정상추진]</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 영동군 (영동산업단지, 황간물류단지 중점)</li> <li>○ 고용목표 : 800명(2022년까지)</li> <li>○ 사업내용 : 기업유치를 통한 일자리 창출</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고용인원 : 288명(이행률 36%)</li> <li>○ 입주율               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 황간물류단지 : 59%</li> <li>- 영동산업단지 : 48%</li> </ul> </li> </ul>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
4-4	일라이트 활용 고부가가치 산업 육성 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2022년</li> <li>○ 일라이트 안정적 공급기반 구축</li> <li>○ 일라이트 성분분석 및 제품적용 실증테스트</li> <li>○ 일라이트 연구 센터 구축</li> <li>○ 사업비 : 16,309백만원 (국 9,000, 도 2,300, 군 3,809, 기타 : 1,200)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 채굴권 5개소, 탐사권 1개소 허가·등록 완료</li> <li>○ 일라이트 고부가가치 상용화 연구용역 완료</li> <li>○ 영동 일라이트 지식산업센터 기본계획수립 및 타당성 조사용역 완료</li> <li>○ 영동 일라이트 상표개발 및 출원용역(진행중)</li> <li>○ 국비학보를 위한 중앙부처 방문건의 및 협의 : 12회</li> <li>○ 국비미반영(충북 3개소중 1개소 반영)</li> </ul>
5-1	영동문화원 신축 이전 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2020 ~ 2022년</li> <li>○ 위치 : 영동읍 매천리 463번지의 3필지</li> <li>○ 내용 : 영동문화원 신축 이전</li> <li>○ 사업비 : 6,250백만원 (국비2,975/도비200/군비3,075)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019.2 : '20년 농촌중심지활성화 사업(농림축산식품부) 예산 공모 신청(2019.02.) [미선정]</li> <li>○ 2019.10: '20년 본예산 편성 요구(기본계획수립용역, 기본 및 실시설계용역비 260백만원)</li> </ul>
5-2	국악과 과일을 활용한 축제관광 산업화 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 영동투어 여행코스 개발을 통한 관광 산업화</li> <li>○ 4대 축제기간 영동사랑상품권 활용 지역경제 활성화 추진</li> <li>○ 와이너리 투어 체험 프로그램 개발 및 농가교육</li> <li>○ 관광 마케팅 홍보물품 제작</li> <li>○ 관광안내사 확대운영 및 교육강화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '19.10. : 국악,와인축제 방문객 (220,658명)</li> <li>○ '19.10. : 국악,와인축제 상품권지급 (1,504매)</li> <li>○ '19.10. : 와인축제 와인판매액 (180백만원 / 12,000명)</li> <li>○ '19.10. : 와인축제 와인잔 판매액 (18백만원 / 6,087개)</li> <li>○ '19.11 : 문화관광해설사 역량 강화 워크숍 실시</li> </ul>
5-3	도마령 일원 관광자원 개발(용화, 상촌) <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 도마령 일원(용화, 상촌)</li> <li>○ 기간 : 2019 ~ 2022년</li> <li>○ 내용 : 타당성 조사 1식</li> <li>○ 사업비 : 100백만원(군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '19.04. : 1회 추경예산 확보</li> <li>○ '19.05. : 도마령 일원(용화, 상촌) 관광개발계획 수립 용역 착수</li> <li>○ '19.07. : 주민설명회(용화, 상촌)</li> <li>○ '19.09. : 사전보고회(도마령 일원 관광개발기본구상 보고 등)</li> <li>○ '19.12. : 최종보고 및 관광개발계획 수립 용역 완료</li> </ul>
5-4	송호 관광지 보행교 설치 조기 보완 추진 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 양산면 송호관광지~양산팔경 금강둘레길</li> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2020년</li> <li>○ 내용 : 보행교 설치 L=290m, B=2.5m</li> <li>○ 사업비 : 9,100백만원 (국비 2,700, 군비 6,400)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.10. : 실시설계 용역 일시정지, 토질조사 용역 착수</li> <li>○ '18.11. : 토질조사 용역 완료, 교량 설치위치 및 형식공법 검토 ※ 교량 형식 변경(출렁다리→보행교)</li> <li>○ '19.01. : 공법·자재 선정 기술자문 위원회 개최(서면심의)</li> <li>○ '19.04. : 하천점용 협의</li> <li>○ '19.09. : 하천점용허가 완료 (대전지방국토관리청)</li> <li>○ '19.11. : 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 이행 완료</li> <li>○ '19.12. : 실시설계용역 완료 및 공사 착공</li> </ul>

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진상황
5-5	4번국도 영동군 홍보관문 조기 착공 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 추풍령면 추풍령리(국도4호선), 학산면 봉소리(국도19호선)</li> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2020년</li> <li>○ 내용 : 홍보관문 설치 2개소</li> <li>○ 사업비 : 1,800백만원(군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.09. : '18년 2회추경 예산확보</li> <li>○ '19.03. : 디자인 및 실시설계 용역 착수(19. 3. ~ 19. 7) ※ 도 경계 홍보관문 상징성과 주변 환경 여건 등을 고려하여 설치 위치 변경 (학산면 서산리→학산면 봉소리)</li> <li>○ '19.05. : 의원간담회 자료 제출 및 의견 수렴</li> <li>○ '19.08. : 영동군 공공디자인위원회 심의(재심의)</li> <li>○ '19.09. : 영동군 공공디자인위원회 심의(조건부 가결)</li> <li>○ '19.11. : 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 이행 완료</li> <li>○ '19.12. : 디자인 및 실시설계용역 완료, 공사 착공</li> </ul>
5-6	국립 난계국악원 유치 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○기간 : 2019년 ~ 2022년</li> <li>○위치 : 심천면 고당리 일원</li> <li>○내용 : 국립 난계국악원 유치 - 국악연구·제작시설, 국악교육, 연수 시설, 기타 편의시설 등 설치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 04. 25 : 국립 난계국악원 (가칭) 유치 중앙기관 관계자 영동 방문 (국립국악원 4명, 문광부 2명, 도 3명)</li> <li>○ 2018. 07. 24 : 국립 난계국악원 (가칭) 유치 국립국악원장 면담 (도 3명, 군 4명)</li> <li>○ 2018. 11. 14 : 국립 난계국악원 (가칭) 유치 박덕흠 의원 사무실 방문 (군 3명)</li> <li>○ 2018. 11. 18 : 국립 난계국악원 유치 기획재정부(문화예산과) 담당사무관 면담 (도 2명, 군 3명) - 국립국악원 영동 건립을 위한 타당성 용역비(2억) 반영 건의</li> <li>○ 2019. 02. 25 : .충북도 문화예술 산업과장 군수님 면담 - 국립국악원 분원 유치 관련 우리군 입장 의견 수렴</li> <li>○ 2019. 04. 01 : 박일훈 前 국립국악원장 면담 - 분원 유치 업무추진 자문</li> <li>○ 2019. 05. 10 : 민의식 한국종합 예술학교 음악과장 면담 - 국립국악원 분원 유치 협조 요청 (대외 홍보 등)</li> <li>○ 2019. 08. : 국립국악원 소속국악원 건립 타당성 검토 기준 마련 연구용역 착수 (주관 : 국립국악원, 용역사 : 한국경제경영연구소)</li> </ul>
5-7	각 면소재지 경관조명 설치 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018년 ~ 2022년</li> <li>○ 사업내용 : 건축물, 교량, 도로, 가로등에 대한 경관조명 설치</li> <li>○ 총사업비 : 400백만원(군비) - 2019년 예산 : 100백만원(군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수요조사 : 2018. 8. 28. ~ 11. 15. (황간면 외 2곳)</li> <li>○ '18.12. : '19년 본예산 확보</li> <li>○ 시범사업 : 황간역일원 (도시재생사업연계)</li> </ul>

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진상황
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019년 1월 : 주민의견수렴</li> <li>- 2019년 2월~3월 : 시범설치</li> <li>- 2019년 4월~9월 : 대상지확정 및 설계완료</li> <li>- 2019년 10월~11월 : 황간 준공</li> <li>- 2019년 12월 : 용화 착공 후 진행</li> <li>- 매곡 계약진행, 추풍령면 설계 중</li> </ul>
5-8	<b>레인보우 힐링타운</b> <b>2021년 완공</b> <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 영동읍 매천리 산35-1번지 일원</li> <li>○ 사업기간 : 2014 ~ 2021</li> <li>○ 사업비 : 140,100백만원</li> <li>○ 사업내용 : 영동와인터널, 힐링센터, 문화예술회관, 웰니스단지, 문화마당, 도로, 주차장 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.06 : 투자선도지구 지구지정</li> <li>○ '18.10. : 영동와인터널 정식개장</li> <li>○ '18.10. : 지역개발사업계획 승인고시</li> <li>○ '18.11. : 투자선도지구 실시계획 승인</li> <li>○ '18.12. : 지역개발사업 실시계획 승인</li> <li>○ 산림조경숲 조성사업 준공</li> <li>○ 와인터널 주차장 준공</li> <li>○ 웰니스단지 조성사업 3차분 착공</li> <li>○ 투자선도지구 기반시설 구축사업 착공</li> <li>○ 레인보우 힐링타운 광장 조성사업 착공</li> <li>○ 과일나라 테마공원 연결도로 구축사업 착공</li> <li>○ 레인보우 힐링센터 건립사업 착공</li> <li>○ 레인보우 힐링센터 감리용역 착공</li> <li>○ 레인보우 힐링관광지 기반시설 감리용역 착공</li> <li>○ 투자선도지구 기반시설 구축사업 1차분 준공</li> <li>○ 힐링센터 건립사업 지열설비 착공</li> </ul>
6-1	<b>가로·보안 조도개선</b> <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2022년</li> <li>○ 내용 : 11개 읍·면 주민의 야간 보행자편의 제공 및 노후 가로 등의 조도효율 개선</li> <li>○ 사업비 : 1,460백만원(군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018년 4월 11개 읍·면 조도개선 214개소 사업추진 완료</li> <li>○ 2018년 12월 영동읍외 4개면 225개소 조도개선 사업추진 완료</li> <li>○ 2019년도 조도개선 사업비 (군비) 300백만원 확보</li> <li>○ 2019년도 읍·면별 사업수요대상지 수요조사 추진</li> <li>○ 2019년 5월 읍·면 가로(보안)등 239개소 설치완료</li> <li>○ 2019년 12월 노후 보안등 223개소 교체</li> </ul>
6-2	<b>교통난 해소를 위한</b> <b>공영주차장 증설</b> <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2020년</li> <li>○ 위치 : 영동읍 계산리 484-6번지 외 3개소</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영산동 공영주차장 복층화 사업</li> <li>- 영동읍 구교리 주차장 조성 사업</li> <li>- 매천리 공영주차장 조성 사업</li> <li>- 황간면 남성리 공영주차장 조성 사업</li> </ul> </li> <li>○ 사업비 : 6,350백만원 (국비 1,609 / 군비 4,741)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.06. : 영동읍 구교리 주차장 조성 사업 착공</li> <li>○ '18.08. : 공모사업 선정(영산동 공영주차장 복층화 사업)</li> <li>○ '18.11. : 매천리 공영주차장 조성 사업 토지매입 및 실시설계</li> <li>○ '18.11. : 황간면 남성리 공영주차장 조성 사업 착공</li> <li>○ '19.03. : 황간면 남성리 공영주차장 조성 사업 준공</li> </ul>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○'19.04. : 영산동 공영주차장 복층화 사업 주민설명회 실시</li> <li>○'19.05. : 영동읍 구교리 주차장 조성 사업 설계변경</li> <li>○'19.08. : 영동읍 구교리 주차장 조성 사업 준공</li> <li>○'19.09. : 매천리 공영주차장 조성 사업 착공</li> <li>○'19.10. : 영산동 공영주차장 복층화 사업 주민설명회(2차) 실시</li> <li>○'19.12. : 영산동 공영주차장 복층화 사업 BF예비인증 용역 착수</li> <li>○'19.12. : 영산동 공영주차장 복층화 사업 BF예비인증 완료</li> </ul>
6-3	<b>국도19호선 확포장 공사 조기 착공 [정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2024년</li> <li>○ 위치 : ㉠영동IC ~ 영동산업단지           ㉡영동병원 ~ 울리교차로</li> <li>○ 내용 : 도로확포장 :           ㉠ L=4.58km           ㉡ L=7.34km</li> <li>○ 사업비 : 156,000백만원(국비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.12.:영동병원~U1대교차로 착공</li> <li>○ U1대교차로 ~ 영동IC 실시설계용역 완료</li> <li>○ U1대교차로~울리교차로 보상추진</li> </ul>
6-4	<b>교통난 해소를 위한 회전교차로 설치확대 [정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2021년</li> <li>○ 위치 : 관내일원           (구교3, 구교4, 부용4거리)</li> <li>○ 내용 : 회전교차로 3개소 설치</li> <li>○ 사업비 : 2,800백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○'18.1:회전교차로 2개소 실시설계용역 준공(구교삼,사거리)</li> <li>○'18.2:주민설명회 개최</li> <li>○'18.3:관계기관 및 보상협의 완료</li> <li>○'19.6:구교삼거리 및 구교사거리 회전교차로 설치공사 착공(2019년 12월 준공)</li> </ul>
6-5	<b>군도 확포장공사 추진 [정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018~2021년</li> <li>○ 위치 : 관내일원           (양강(구강~죽산), 추풍령(사부리))</li> <li>○ 내용 : 도로확포장</li> <li>○ 사업비 : 5,250백만원(군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○'18.3:실시설계용역 준공(사부리)</li> <li>○'18.6:기공승낙서 징구(구강-죽산)</li> <li>○'18.10:보상금지금결정(사부리)</li> <li>○'18.11:주민설명회개최(구강-죽산)</li> <li>○'19.2:추풍령(사부리)도로확포장공사 공사집행</li> <li>○'19.4:관계기관협의 및 보상협의 중(구강~죽산)</li> <li>○'19.8:추풍령(사부리)도로확포장공사 준공</li> </ul>
6-6	<b>농어촌도로 확포장공사 추진 [정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018~2022년</li> <li>○ 위치 : 관내일원           (계룡리,어촌리, 학촌-마곡, 명덕-영국사)</li> <li>○ 내용 : 도로확포장</li> <li>○ 사업비 : 5,465백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○'18.1~12:보상협의(어촌도로)</li> <li>○'18.3:실시설계용역 준공(계룡리)</li> <li>○'18.2:주민설명회개최(학촌~마곡)</li> <li>○'18.5:보상금지금결정 및 관련법 협의(계룡리)</li> <li>○'18.8:보상협의(학촌~마곡)</li> <li>○'18.11:공사착공(계룡리)</li> <li>○'18.12:실시설계용역추진(명덕-영국사)</li> <li>○'19.3:실시설계용역준공(명덕-영국사)</li> <li>○'19.12:학촌-마곡간도로, 어촌도로, 명덕~영국사간 도로 착공</li> </ul>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
6-7	농촌중심지 활성화사업 조기완공 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기 간 : 2012 ~ 2023년</li> <li>○ 위 치 : 영동군 1개 읍, 10개면</li> <li>○ 내 용 : 기초기반확충, 경관개선, 역량강화 등</li> <li>○ 사업비 : 77,485백만원 (국비70%, 군비30%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상촌, 심천, 학산면 준공</li> <li>○ 추풍령, 용산면 세부공종별 사업 추진</li> <li>○ 매곡, 용화, 양강면 시행계획 수립 중</li> <li>○ 황간, 양산면 기본계획 수립 중</li> </ul>
6-8	창조적마을만들기 사업추진(학산면 압치리, 철동리 및 심천면 고당1리) <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 영동군 학산면 압치리, 철동리 및 심천면 고당1리</li> <li>○ 사업기간 : 2017~2020년</li> <li>○ 사업규모 : 3개 마을</li> <li>○ 사업비 : 1,473백만원 (국비 1,031, 도비 6, 군비 436)</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 학산면 압치리: 공동생활홈, 마을회관 리모델링, 주민역량강화 등</li> <li>- 학산면 철동리: 자연생태복원, 가로경관조성, 주민역량강화 등</li> <li>- 심천면 고당1리 : 수생태경관조성, 가로경관조성, 주민역량강화 등</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '19.6. :심천면 고당리 시설공사 착공</li> <li>○ '19.7. :학산면 압치기 공공디자인 심의</li> <li>○ '19.9. :학산면 철동리 시설공사 착공</li> <li>○ '19.10. 학산면 압치리 기본계획 및 시행계획(안) 승인(예정)</li> <li>○ 19.12: 학산면 압치리 기본 및 시행계획 수립</li> <li>○ 19.12: 철동리 준공 및 준공검사 완료</li> <li>○ 19.12: 고당1리 준공완료</li> </ul>
6-9	황간 큰썩골 소하천 정비사업 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 영동군 황간면 용암리 88-4 번지 일원</li> <li>○ 사업기간 : 2019 ~ 2021</li> <li>○ 사업내용 : 소하천 정비 L=2.5km</li> <li>○ 사업비 : 3,000백만원 (국비 1,500, 지방비 1,500)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.01. : 2019년 소하천 정비사업 수요조사 내역서 및 관리카드 제출</li> <li>○ '18.10. : 2019년도 소하천정비 사업비 확정에 따른 사업계획서 제출</li> <li>○ '19.03. : 실시설계용역 착수</li> <li>○ '19.05. : 주민설명회 개최</li> <li>○ '19.06. : 지반조사용역 착수</li> <li>○ '19.09. : 소규모환경영향평가용역 착수</li> <li>○ '19.12. : 사전설계검토심의</li> </ul>
6-10	자연재해위험지구 정비사업 추진 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 황간면,상촌면,양강면,영동읍 일원</li> <li>○ 기간 : 2016~2022</li> <li>○ 사업규모 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 하천정비 L=3.78km, 배수펌프시설 및 증설, 우수관거 정비</li> </ul> </li> <li>○ 사업비 : 56,540백만원 (국비 28,270 도비 8,481 군비 19,789)</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>-마산지구 호안정비 L=2.78km, 교량3개소, 배수펌프시설 1식, 우수관거정비</li> <li>-계산2지구 배수펌프시설 증설, 우수관거정비 L=1.4km 등</li> <li>-둔전2지구 축제 및 호안정비 L=600m, 교량 2개소 등</li> <li>-두평지구 배수펌프시설, 소하천정비 L=600m 등</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '19.03. : 마산재해위험개선지구 정비사업 3차분 발주</li> <li>○ '19.05. : 마산재해위험개선지구 2차분 준공</li> <li>○ '19.12. : 계산2 자연재해위험지구 정비사업 1차분 착공</li> <li>○ '19.08. : 둔전2 자연재해위험지구 정비사업 소규모환경영향평가용역 착수</li> <li>○ '19.12. : 계산2 1차분 착공</li> <li>○ '19.12. : 두평 자연재해위험지구 정비사업 사전설계심의</li> </ul>

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진상황
6-11	영동천,용화천 지방하천 정비사업 조기 착공 [정상추진]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치</li> <li>-영동천 : 영동읍 부용리~양강면 산막리</li> <li>-용화천 : 용화면 용화리~월전리</li> <li>○ 기간</li> <li>-영동천 : 2017년~2022년</li> <li>-용화천 : 2019년~2023년</li> <li>○ 사업규모</li> <li>-하천정비 L=20.4km</li> <li>○ 사업비 : 74,184백만원 (국비 33,135, 도비 33,135 군비 7,914)</li> <li>○ 주요내용</li> <li>-영동천 제방보강 L=7.89km, 저수호안 L=1.66km, 교량 7개소, 보 및 낙차공 13개소 개량, 배수시설물 25개소 등</li> <li>-용화천 제방축제 L=5.3km,보축 L=1.1km, 고 수호안 3개소, 교량 12개소 및 낙차 공 9개소 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-영동천</li> <li>○ '17.06. : 실시설계 용역 착수</li> <li>○ '18.03. : 주민설명회(1차)</li> <li>○ '18.06. : 주민설명회(2차)</li> <li>○ '19.02. : 1차분 착공</li> <li>-용화천</li> <li>○ '19.03. : 실시설계 PQ심사</li> <li>○ '19.04. : 실시설계 착수</li> <li>○ '19.10. : 주민설명회</li> </ul>
6-12	지방하천(시향천) 정비사업 추진 [정상추진]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 학산면 범화리~도덕리</li> <li>○ 기간 : 2022년~2026년</li> <li>○ 사업규모 : 하천정비 L=3.0km</li> <li>○ 사업비 : 10,500백만원 (국비 5,250 도비 5,250)</li> <li>○ 주요내용 : 축제 및 호안정비 L=3.0km, 교량 5개소, 낙차공 4개소 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지방하천 정비 중기계획 반영 및 신 규사업으로 지방하천(시향천) 정비사 업 선정 지속 건의 중</li> </ul>
6-13	마을 안전용 CCTV 확대 설치 [완료]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농촌마을의 범죄예방 대책의 일 환으로 CCTV 설치</li> <li>○ 기 간 : 2019. 1. ~ 12.</li> <li>○ 대 상 : 황간면</li> <li>○ 사업비 : 258백만원(군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '19.04. : 황간면 일원 사업대상지 선정을 위한 CCTV 신규수요 설치 대수 조사</li> <li>○ '19.07. : 사업설계 및 발주</li> <li>○ '19.10. : 준공완료</li> </ul>
6-14	철길주변 햇살기둥 다담길 정비사업 [정상추진]	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 영동읍 계산리 일원 (중앙지구대 ~ 소화의원)</li> <li>○ 총사업비 : 3,145백만원 (국비 1,435, 군비 1,710)</li> <li>○ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년</li> <li>○ 사업내용 -옹벽 및 도로 등 기반시설 정비(4,959㎡), -다담길(보행로) 정비(L=575m, B=1.5m)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 10. 30. : 철도시설공단 업무협의</li> <li>○ 2018. 11. 26. : 지역개발사업 시행자 지정</li> <li>○ 2018. 12. 05. : 사업장 현지 점검 (철도공사, 철도시설공단)</li> <li>○ 2018. 12. 20. : 주민설명회, 의견수렴</li> <li>○ 2019. 01. 20. : 실시설계 완료</li> <li>○ 2019. 01. 30. : 공사 일상감사 완료</li> <li>○ 2019. 03. 07. : 공사 계약심사 완료(충북도)</li> <li>○ 2019. 03. 21. : 포장마차 보상결정 및 공사 집행</li> <li>○ 2019. 04. 11. : 공사 착공</li> <li>○ 2019. 05. 28. : 철도보호지구 행위신고 협의 완료</li> <li>○ 2019. 07. 12. : 공사정지(전선지중화 사업 연계 지장전주 이설)</li> <li>○ 2019. 12. 20. : 철도시설공단 통신맨홀 (광케이블) 이설 협의 진행</li> </ul>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
6-15	경부선 영동가도교 확장사업 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업위치 : 영동읍 계산리 56-3 (영동가도교)</li> <li>○ 총사업비 : 11,000백만원 (국비 4,000, 군비 7,000)</li> <li>○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가도교 확장 L=20m, B=20.0m</li> <li>- 접속도로 정비 L=180m, B=20.0m</li> <li>- 가도교 배수펌프시설 설치 1개소</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 10. 30. : 철도시설공단 업무협약</li> <li>○ 2018. 11. 26. : 지역개발사업 시행자 지정</li> <li>○ 2018. 12. 05. : 사업장 현지 점검 (철도공사, 철도시설공단)</li> <li>○ 2018. 12. 11. : 편입물건 보상협의(1차)</li> <li>○ 2019. 3. 14. : 실시설계 반영 사항 협의(한국철도시설공단)</li> <li>○ 2019. 5. 1. : 영동군 도시재생활성화 및 지원에 관한 조례제정</li> <li>○ 2019. 5. 16. : 주민설명회 개최</li> <li>○ 2019. 10. : 실시설계 완료</li> <li>○ 2019. 12. : 한국철도시설공단 업무협약 및 공사발주</li> </ul>
6-16	도시재생(뉴딜)사업 적극 추진 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공모신청 : 영동읍 1개소, 황간면 1개소</li> <li>○ 사업비 : 234억원 (국비 60%, 지방비 40%)</li> <li>○ 주요사업 : 노후주택 및 상가 정비 사업, 공동이용 및 생활편의시설 등 공급, 일자리창출, 지역문화 활성화, 골목경제 활성화, 지역공동체 활성화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018.05.15. : 업무협약식 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (사)충북남부마을만들기지원센터</li> </ul> </li> <li>○ 마을공동체 활성화 사업(황간면) : 2018. 11. ~ 2018. 12.</li> <li>○ 도시재생전략계획 수립 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4. 25. : 도시재생전략계획 승인</li> <li>- 5. 15. : 도시재생전략계획 고지</li> </ul> </li> <li>○ 도시재생활성화계획 수립 중 <ul style="list-style-type: none"> <li>- '19. 3 ~ '20. 1(황간역 일원)</li> <li>- '19. 7(하반기 공모 탈락)</li> </ul> </li> <li>○ 도시재생대학 운영(3기) <ul style="list-style-type: none"> <li>- '19. 10 ~ '19. 12</li> </ul> </li> <li>○ 2020년 공모신청 : 영동읍, 황간면</li> </ul>
6-17	새들마을 조기 완공 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2016년 ~ 2020년</li> <li>○ 위치 : 영동읍 부용리 일원</li> <li>○ 사업비 : 2,416백만원 (지특 70%, 도비 9%, 군비 21%)</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기초생활 인프라사업 : 방재/위생, 생활환경, 주민공동</li> <li>- 집수리 사업, 휴먼케어사업, 주민역량사업</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 거점공간 완공 : 2019. 11월</li> <li>○ 공동작업장 완공 : 2019. 11월</li> <li>○ 주민역량강화 교육 : 수시 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 분야 : 미술, 다도, 바리스타</li> </ul> </li> <li>○ 집수리 및 담장정비 : 진행 중</li> </ul>
6-18	영동산업단지 주변마을 지방상수도공급 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2021년</li> <li>○ 위치 : 웅산면 금곡리 외</li> <li>○ 내용 : 수원고갈, 수질불량 등으로 식수공급에 어려움이 있는 지역에 지방상수도 공급</li> <li>○ 사업비 : 11,780백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.10. : 기본 및 실시설계용역 집행</li> <li>○ '18.12. : 기본 및 실시설계용역 착수</li> <li>○ '19.03. : 주민설명회개최(면사무소)</li> <li>○ '19.12. : 관련부서 협의중</li> </ul>
6-19	심천면 구탄, 장동리 지방상수도 공급 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2019 ~ 2021년</li> <li>○ 위치 : 심천면 장동리, 구탄리</li> <li>○ 내용 : 수원고갈, 수질불량 등으로 식수공급에 어려움이 있는 지역에 지방상수도 공급</li> <li>○ 사업비 : 1,412백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '19.01. : 기본 및 실시설계용역 집행</li> <li>○ '19.03. : 기본 및 실시설계용역 완료</li> <li>○ '19.09. : 공사 집행</li> <li>○ '19.10. : 공사 착공(전체분 및 1차분)</li> </ul>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
6-20	황산리 일원 지방상수도 공급 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2020 ~ 2022년</li> <li>○ 위치 : 학산면 황산리(죽촌,모정등)</li> <li>○ 내용 : 수원고갈, 수질불량 등으로 식수공급에 어려움이 있는 지역에 지방상수도 공급</li> <li>○ 사업비 : 2,561백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예산확보 완료</li> </ul>
7-1	그라운드 골프장, 정구장등 스포츠시설 현대화 추진 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2019. ~ 2022년</li> <li>○ 위치 : 영동읍 계산리 853외 27필지</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>-그라운드골프장 막구조 돔 설치,</li> <li>-정구장 코트관리용 스프링클러 설치</li> </ul> </li> <li>○ 사업비 : 2,200백만원 (국비660, 도비770, 군비770)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 18.10 사업비 확보 가내시 통보</li> <li>○ 19.02 공유재산 및 지방재정 투자심의 완료</li> <li>○ 19.03 제1회 추경예산편성(그라운드골프)</li> <li>○ 19.05 실시설계용역 착수(그라운드골프)</li> <li>○ 19.06 착공 (군민정구장)</li> <li>○ 19.09 준공 (군민정구장)</li> <li>○ 19.09 실시설계용역 준공(그라운드골프)</li> <li>○ 19.09 공공디자인심의(그라운드골프)</li> <li>○ 19.10 실시계획인가변경(그라운드골프)</li> <li>○ 19.12 공사계약 추진(그라운드골프)</li> </ul>
7-2	영동체육공원 조성사업 조기착공 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2015. ~ 2022년</li> <li>○ 위치 : 영동읍 매천리 125-2번지 일원</li> <li>○ 내용 : 실내배드민턴장,축구장, 풋살장, 다목적구장등 설치</li> <li>○ 사업비 : 19,800백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 18.5 편입토지 및 지장물 보상</li> <li>○ 18.10 체육진흥시설 지원 사업비 확보</li> <li>○ 19.07 기본 및 실시설계 착수</li> <li>○ 19.07 감정 재평가(2차)</li> <li>○ 19.09 기본 및 실시설계 착수보고회 개최</li> <li>○ 19.12 기본설계 계획(안) 주민설명회 개최</li> <li>○ 19.12 편입토지 및 지장물 보상(80%)</li> </ul>
7-3	각종생활체육시설 태양광 설치 및 경관 조성 추진 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2019. ~ 2021년</li> <li>○ 위치 : 영동체육공원, 군민탁구장, 국궁장(영무정).</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 태양광발전 설비 100kW</li> <li>- 경관조명 및 체육시설 간판 설치 각 1식</li> </ul> </li> <li>○ 사업비 : 500백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 18.10 체육진흥시설 지원 사업비 확보</li> <li>○ 19.01 군민탁구장 태양광설치사업 완료</li> <li>○ 19.05 국궁장 태양광 발전 설치 완료</li> <li>○ 19.06 군민탁구장 경관간판 설치 완료</li> <li>○ 19.07 영동체육공원 기본 및 실시설계 착수 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본 및 실시설계(2020. 7.완료 예정)</li> </ul> </li> </ul>
8-1	자원봉사센터 빨래방차증차운영 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2018. ~ 2022.</li> <li>○ 사업규모 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이동빨래차 2대 / 연 250회 운행</li> </ul> </li> <li>○ 사업비 : 427백만원(군비 427)</li> <li>○ 대형 빨래를 힘들어하는 노인을 대상으로 11개 읍·면을 순회하며 실시하는 이동빨래 서비스</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018년 이동빨래차 운영 130회 목표 달성</li> <li>○ 기존 이동빨래차 세탁기 노후화로 교체(4대)</li> <li>○ 2019년 이동빨래차 운영 140회 목표달성</li> </ul>
8-2	대중목욕탕, 사우나 등 군민편익시설 확충 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 추풍령면 추풍령리 414-10</li> <li>○ 사업기간 : 2019. ~ 2020.</li> <li>○ 사업규모 : 1개소(개소당 104㎡)</li> <li>○ 사업비 : 300백만원(군비100%)</li> <li>○ 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1개소 추진 : 목욕탕, 찜질방 파우더룸 등 (추풍령면)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년 본예산 200백만원 확보</li> <li>○ 건축허가 사전협의 : 2019. 02. 14.</li> <li>○ 기본 및 실시설계 발주 : 2019. 02. 21.</li> <li>○ 분할착량 : 2019. 03. 22.</li> <li>○ 2019년 2회추경 100백만원 추가 확보</li> <li>○ 공사착공 : 2019.11.18.</li> </ul>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
8-3	어르신 보청기 지원 사업 <b>[이행후 계속추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업기간 : 2019. ~ 2022.</li> <li>○ 사업대상 : 만70세이상 기초연금 수급자</li> <li>○ 사업비 : 520백만원(군비100%)</li> <li>○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 선정기준 : 순음청력검사 청력역치가 한쪽 귀 40dB 이상 60dB미만, 다른 귀 40dB 이상 80dB 미만</li> <li>- 급여수준 : 1인1측 지원, 실구입비 중 최대 1,179천원까지 지원</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년 본예산 130백만원 확보</li> <li>○ 사회보장제도 신설에 따른 보건복지부 협의완료 : 2019. 5. 14.</li> <li>○ 조례제정 : 2019. 12. 30.</li> <li>○ 2019년 보청기지원 : 106명/125백만원</li> </ul>
8-4	장애인전용 건강지원센터 건립 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2019 ~ 2021년</li> <li>○ 내용 : 장애인전용 건강지원 센터 신축</li> <li>○ 사업비 ; 2,500백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부지조성 작업중</li> </ul>
8-5	장애인전용차량증차로 중증장애인지원사업 확대추진 <b>[이행후 계속추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2019 ~ 2022년</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 리프트차량 1대</li> <li>- 운영에 따른 인건비 및 운영비</li> </ul> </li> <li>○ 사업비 ; 200백만원(군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 차량구입 : 차량구입 완료 69,723천원</li> </ul>
8-6	장애인 등록 검사비지원 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2019 ~ 2022년</li> <li>○ 내용 : 장애인등록 검사비 지원</li> <li>○ 사업비 ; 160백만원(군비)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조례재정 (19.12월)</li> </ul>
8-7	여성안심환경조성사업 <b>[이행후 계속추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018. ~ 2022.</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 여성안심보안관 운영</li> <li>- 몰래카메라 탐지장비 구입 및 안심스크린 설치</li> <li>- 무료 여성위생용품 자판기 설치</li> </ul> </li> <li>○ 사업비 : 157백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.11. : 몰래카메라 탐지장비 구입(13세트)</li> <li>○ '18.12. : 화장실 안심스크린 설치(10개소 183면)</li> <li>○ '19.03. : 여성안심보안관 2명 채용</li> <li>○ '19.04. : 여성안심보안관 운영(~11월)</li> <li>○ '19.06. ~ : 무료 여성위생용품 자판기 설치 및 운영</li> <li>○ '19.12. : 화장실 안심스크린 설치(10개소 170면)</li> </ul>
8-8	한부모가족 지원강화 <b>[이행후 계속추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2019. ~ 2022.</li> <li>○ 대상 : 한부모가족 지원법에 따른 지원대상</li> <li>○ 내용 : 안과검진비 및 안경구입비 (1인,연1회100천원이내) 사고, 질병등 검사비 및 의료비지원 (1인,연1회100~300천원이내)</li> <li>○ 사업비 : 80백만원(지방비80)</li> <li>○ 사업비 : 80백만원(군비80)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.12. : 세부사업계획 검토</li> <li>○ '19.02. : 의료비지원계획 수립</li> <li>○ '19.03. ~ : 대상자 신청접수 및 지원(30명, 4.5백만원)</li> </ul>
8-9	산단형 행복주택 200호 조기공급 <b>[정상추진]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 용산면 구촌리 170-1 일원</li> <li>○ 사업기간 : 2017.12.~2020.12.</li> <li>○ 사업규모 : 200호</li> <li>○ 사업비 : 21,560백만원</li> <li>○ 시행자 : LH공사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 토지보상 협의 완료('18.10.)</li> <li>○ 2018.12. 공사 발주</li> <li>○ 2019.05. 시공사 선정</li> <li>○ 2019.07. 공사 착공</li> </ul>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
8-10	청년, 노인, 여성 취업지원센터 설치 <b>(이행후 계속추진)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2019 ~</li> <li>○ 내용 : 영동군 일자리센터, 대한노인회, 여성새로일하기센터의 독립성을 유지하는 대신 유관기관 간 주기적 정보 공유 및 적극적 협업</li> <li>○ 사업비 : 1,522백만원 (국 1,214, 군 338)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18. 03. : 유관기관 직업소개 지도점검 및 실적공유</li> <li>○ '18. 09 : 취업박람회 개최 및 각 기관 행사참여</li> <li>○ '19. 03 : 정기 구인구직실적 공유</li> <li>○ '19. 04 : 상반기 여성새로일하기센터 운영위원회 참석</li> <li>○ '19. 04 : 제1차 자활고용분과 회의 참석</li> <li>○ '19. 11 : 취업박람회 개최</li> <li>○ '19. 12 : 하반기 여성새로일하기센터 운영위원회 참석</li> </ul>
8-11	오지마을 100원 무지개택시 주6일 확대운영 <b>(이행후 계속추진)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2022년</li> <li>○ 대상 : 26개 마을(농어촌버스 미운행 마을)</li> <li>○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주6일(1일 3회)</li> <li>- 해당마을에서 관할 읍면소재지 또는 최단거리 읍면 소재지 재래시장 까지 운행</li> </ul> </li> <li>○ 사업비 : 981백만원 (국비 250 / 도비 285 / 군비 446)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18.11. : 조례 개정</li> <li>○ '19.02. : 확대 운영</li> </ul>
8-12	영동병원 내 안과 신설 <b>(완료)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치 : 의료법인 조운의료재단 영동병원</li> <li>○ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년</li> <li>○ 사업규모 : 안과 1개과</li> <li>○ 사 업 비 : 2,648백만원 (병원자체재원)</li> <li>○ 주요내용 : 영동병원 내 안과 신설</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 12월 : 시설 및 장비 확충 완료</li> <li>○ 2018. 12월 : 안과전문의 채용</li> <li>○ 2019. 2월 : 안과 운영</li> </ul>
8-13	치매안심센터 확대 운영으로 건강한 노후보장 <b>(이행후 계속추진)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2022년</li> <li>○ 내용 : 치매안심센터 설치 치매안심센터 운영</li> <li>○ 사업비 : 3,384백만원 (국비 2431, 도비 120, 군비 833)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '18. 06. : 센터 공사 착공</li> <li>○ '18. 11. : 센터 공사 완료</li> <li>○ '18. 12. : 인테리어 공사</li> <li>○ '19. 03. : 센터 개소식 및 지속운영</li> </ul>
9-1	지속적 규제개혁 · 발전저해요소 혁파 <b>(이행후 계속추진)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2022년</li> <li>○ 내용 : 불합리한 법령규제 정비 및 규제혁신 기반 추진역량 강화</li> <li>○ 사업비 : 비예산</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '19. 2. : 규제혁신 추진계획 수립</li> <li>○ '19. 2 28. : 규제개선 과제 보고회 개최</li> <li>○ '19. 5. 7. : 공직자 규제개혁 교육(92명 참석)</li> <li>○ '19. 6. 10. : 2019년 제1차 규제개혁 위원회 개최</li> <li>○ '19. 7. 23. : 충북 규제개혁 우수 사례 경진대회 참가(장려상)</li> <li>○ '19. 8. 20. : 영동군 적극행정 실행계획 수립</li> <li>○ 「찾아가는 규제신고센터」 : 총2회 (5개 기업체 방문)</li> <li>○ 규제개혁 및 적극행정 우수공무원 포상 : 총13명 / 180만원</li> <li>○ 규제개혁 및 적극행정 교육 : 2회 추가 실시 (122명)</li> <li>○ 2019 기업환경 우수지역 평가 결과 : 기업체감도 도내 3위 A등급(전국 30위) 경제활동친화성 도내 3위 S등급(전국 31위)</li> </ul>

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
9-2	<b>민·관 합동, 공직감찰 운영</b> <b>(이행후 계속추진)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 군민감사관 회의 개최</li> <li>○ 군민감사관과의 현장대화</li> <li>○ 건설사업장 합동점검</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 군민감사관 신규 의촉 : 2018.4.10. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총 30명(신규 12명, 기존 18명)</li> </ul> </li> <li>○ 군민감사관 회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018년 하반기 : 12. 4 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 참석 22명</li> <li>· 건의 10건 → 추진 8건, 미추진 2건</li> </ul> </li> <li>- 2019년 상반기(1) : 3. 21 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 참석 24명, 건의 13건 접수</li> </ul> </li> <li>- 2019년 상반기(2) : 6. 24 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 참석 21명, 건의 9건 접수</li> </ul> </li> <li>- 2019년 하반기(1) : 9. 24 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 참석 22명, 건의 8건 접수</li> </ul> </li> <li>- 2019년 하반기(2) : 12. 9 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 참석 18명, 국회 견학 대체</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 군민감사관 현장대화 : 19.2.13 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 하천 내 수목제거사업 후 잔가지 방치 → 파쇄처리 및 제거 완료</li> </ul> </li> <li>○ 상반기 건설사업장 점검 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상반기 : 6. 17 ~ 6. 21 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 점검 17개소 / 지적 13건</li> </ul> </li> <li>- 하반기 : 11. 13 ~ 11. 27 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 점검 25개소 / 지적 13건</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
9-3	<b>공무원 성과중심 발탁 인사시스템 운영</b> <b>(이행후 계속추진)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조직을 일과 성과 중심으로 전환하여 열심히 일하는 조직분위기 조성</li> <li>○ 남들이 하기 싫어하는 업무, 어려운 업무 등을 열심히 일하는 직원에 대한 인센티브 부여</li> <li>○ 근무성적, 근무태도 불량자, 품위 유지 위반자에 대한 패널티 강화</li> <li>○ 공정한 결정을 위한 심사위원회 구성 운영</li> <li>○ 활기찬 조직문화 조성을 위한 경쟁력 강화</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019년 인사운영계획 수립 (2018.12.26.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실적가점 및 페널티 기준 수립</li> </ul> </li> </ul>
9-4	<b>군민과의 소통 강화 확대</b> <b>(이행후 계속추진)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대상별 간담회를 통한 군정참여 및 공감대 형성</li> <li>○ 군정에 대한 지속적인 관심 제고 및 발전 방향 의견 수렴</li> <li>○ 상생 발전 방향 제시 및 애로사항 청취 및 검토결과 통보로 상호 소통</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018년 간담회 개최 횟수 : 8회</li> <li>○ 2019년 간담회 개최 횟수 : 10회 (2019. 12월 현재)</li> </ul>
9-5	<b>원스톱 행정처리 확대 시행</b> <b>(정상추진)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기간 : 2018 ~ 2022년</li> <li>○ 내용 : 인허가 민원 처리시 민원인이 여러 부서를 일일이 방문하여 접수해야 하는 불편을 해소하기 위해 사전심사청구제 및 원스톱서비스 시행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원스톱 행정처리 확대시행 업무 발굴 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건물표시변경 등기촉탁 원스톱 서비스</li> <li>- 지적공부정리 원스톱서비스</li> </ul> </li> <li>○ 안심상속 원스톱서비스 재산조회 항목 2종 추가 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 건설근로자 퇴직공제금 가입여부</li> <li>- 건축물 소유여부</li> </ul> </li> <li>○ 민원안내 도우미제 운영</li> <li>○ 행복출산 원스톱서비스를 통해 아동수당신청 서비스 확대</li> </ul>
