



민선7기 공약사업 추진실적 점검결과
[2021년 12월말 기준]



민선 7기 공약사업 추진실적 점검결과

◇ 2021년 12월말 기준 민선7기 군수 공약 추진실적 점검결과임

I 추진현황

〈 민선7기 공약사업 추진현황('21. 12월말 기준) 〉



분야별 현황

분야별	핵심과제	공약 이행 상황				비고		
		완료 ¹⁾ (이행 후 계속추진)	정상 추진	일부 추진	미착수			
5대분야	73	9개 핵심과제	73	52(25)	21	0	0	
육아, 청소년	10	1. 안전하고 바르게 성장하는 영유아	6	3(1)	3			
		2. 건강한 청소년 교육환경 조성	4	4(3)				
농업, 산업 경제	14	3. 군민이 체감하는 일등 농업군 육성	10	10(4)				
		4. 모두가 잘사는 민생경제 활성화	4	1	3			
문화, 체육, 관광지역 개발	31	5. 명실상부한 문화관광도시 완성	8	5(2)	3			
		6. 안전하고 균형있는 지역발전	20	11(1)	9			
		7. 편리한 생활체육환경 조성	3	1	2			
사회복지	13	8. 다함께 행복한 복지실현	13	12(9)	1			
군정혁신	5	9. 깨끗하고 공정한 공직문화 조성	5	5(5)				

1) 완료기준 : (완료) 공약이행이 완료되어 종료된 사업, (이행 후 계속추진) 공약내용 이행완료 후 추가목표를 세워 추진 중인 사업, 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복하는 사업(현재까지의 실적으로 공약을 이행했다고 판단할 수 있는 사업)

부서별 현황

추진부서	공 약 사업수	공 약 이 행 상 황				비고
		완 료 (이행후 계속추진)	정상추진	일부추진	미착수	
계	73	52(25)	21	0	0	
기 획 감 사 관	2	2(2)				
행 정 과	4	4(3)				
국악문화체육 과	6	4(2)	2			
주 민 복 지 과	5	4(3)	1			
가 족 행 복 과	9	7(6)	2			
민 원 과	1	1(1)				
경 제 과	6	3(1)	3			
농 정 과	7	7(3)				
산 립 과	1		1			
건 설 교 통 과	7	6(2)	1			
안 전 관 리 과	6	2	4			
도 시 건 축 과	3	2	1			
농촌신활력과	4	2	2			
농업기술센터	3	3(1)				
보 건 소	2	2(1)				
상수도사업소	3	2	1			
시 설 사 업 소	3	1	2			
힐링사업소	1		1			

완료 및 이행 공약사업(52건)

분야별	공 약 명
육아.청소년(7)	◇ 출산 보육담당부서 신설 (완료)
	◇ 영유아 돌봄서비스 추진 (이행후 계속추진)
	◇ 어린이집, 아동센터 공기청정기 설치 추진 (완료)
	◇ 초·중고 입학 축하금 지원 (이행후 계속추진)
	◇ 저소득 청소년 건강증진비 지원 (이행후 계속추진)
	◇ 청소년 해외 연수 및 영어캠프 확대 시행 (이행후 계속추진)
	◇ 각급 학교 CCTV설치 및 통합관제센터 연계 (완료)
농업.산업경제(11)	◇ 농업인 안전재해보험 확대 지원 (이행후 계속추진)
	◇ 친환경 농산물 생산 지원 확대 (완료)
	◇ 농촌 일손해결 시스템 구축 (완료)
	◇ 과일통일포장재 확대 지원 (이행후 계속추진)
	◇ 농산물 산지유통센터 시설보완 (완료)
	◇ 과수원예농가 수분용 별 지원 (이행후 계속추진)
	◇ 어서실 악취 저감 시설 설치 (완료)
	◇ 농가소득 증대를 위한 아미노산 액비 공급 확대 (이행후 계속추진)
	◇ 농업기계 임대 및 순회수리 확대운영 (완료)
	◇ 쿡탈곡기, 잔가지 파쇄기 임대 확대 (완료)
	◇ 전통시장, 안전시설 강화 및 맞춤형 지원으로 지역상권 활성화 (완료)
문화.체육.관광지역개발(17)	◇ 국악과 과일을 활용한 축제관광 산업화 (이행후 계속추진)
	◇ 도마령 일원 관광자원 개발 (이행후 계속추진)
	◇ 송호 관광지 보행교 설치 조기 보완 추진 (완료)
	◇ 4번국도 영동군 홍보관문 조기 착공 (완료)
	◇ 각 면소재지 경관조명 설치 (완료)
	◇ 가로 보안등 조도 개선 (완료)
	◇ 교통난 해소를 위한 공영 주차장 증설 (완료)
	◇ 국도 19호선 확포장 공사 조기 착공 (이행후 계속추진)
	◇ 교통난 해소를 위한 회전교차로 설치 확대 (완료)

분야별	공 약 명
	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 농어촌도로 확포장공사 추진 [완료] ◇ 창조적마을 만들기사업 추진 [완료] ◇ 마을 안전용 CCTV 설치 확대 설치 [완료] ◇ 철길주변 햇살가득 다담길 정비사업 조기완공 [완료] ◇ 새뜰마을 조기완공 [완료] ◇ 심천면 구탄, 장동리 지방상수도 공급 [완료] ◇ 황산리 일원 지방상수도 공급 [완료] ◇ 그라운드 골프장, 정구장 등 스포츠시설 현대화 추진 [완료]
사회복지(12)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 자원봉사센터 빨래방차 증차 운영 [이행후 계속추진] ◇ 대중목욕탕, 사우나 등 군민 편익시설 확충 [완료] ◇ 어르신 보청기 지원 [이행후 계속추진] ◇ 장애인전용차량 증차로 중증장애인지원사업 확대 추진 [이행후 계속추진] ◇ 장애인 등록 검사비 지원 [이행후 계속추진] ◇ 여성 안심 환경 조성사업 [이행후 계속추진] ◇ 한부모 가족 지원 강화 [이행후 계속추진] ◇ 산단형 행복주택 200호 조기공급 [완료] ◇ 청년, 노인, 여성 취업지원센터 설치 [이행후 계속추진] ◇ 오지마을 100원 무지개 택시 주 6일 확대 [이행후 계속추진] ◇ 영동병원 내 안과 신설 [완료] ◇ 치매안심센터 확대 운영으로 건강한 노후 [이행후 계속추진]
군정혁신(5)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 지속적 규제개혁, 발전 저해요소 혁파 [이행후 계속추진] ◇ 민.관 합동, 공직감찰 운영 [이행후 계속추진] ◇ 공무원 성과중심 발탁 인사시스템 운영 [이행후 계속추진] ◇ 군민과의 소통 강화 확대 [이행후 계속추진] ◇ 원스톱 행정처리 확대 시행 [이행후 계속추진]

II 예산확보 현황 (2021년 12월말 기준)

투자계획

연도별

(단위:백만원)

분야별	합 계	연 도 별						
		기투자	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
합 계	617,047	137,388	68,650	85,347	122,596	81,448	78,395	43,223
육아.청소년	9,847	190	297	1,068	1,852	3,401	3,039	-
농업.산업경제	62,747	400	7,349	9,941	15,358	9,899	8,800	11,000
문화.체육. 관광지역개발	511,460	135,713	57,274	65,820	91,765	63,403	65,262	32,223
사회복지	32,993	1,085	3,730	8,518	13,621	4,745	1,294	-
군정혁신	0	-	-	-	-	-	-	-

재원별



(단위:백만원)

분야별	합 계	재 원 별			
		국비	도비	군비	기타
합 계 (구성비)	617,047 (100%)	233,029 (39%)	94,646 (16%)	256,997 (40%)	32,375 (5%)
육아.청소년	9,847	1,641	372	7,827	7
농업.산업경제	62,747	14,629	4,511	24,271	19,336
문화.체육. 관광지역개발	511,460	206,404	89,358	215,589	109
사회복지	32,993	10,355	405	9,310	12,923
군정혁신	0	-	-	-	-

예산확보 현황

(단위 : 백만원)

< 분야별(재원별) 예산 확보 현황('21년 12월말 기준) >

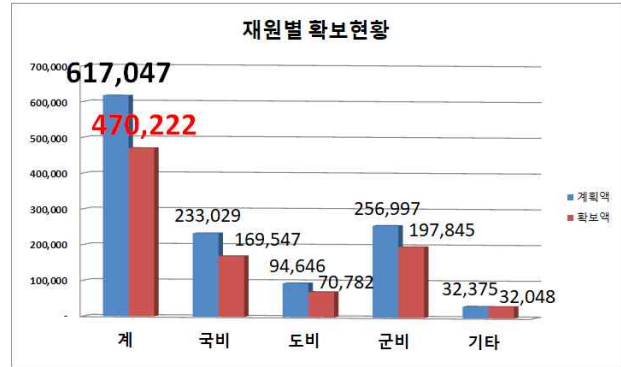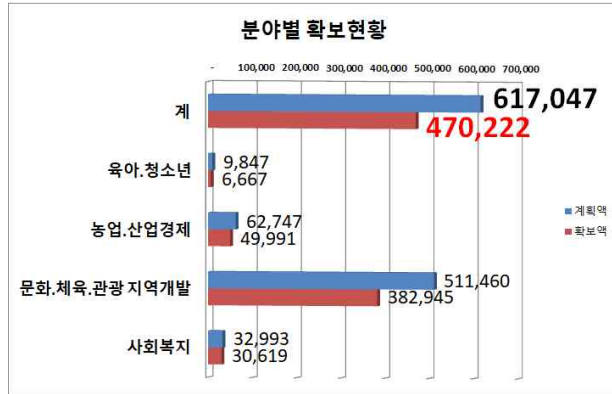

분야별	계획액	확보액					계획대비 확보(%)
		계	국비	도비	군비	기타	
합 계 (구성비)	617,047	470,222 (100%)	169,547 (37%)	70,782 (15%)	197,845 (42%)	32,048 (6%)	76%
육아.청소년	9,847	6,667	1,151	372	5,137	7	65%
농업.산업경제	62,747	49,991	6,203	2,270	22,400	19,118	80%
문화.체육.관광 지역개발	511,460	382,945	151,748	67,497	163,700	-	75%
사회복지	32,993	30,619	10,445	643	6,608	12,923	93%
군정혁신	-	-	-	-	-	-	-

세부사업별 확보액

(단위 : 백만원)

공 약 명	투자계획 (A)	확보예산 (B)	확보율(%) (B/A)	주관부서
합 계	617,047	470,222	76%	
1-1 출산.보육담당부서 신설	-	-	비예산	행 정 과
1-2 영유아 돌봄서비스 추진	269	269	100%	가 족 행 복 과
1-3 육아종합지원센터 건립	3,500	3,500	100%	가 족 행 복 과
1-4 청소년종합문화센터 건립	700	-	0%	가 족 행 복 과
1-5 어린이집, 아동센터 공기청정기 설치 추진	42	42	100%	가 족 행 복 과
1-6 어린이 안심공원 조성	2,360	60	3%	산 림 과
2-1 초.중.고 입학 축하금 지원	1,223	1,178	96%	가 족 행 복 과
2-2 저소득 청소년 건강증진비 지원	432	297	69%	가 족 행 복 과
2-3 청소년 해외 연수 및 영어캠프 확대 시행	1,006	1,006	100%	가 족 행 복 과
2-4 각급 학교 CCTV설치 및 통합관제센터 연계	315	315	100%	안 전 관 리 과
3-1 농업인 안전재해보험 확대 지원	4,844	3,932	81%	농 정 과
3-2 친환경 농산물 생산 지원 확대	2,923	2,334	80%	농 정 과
3-3 농촌 일손해결 시스템 구축	904	942	104%	농 정 과
3-4 과일통일포장재 확대 지원	24,500	24,236	99%	농 정 과
3-5 농산물 산지유통센터 시설보완	8,000	8,000	100%	농 정 과
3-6 과수원예농가 수분용 벌 지원	270	330	122%	농 정 과
3-7 어서실 악취 저감 시설 설치	896	750	84%	농 정 과
3-8 농가소득 증대를 위한 아미노산 액비 공급 확대	600	581	97%	농 업 기 술 센 터

공 약 명	투자계획 (A)	확보예산 (B)	확보율(%) (B/A)	주관부서
3-9 농기계 임대 및 순회 수리 확대 운영	2,503	2,537	101%	농업기술센터
3-10 콩탈곡기, 잔가지 파쇄기 임대 확대	280	304	109%	농업기술센터
4-1 전통시장, 안전시설 강화 및 맞춤형 지원으로 지역상권 활성화	718	718	100%	경 제 과
4-2 영동산업단지 조기 분양 완료	-	-	비예산	경 제 과
4-3 기업유치 가속화로 일자리 창출을 통한 서민생활 안정	-	-	비예산	경 제 과
4-4 일라이트 활용 고부가가치산업 육성	16,309	5,327	33%	경 제 과
5-1 영동문화원 신축 이전	14,156	1,083	8%	국악문화체육과
5-2 국악과 과일을 활용한 축제.관광 산업화	1,125	1,352	120%	국악문화체육과
5-3 도마령 일원 관광자원 개발(용화,상촌)	100	1,556	1,556%	국악문화체육과
5-4 송호 관광지 보행교 설치 조기 보완 추진	7,300	7,300	100%	국악문화체육과
5-5 4번국도 영동군 홍보관문 조기 착공	1,800	2,250	125%	국악문화체육과
5-6 국립 난계국악원 유치	-	-	비예산	국악문화체육과
5-7 각 면소재지 경관조명 설치	400	530	133%	도 시 건 축 과
5-8 레인보우힐링타운 2021년 완공	140,100	140,100	100%	힐 링 사 업 소
6-1 가로.보안등 조도 개선	1,460	1,556	107%	건 설 교 통 과
6-2 교통난 해소를 위한 공영주차장 증설	7,906	7,906	100%	건 설 교 통 과
6-3 국도 19호선 확포장 공사 조기 착공	-	-	비예산	건 설 교 통 과
6-4 교통난 해소를 위한 회전교차로 설치 확대	2,800	1,060	38%	건 설 교 통 과
6-5 군도 확포장공사 추진	5,250	1,700	32%	건 설 교 통 과

공 약 명	투자계획 (A)	확보예산 (B)	확보율(%) (B/A)	주관부서
6-6 농어촌도로 확포장공사 추진	5,465	6,550	120%	건 설 교 통 과
6-7 농촌중심지 활성화 사업 조기 완공	77,485	73,804	95%	농 촌 신 활 력 과
6-8 창조적마을 만들기사업 추진 (황산면 압치리, 철동리 및 심천면 고당1리)	1,473	1,473	100%	농 촌 신 활 력 과
6-9 황간 큰쭉골 소하천 정비사업 조기 착공	3,227	3,227	100%	안 전 관 리 과
6-10 자연재해위험지구 정비사업 추진	64,152	52,293	82%	안 전 관 리 과
6-11 영동천, 용화천 지방하천 정비사업 조기 착공	74,184	23,500	32%	안 전 관 리 과
6-12 시항천 정비사업 추진	10,500	-	0%	안 전 관 리 과
6-13 마을 안전용 CCTV 설치 확대 설치	258	258	100%	안 전 관 리 과
6-14 철길주변 햇살가득 다담길 정비사업 조기 완공	3,145	3,145	100%	도 시 건 축 과
6-15 경부선 영동가도교 확장공사 조기 착공	11,000	8,600	78%	도 시 건 축 과
6-16 도시재생(뉴딜)사업 적극 추진	23,156	7,126	31%	농 촌 신 활 력 과
6-17 새뜰마을 조기완공	2,416	2,416	100%	농 촌 신 활 력 과
6-18 영동산업단지 주변마을 지방상수도 공급	11,780	9,138	78%	상 수도 사 업 소
6-19 심천면 구탄, 장동리 지방상수도 공급	1,412	1,412	100%	상 수도 사 업 소
6-20 황산리 일원 지방상수도 공급	1,500	1,500	100%	상 수도 사 업 소
7-1 그라운드 골프장, 정구장 등 스포츠시설 현대화 추진	2,200	2,200	100%	시 설 사 업 소
7-2 영동체육공원 조성사업 조기 착공	35,600	19,800	56%	시 설 사 업 소
7-3 각종 생활체육시설 태양광 설치 및 경관 조성 추진	110	110	100%	시 설 사 업 소

공 약 명	투자계획 (A)	확보예산 (B)	확보율(%) (B/A)	주관부서
8-1 자원봉사센터 빨래방차 증차 운영	427	379	89%	행 정 과
8-2 대중목욕탕, 사우나 등 군민 편의시설 확충	300	300	100%	주 민 복 지 과
8-3 어르신 보청기 지원	520	385	74%	주 민 복 지 과
8-4 장애인전용 건강지원센터 건립	3,480	290	8%	주 민 복 지 과
8-5 장애인전용차량 증차로 중증장애인지원사업 확대 추진	200	158	79%	주 민 복 지 과
8-6 장애인 등록 검사비 지원	30	20	67%	주 민 복 지 과
8-7 여성 안심 환경 조성사업	157	121	77%	가 족 행 복 과
8-8 한부모 가족 지원 강화	20	17	85%	가 족 행 복 과
8-9 산단형 행복주택 200호 조기공급	21,560	21,560	100%	경 제 과
8-10 청년, 노인, 여성 취업지원센터 설치	1,934	2,174	112%	경 제 과
8-11 오지마을 100원 무지개 택시 주 6일 확대 운행	981	1,512	154%	건 설 교 통 과
8-12 영동병원 내 안과 신설	-	-	비예산	보 건 소
8-13 치매안심센터 확대 운영으로 건강한 노후 보장	3,384	3,703	109%	보 건 소
9-1 지속적 규제개혁, 발전 저해요소 혁파	-	-	비예산	기 획 감 사 관
9-2 민.관 합동, 공직감찰 운영	-	-	비예산	기 획 감 사 관
9-3 공무원 성과중심 발탁 인사시스템 운영	-	-	비예산	행 정 과
9-4 군민과의 소통 강화 확대	-	-	비예산	행 정 과
9-5 원스톱 행정처리 확대 시행	-	-	비예산	민 원 과

사업별 자체점검 결과 < 2021년 12월말 기준 >

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황				
1-1	출산보육담당부서 신설 [완료]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부서 내 사무분장을 재조정하여 출산·양육 맞춤형 서비스 지원 <table border="1" data-bbox="512 465 951 680"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 465 756 495">기 존</th> <th data-bbox="761 465 951 495">신 설(안)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 501 756 680"> <ul style="list-style-type: none"> <생활지원과> - 여성정책팀, 아동청소년팀 ,평생학습팀, 식품안전팀 </td> <td data-bbox="761 501 951 680"> <ul style="list-style-type: none"> <가족행복과> - 여성정책팀, 청소년드림팀 평생학습팀, 영유아보육팀 식품안전팀 </td> </tr> </tbody> </table>	기 존	신 설(안)	<ul style="list-style-type: none"> <생활지원과> - 여성정책팀, 아동청소년팀 ,평생학습팀, 식품안전팀 	<ul style="list-style-type: none"> <가족행복과> - 여성정책팀, 청소년드림팀 평생학습팀, 영유아보육팀 식품안전팀 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조례 및 규정 개정 <ul style="list-style-type: none"> - 영동군 행정기구설치 조례 개정 : 2018. 11. 19. - 영동군 지방공무원 정원관리 등에 관한 규정 개정 : 2018. 11. 30. ○ 조직개편 시행 및 인사발령통지 : 2019. 1. 1.
기 존	신 설(안)						
<ul style="list-style-type: none"> <생활지원과> - 여성정책팀, 아동청소년팀 ,평생학습팀, 식품안전팀 	<ul style="list-style-type: none"> <가족행복과> - 여성정책팀, 청소년드림팀 평생학습팀, 영유아보육팀 식품안전팀 						
1-2	영유아 돌봄서비스 추진 [이행후 계속추진]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2018. ~ 2022. ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 시간연장형어린이집운영 : 아침7:30~21:30분까지 시간연장하여 영유아돌봄(2개소) - 시간제보육운영 : 어린이집 미이용 아동(6~36개월미만) 최대4시간까지 일시보육(1개소) - 아이돌봄서비스지원 : 맞벌이,한부모 다자녀가정의 양육공백시 시간제 또는 종일제로 신청하여 돌봄(1개소) ○ 사업비 : 269백만원 (국비135, 지방비134) 	<ul style="list-style-type: none"> ○'19.12. : 시간연장형 4개소 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 해나라, 동화나라, 심천 세림 : 시간제보육 1개소 운영 - 한빛 : 아이돌봄지원 1개소 운영 - 다문화가족지원센터 ○'20.03. : 시간연장형 4개소 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 해나라, 동화나라, 심천 세림 : 시간제보육 1개소 운영 - 한빛 : 아이돌봄지원 1개소 운영 - 다문화가족지원센터 ○'20.06. : 시간연장형 4개소 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 해나라, 동화나라, 심천 세림 : 시간제보육 1개소 운영 - 한빛 : 아이돌봄지원 1개소 운영 - 다문화가족지원센터 ○'20.09. : 시간연장형 4개소 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 해나라, 동화나라, 심천 세림 : 시간제보육 1개소 운영 - 한빛 : 아이돌봄지원 1개소 운영 - 아이돌보미 인력 18명 ○'20.12. : 시간연장형 4개소 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 해나라, 동화나라, 심천 세림 : 시간제보육 1개소 운영 - 한빛 : 아이돌봄지원 1개소 운영 - 아이돌보미 인력 18명 ○'21.3. : 시간연장형 4개소 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 해나라, 동화나라, 심천 세림 : 시간제보육 1개소 운영 - 한빛 : 아이돌봄지원 1개소 운영 - 아이돌보미 인력 19명 ○'21.6. : 시간연장형 4개소 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 해나라, 동화나라, 심천 세림 : 시간제보육 1개소 운영 - 한빛 				

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황												
			<ul style="list-style-type: none"> : 아이돌봄지원 1개소 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 아이돌보미 인력 16명 (3명퇴직) ○'21.9. : 시간연장형 4개소 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 해나라, 동화나라, 심천 세림 : 시간제보육 1개소 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 한빛 : 아이돌봄지원 1개소 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 아이돌보미 인력 18명 ○'21.12. : 시간연장형 4개소 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 해나라, 동화나라, 심천 세림 : 시간제보육 1개소 운영 : 한빛 : 아이돌봄지원 1개소 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 아이돌보미 인력 17명 (1명 연령 도래로 인한 퇴사) 												
1-3	<p style="text-align: center;">육아종합지원센터 건립 (정상추진)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2019. ~ 2022. ○ 위치 : 영동읍 부용리37번지 ○ 사업규모 : 연면적1,100㎡(지하1층, 지상2층) ○ 내용 : 영유아를 위한 장난감대여실, 맘카페, 시간제보육실, 부모교육실, 놀이터 등 ○ 사업비 : 3,500백만원 (국비1,000, 도비300, 군비2,200) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">공약내용 변경(20.12.14.)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">변경사항</th> <th style="text-align: center;">당 초</th> <th style="text-align: center;">변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>위 치</td> <td style="text-align: center;">매천리</td> <td style="text-align: center;">부용리</td> </tr> <tr> <td>사업규모</td> <td style="text-align: center;">1,000㎡</td> <td style="text-align: center;">1,100㎡</td> </tr> <tr> <td>사 업 비</td> <td style="text-align: center;">2,500백만원</td> <td style="text-align: center;">3,500백만원</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">(사유) 위치 변경, 사업규모 및 건립비용 증가에 따른 사업비 증액</p> </div>	변경사항	당 초	변 경	위 치	매천리	부용리	사업규모	1,000㎡	1,100㎡	사 업 비	2,500백만원	3,500백만원	<ul style="list-style-type: none"> ○'20. 5. : 1회추경 예산 반영 (13억) ○'20. 5~6. : 공공건축 사업계획 사전검토 및 건축심의 설계용역 의뢰(제안공모) ○'20. 7~9. : 조달청(제안공모) 심사 및 설계공모자 선정 완료 '20. 10~'21. 4. : 설계용역 추진 '20. 10~11. : 도지정 문화재현상 변경허가 승인완료 '20. 11. : 사업부지 현황측량 완료 '20. 12. : 특별교부세 7억 확보하여 '21년도 예산 반영 '21. 2 : 육아종합지원센터 지반 조사 완료 '21. 5~6. : 계약심사 및 일상감사 추진 2021. 7. 26 : 사업 착공 2021. 9월말까지 : 공사 일시 정지 (관급 철근납품 납품 지연) 2021. 10. 16~ : 공사 재착공후 추진 2021. 12. 22~ 해제시 : 동절기 공사 일시 정지 통보
변경사항	당 초	변 경													
위 치	매천리	부용리													
사업규모	1,000㎡	1,100㎡													
사 업 비	2,500백만원	3,500백만원													
1-4	<p style="text-align: center;">청소년종합문화센터 건립 (임기후)(임기중55%) (정상추진)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2020. ~ 2024. ○ 위치 : 영동군 영동읍 영동천2길 29 (현 영동문화원 자리) ○ 사업규모 : 875㎡ ○ 방법 : 현 문화원 건물 리모델링 ○ 사업비 : 700백만원 (국비 490, 군비 210) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">공약내용 변경(19.11.27.)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">변경사항</th> <th style="text-align: center;">당 초</th> <th style="text-align: center;">변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사 업 비</td> <td style="text-align: center;">2,500백만원</td> <td style="text-align: center;">700백만원</td> </tr> <tr> <td>사업기간</td> <td style="text-align: center;">2018.~2022.</td> <td style="text-align: center;">2020~2024</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">(사유) 사업방법 변경(신축→리모델링)</p> </div>	변경사항	당 초	변 경	사 업 비	2,500백만원	700백만원	사업기간	2018.~2022.	2020~2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현 영동문화원의 이전이 선행되어야 사업 추진 가능 ○ 영동문화원 이전 예정 : 2023년 ○ 농촌협약 예비계획 승인 ('21.7.7) 			
변경사항	당 초	변 경													
사 업 비	2,500백만원	700백만원													
사업기간	2018.~2022.	2020~2024													

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황															
		<p>공약내용 변경(21.12.13.)</p> <table border="1" data-bbox="528 309 927 409"> <tr> <td>변경사항</td> <td>당 초</td> <td>변 경</td> </tr> <tr> <td>연차별</td> <td>임기내</td> <td>임기내</td> </tr> <tr> <td>추진계획</td> <td>공사착공</td> <td>설계추진</td> </tr> </table> <p>(사유) 사업부지 영동문화원 이전 2024년 완료예정에 따른 변경</p>	변경사항	당 초	변 경	연차별	임기내	임기내	추진계획	공사착공	설계추진							
변경사항	당 초	변 경																
연차별	임기내	임기내																
추진계획	공사착공	설계추진																
1-5	<p>어린이집, 지역아동센터 공기청정기 설치 추진 [완료]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2018.10 ~ 2019. ○ 대상 : 25개소 (어린이집 16, 지역아동센터 9) ○ 내용 : 공기청정기 구입비용지원 ○ 사업비 : 42백만원 (국비 17, 지방비 25) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '18.12. : 어린이집 지원완료 (16개소, 59대) ○ '19.04. : 지역아동센터 지원완료 (9개소, 9대) 															
1-6	<p>어린이 안심공원 조성 [정상추진]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 영동읍 동정리 93-7번지 외 2필지 ○ 기간 : 2020. ~ 2021. ○ 사업량 : 2,764㎡ ○ 사업비 : 2,360백만원 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 자연체험형 시설 (징검다리 및 출렁다리, 나무오르기 등) - 조합놀이대 시설 (창의력 향상을 위한 그네, 시소 등) <p>공약내용 변경(19.11.27.)</p> <table border="1" data-bbox="528 1041 927 1142"> <tr> <td>변경사항</td> <td>당 초</td> <td>변 경</td> </tr> <tr> <td>면 적</td> <td>1,634㎡</td> <td>2,764㎡</td> </tr> <tr> <td>사 업 비</td> <td>1,500백만원</td> <td>2,400백만원</td> </tr> </table> <p>(사유) 주민의견 수렴하여 사업대상지 면적 확장</p> <p>공약내용 변경(20.12.14.)</p> <table border="1" data-bbox="528 1258 927 1326"> <tr> <td>변경사항</td> <td>당 초</td> <td>변 경</td> </tr> <tr> <td>사 업 비</td> <td>2,400백만원</td> <td>2,360백만원</td> </tr> </table> <p>(사유) 군관리 및 공원조성계획 용역비 감소</p>	변경사항	당 초	변 경	면 적	1,634㎡	2,764㎡	사 업 비	1,500백만원	2,400백만원	변경사항	당 초	변 경	사 업 비	2,400백만원	2,360백만원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 대상지(동정리 93-7 외 2필지) 선정 완료(2019.09) ○ 중기지방재정투자심사 계획 수립 (2019.11) ○ 2020년 제1차 지방재정투자 심사 완료(2020.03) ○ 2020년 3회추경 예산반영(60백만원) ○ 편입토지 감정평가 집행(2021.1)
변경사항	당 초	변 경																
면 적	1,634㎡	2,764㎡																
사 업 비	1,500백만원	2,400백만원																
변경사항	당 초	변 경																
사 업 비	2,400백만원	2,360백만원																
2-1	<p>초·중·고 입학축하금 지원 [이행후 계속추진]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2021. 1. ~ ○ 지원내용 : 입학일 기준 부모 또는 모와 자녀가 군내 주민 등록을 두고 실제 거주 하면서 초·중·고등학교에 최초 입학하는 경우 입학 축하금 지원 ○ 지원금액 : 초등학교 입학생 20만원 중 학교 입학생 30만원 고등학교 입학생 50만원 ○ 사업비 : 1,223백만원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '18.12. : 영동군 인구늘리기시책 지원 조례 개정 ○ '19.03. : 입학축하금 신청·접수 ○ '19.05. ~ : 입학축하금 지급 - 280,100천원(810명) (초 243명, 중 260명, 고 307명) ○ '19.12. : 영동군 인구늘리기시책지원 조례 개정(지원대상 완화) - 부모와자녀→부모와자녀 - 입학일 기준 → 입학일 부터 신청일까지 계속 ○ '20.04. : 입학축하금 신청·접수 ○ '20.06. ~ : 입학축하금 지급 - 286,200천원(816명) (초 206명, 중 300명, 고 310명) ○ '21.02. : 입학축하금 신청·접수 ○ '21.03 ~ : 입학축하금 지급 - 255,700천원(752명) (초 221명, 중 270명, 고 261명) 															

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황												
2-2	<p>저소득 청소년 건강증진비 지원 (이행후 계속추진)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2019. ~ ○ 내용 : 관내 기초생활수급가구의 청소년에게 월 30,000원 건강 증진비 지원 ○ 사업비 : 432백만원(군비) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '18.10. : 영동군 저소득 청소년 건강증진비 지원 조례제정 및 예산확보 ○ '19.02. ~ : 매월 25일(30,000원 지원) (월150여명) ○ '20.03. ~ : 지원 연령 확대 조례 개정(20.7월 시행) ○ '20.04. ~ : 추가확대 지원에 따른 예산 추가 확보(1회추경) ○ '20.07. ~ : 연령 확대 인원 지급 (월300여명) ○ '21.04. ~ 21.05. : 지원대상자 사업만족도 설문조사 ○ '21.12.15. : 저소득층 지원범위 확대 추진으로 보건복지부와 협의 완료 												
2-3	<p>청소년 해외연수 및 영어캠프 확대 시행 (이행후 계속추진)</p>	<p>[영어캠프]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 매년 여름방학 ○ 참여인원 : 230명 ○ 사업내용 : 원어민 중심의 영어학습 프로그램 ○ 사업비 : 115백만원 <p>[해외연수]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 매년 겨울방학 ○ 참여인원 : 58명 ○ 사업내용 : 영어능력향상과 현지교육·문화교류를 위한 해외연수 ○ 사업비 : 179백만원 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>공약내용 변경(20.12.14.)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">변경사항</th> <th style="text-align: center;">당 초</th> <th style="text-align: center;">변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사업비</td> <td style="text-align: center;">1,425백만원</td> <td style="text-align: center;">1,263백만원</td> </tr> </tbody> </table> <p>(사유) 코로나19 감염방지를 위해 2020년 영어캠프 및 2021년 해외연수 취소</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>공약내용 변경(21.12.13.)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">변경사항</th> <th style="text-align: center;">당 초</th> <th style="text-align: center;">변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사업비</td> <td style="text-align: center;">1,263백만원</td> <td style="text-align: center;">1,006백만원</td> </tr> </tbody> </table> <p>(사유) 코로나19 감염방지를 위해 2020년 영어캠프, 해외연수 및 2021년 해외연수 취소</p> </div>	변경사항	당 초	변 경	사업비	1,425백만원	1,263백만원	변경사항	당 초	변 경	사업비	1,263백만원	1,006백만원	<p>[영어캠프]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '18.07. : 영어캠프 추진/기수별 4박5일 / 인천영어마을 ○ 참여인원 : 초 100명 / 중 100명 ○ '19.07. : 영어캠프 추진/기수별 4박5일 / 인천영어마을 ○ 참여인원 : 초 110명 / 중 120명 ○ '20.04. : 코로나19로 취소 ○ '21.07. : 온라인 영어캠프 추진/기수별 4일 실시간 화상영어 ○ 참여인원 : 초 75명 / 중 96명 <p>[해외연수]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '18.01. : 초·중학생 해외연수 추진 / 20명 / 미국 ○ '18.09. : 대상자 선발(영어캠프 우수 중학생 30명) ○ '18.11. : 연수 추진 위탁업체 선정 ○ '19.01. : 중학생 해외연수 추진 / 30명 / 미국 ○ '19.09. : 대상자 선발(영어캠프 우수 중학생 30명) ○ '19.11. : 2020년 연수추진 위탁업체 선정 ○ '20.01. : 중학생 해외연수 추진 / 30명 / 미국 ○ '20.10. : 코로나19로 취소 ○ '21.12. : 코로나19로 취소
변경사항	당 초	변 경													
사업비	1,425백만원	1,263백만원													
변경사항	당 초	변 경													
사업비	1,263백만원	1,006백만원													
2-4	<p>각급학교CCTV 설치 및 통합관제센터 연계 (완료)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 학교내 각종 사건·사고등 범죄 예방 CCTV 설치 및 통합관제센터 연계 ○ 기간 : 2019. 1. ~ 12. ○ 대상 : 관내 초·중·고교 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '19년 사업예산 확보 : 18. 12. 현재 ○ '19.04. : 영동교육지원청 사업협의 ○ '19.05. : 관내 12개 중·고교 방문 사업개요 설명 및 협의 ○ '19.05. : 충북교육청 사업협의 												

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
		<ul style="list-style-type: none"> ○ 대 수 : 고성능 CCTV 14식 57대 ○ 사업비 : 315백만원(군비) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '19.07. : 사업설계 및 발주 ○ '19.10. : 준공 및 관제센터 연계완료
3-1	농업인 안전재해보험 확대 지원 (이행후계속추진)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2018. ~ 2022. ○ 사업대상 : 만15세 ~ 87세의 영농 활동에 종사하는 농업인 ○ 사업비 : 4,844백만원 (국비 2,422, 도비 361, 군비 764, 기타 1,297) ○ 사업내용 - 피보험자당 주계약 보험료 지원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '20년 농업인 안전보험보조 지원비율 확대 - 보조비율 : 65% ⇒ 75% - '20년 군비확보 (보조비율 확대분) : 101,766천원 - 보험 가입인원 : 5,771명 ○ '21년 농업인 안전보험보조 지원비율 확대 유지 - 보조비율 : 75% 유지 - '21년 군비확보 (보조비율 확대분) : 100,000천원 - 보험 가입인원 : 6,294명
3-2	친환경 농산물 생산지원 확대 (완료)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2018. ~ 2022. ○ 사업대상 : 친환경인증을 받은 농업인, 농업 법인, 생산자단체 등 ○ 사업비 : 2,923백만원 (국비 434, 도비 476, 군비 1,321, 기타 692) ○ 사업내용 - 친환경농업 직접지불제 외 8개 사업 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '21.01 ~ 02. : 사업추진계획 수립 및 사업신청 접수 ○ '21.03. : 사업대상자 선정 및 보조금 교부결정 ○ '21.04 ~ : 사업추진 ○ '21.12 : 보조사업 완료
3-3	농촌 일손해결 시스템 구축 (완료)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2018. ~ 2022. ○ 내용 - 농촌인력증개센터 운영 - 일손봉사 긴급지원반 운영 - 외국인계절근로자 사업 확대 (해외 지자체와 MOU 추진) - 한시적 외국인 계절근로자 도입 - 봄·가을 농촌일손돕기 추진 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '18.11. : 인력지원센터 부지 검토 ○ '18.12. : 농업인력지원센터 사업계획 수립 ○ '19.10. : 인력지원센터 보수공사 완료 ○ '19.11. : 인력지원센터 홈페이지 구축 완료 ○ '19.11.6~12.20. : 인력지원센터 시범운영 ○ '20.09. : 봄철·태풍피해복구 농촌일손돕기 추진(1,180명) ○ '20.12. : 중개 60건(구인 60농가, 구직 60명) ○ '21.03. : 한시적 계절근로자 도입 ○ '21.04. : 베트남, 필리핀과 MOU 추진 ○ '21. : 봄철, 하반기 농촌일손돕기(946명) ○ '21.10. : 필리핀과 MOU 체결 ○ '21.12. : 인력 센터 중개 582농가 2,117명 ○ '21.12. : 긴급지원반 80개소 929명 지원
3-4	과일통일포장재 확대 지원 (이행후 계속추진)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2018. ~ 2022. ○ 사업대상 : 포도 등 5개 품목을 표준규격에 맞게 우리군 통일포장재로 출하하는 생산자 조직 ○ 사업비 : 24,500백만원 (군비 12,000, 기타 12,500) ○ 사업내용 : 포도 등 5개 품목을 표준규격에 맞게 사용하는 생산자 조직에 과일 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020년 사업비 집행 : 16개조직, 5,637,934매, 4,036백만원) ○ '21. 03. : 2021년 사업예산 1회추경에 산요구 5,000백만원 (보조 2,500백만원, 자담 2,500백만원) ○ '21. 06. : 2021년 사업 보조금 교부 결정 (20개조직 / 5,563,137매 / 4,005 백만원) ○ '21. 09. : 2021년 사업대상자 포장

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황															
		통일포장재 제작지원	대 동반 포전매매 조사 및 점검 ○ '21. 12. : 사업완료 및 보조금 지급 (16개조직 / 5,043,631매 / 4,049백만원)															
3-5	농산물 산지유통센터 시설보완 [완료]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2018. ~ 2021. ○ 위치 : 영동읍 설계리 377-1외 1 ○ 사업규모 : 1개소 ○ 사업비 : 8,000백만원 (국비 1,688, 도비 834, 군비 2,434, 기타 3,064) ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 국비공모 : 소방·전기·토목시설, 선별장, 저온창고 등 - 군비지원 : 선별시스템, 세척기 등 기계장비류 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> 공약내용 변경(19.11.27.) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>변경사항</th> <th>당 초</th> <th>변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사업비</td> <td>8,500백만원</td> <td>8,000백만원</td> </tr> <tr> <td>사업기간</td> <td>2018.~2021.</td> <td>2018.~2020.</td> </tr> </tbody> </table> <p>(사유) 세부사업 심의결과 사업비 및 사업기간 변경</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> 공약내용 변경(20.12.14.) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>변경사항</th> <th>당 초</th> <th>변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사업기간</td> <td>2018.~2020.</td> <td>2018.~2021.</td> </tr> </tbody> </table> <p>(사유) 공사기간 부족</p> </div>	변경사항	당 초	변 경	사업비	8,500백만원	8,000백만원	사업기간	2018.~2021.	2018.~2020.	변경사항	당 초	변 경	사업기간	2018.~2020.	2018.~2021.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 부지확보 완료(설계리 377-1) ○ '19.08 : 공모사업확정 ○ '19.08. : 지방재정투자사업 심사의뢰 자료제출 ○ '19.08. : APC지원사업 세부사업 심의 ○ '19.09. : 지방재정투자 현지심사 ○ '19.12. : 건축설계 심의 ○ '20.06. : 측량, 기본 및 실시설계 ○ '20.06. : 건축 등 인허가 ○ '20.09. : 실시설계도서 기술검토완료 및 업체 입찰 선정 계약 ○ '20.10. : 공사착공 ○ '20.12. : 사업 및 예산이월 ○ '21.06. : 전체 공정율 90% ○ '21.11. : 영동농협 농산물 산지유통센터 준공식 ○ '21.12. : 사업완료에 따른 보조금 지급, 사업종료
변경사항	당 초	변 경																
사업비	8,500백만원	8,000백만원																
사업기간	2018.~2021.	2018.~2020.																
변경사항	당 초	변 경																
사업기간	2018.~2020.	2018.~2021.																
3-6	과수원에농가 수분용 벌 지원 [이행후계속추진]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2019. ~ 2022. ○ 사업대상 : 포도를 제외한 관내 과수원에 시설하우스 재배농가 ○ 사업규모 : 270ha ○ 사업비 : 270백만원 (보조 50%, 자담 50%) ○ 주요내용 : 과수원에 시설재배농가에 수정용 벌 구입비 지원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019년 수정벌 지원 : 93농가 55.7ha 766군 67.3백만원 ○ 2020년 수정벌 지원 : 92농가 57.0ha 887군 76백만원 ○ '21년 추진계획 수립('20.12.30) : 90ha 1,000군 90백만원 ○ '21년사업 보조금교부결정('21.1.15.) : 100명 59.5ha 956군 86.8백만원 ○ 2021년 수정벌 지원 : 94농가 57.4ha 742군 80.6백만원 															
3-7	어서실 악취 저감 시설 설치 [완료]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2018. ~ 2022. ○ 위치 : 영동읍 부용리(어서실) ○ 내용 : 어서실 양돈농가 실정에 맞는 축산악취 저감을 위한 시설·장비 설치 ○ 사업비 : 1,200백만원 (군비600, 자담600) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '19.01. : 악취저감 선진지 담당팀장 현장컨설팅 실시 ○ '19.03. : 악취개선 선진지견학 실시 (경남 고성군)-2차 ○ '19.03. : '19년 사업계획 농가협의 ○ '19.05. : '19년 사업계획확정 및 보조금교부 결정 ○ '19.08. : '19년 사업 대상 2호 중 1호 완료(125백만원) ○ '19.09. : 악취모니터링 장비 설치 															

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황						
		<p>공약내용 변경(2021.12.13.)</p> <table border="1" data-bbox="539 322 938 394"> <tr> <td>변경사항</td> <td>당 초</td> <td>변 경</td> </tr> <tr> <td>사업기간</td> <td>2018.~2022.</td> <td>2018.~2021.</td> </tr> </table> <p>(사유) 어서실 일원 농촌재생뉴딜사업 선정으로 해당 축사 2개소 폐업 예정</p>	변경사항	당 초	변 경	사업기간	2018.~2022.	2018.~2021.	<p>완료(3개소)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '19.11. : '19년 약취저감시설 설치 완료(2개소) ○ '20.03. : '20년 사업 보조금교부 결정 ○ '20.06. : '20년 약취저감시설 설치 완료(1개소) ○ '20.12. : 약취모니터링 장비 내구연한 도래에 따른 센서 교체 완료(5식) ○ '21.03. : '21년 사업 보조금교부 결정 ○ '21.07. : '21년 어서실 농촌재생뉴딜사업 선정에 따른 사업 조기종료
변경사항	당 초	변 경							
사업기간	2018.~2022.	2018.~2021.							
3-8	<p>농가소득 증대를 위한 아미노산 액비 공급 확대 (이행후계속추진)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2018~2022년 ○ 내용 : 다양한 홍보활동을 통한 액비 수령 농가 확대 ○ 사업비 : 600백만원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2021년 4분기 유용미생물 보급현황 총 595톤 / 13,903호 보급 - 아미노산액비 259톤 / 5,481호 보급 						
3-9	<p>농업기계 임대 및 순회 수리 확대 운영 (완료)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2018~2022년 ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 농업기계 임대사업 확대 운영을 위한 임대사업장 신축 - 농업기계 순회수리반 증설을 통한 순회수리 확대 운영 ○ 사업비 : 2,503백만원 (도비 20, 군비 2,483) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '18.10. : 임대사업장 신축 공유재산심의 완료 ○ '18.12. : 임대사업장 신축 예산 확보 1,500백만원 ○ '18.12. : 농업기계 순회수리 장비 예산 확보 291백만원 ○ '19.4. : 순회수리교육 차량 구입 ○ '19.2. : 신축공사 설계용역계약 ○ '19.3. : 순회수리 근무자 증원 5명 ○ '19.5. : 설계 완료, 일상 감사 및 계약 심사 완료 ○ '19.6. : 임대사업장 착공 ○ '19.12. : 임대사업장 완공 ○ 2020년도 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 순회수리 170회, 3,503농가, 5,748대 ○ 2021년도 4분기까지 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 순회수리 170회, 3,154농가, 5,624대 						
3-10	<p>콩탈곡기, 잔가지파쇄기 임대 확대 (완료)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2019~2022년 ○ 내용 : 농업기계 임대장비 추가 확보를 통한 임대 확대로 농민들의 적기 영농 도모 ○ 사업비 : 280백만원(군비) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '18.12. : 잔가지 파쇄기 5대 확보 (2018년도 말 기준) ○ '19.03. : 콩탈곡기 3대, 잔가지파쇄기 5대 구입 ○ '19.04. : 잔가지파쇄기 3대 구입 ○ '19.10. : 잔가지파쇄기 7대 구입 ○ '20.02. : 잔가지파쇄기 5대 구입 						
4-1	<p>전통시장 안전시설 강화 및 맞춤형 지원으로 지역상권 활성화 (완료)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 영동전통시장 ○ 사업기간 : 2018.~2020. ○ 사업규모 : 718백만원 (국305.2,도39.24,군373.63) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 영동전통시장 화재알림시설 설치사업 (148개/116백만원) - 전통시장 아케이트 및 점포 노후전선 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018년 국도비예산확보 (91.64백만원) ○ 2019년 국도비 공모사업 신청완료 (252.8백만원) ○ 2018.12월 <ul style="list-style-type: none"> - 전통시장 소화기 설치사업 완료 - 전통시장 이정표 설치사업 완료 ○ 2019.5월 						

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황									
		<p>교체사업 (2개시장/320백만원) -전통시장 가판대(이동용) 설치 지원 (110대/72백만원) -전통시장구역 도로 전면재포장 (600m/200백만원) -전통시장 소화기 설치사업 (140대/6백만원) -전통시장 이정표 설치사업 (1개소/3백만원)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>공약내용 변경(20.12.14.)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">변경사항</td> <td style="width: 30%;">당 초</td> <td style="width: 40%;">변 경</td> </tr> <tr> <td>사업기간</td> <td>2018~2019</td> <td>2018~2020</td> </tr> </table> <p>(사유) 화재알림시설 형식승인제품 출시 지연으로 사업기간 변경</p> </div>	변경사항	당 초	변 경	사업기간	2018~2019	2018~2020	<ul style="list-style-type: none"> - 전통시장구역 도로 전면재포장 완료 ○ 2019.6월 - 전통시장 가판대 설치지원 완료 ○ 2019.12월 - 전통시장 아케이트 및 노후전선 교체사업 완료 ○ 2020.12월 - 영동전통시장 화재알림시설 설치사업 완료 			
변경사항	당 초	변 경										
사업기간	2018~2019	2018~2020										
4-2	<p>영동산업단지 조기분양 완료 [정상추진]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 영동군 용산면 영동산업단지 ○ 분양면적 : 593,593㎡ ○ 사업내용 : 조기분양 완료 (2020년 까지) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 분양현황 : 28개사 579,211㎡ (총 분양면적의 97.5%) ○ 상담 중 기업 : 1개사 (분양 시 분양률 100%) 									
4-3	<p>기업유치 가속화로 일자리 창출을 통한 서민생활 안정 [정상추진]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 영동군 (영동산업단지, 황간물류단지 중점) ○ 고용목표 : 800명(2022년까지) ○ 사업내용 : 기업유치를 통한 일자리 창출 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고용인원 : 547명(이행률 68.3%) ○ 입주율 <ul style="list-style-type: none"> - 황간물류단지 : 77% - 영동산업단지 : 53% 									
4-4	<p>일라이트 활용 고부가가치 산업 육성 [정상추진]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2018 ~ 2022년 ○ 일라이트 안정적 공급기반 구축 ○ 일라이트 성분분석 및 제품적용 실증테스트 ○ 일라이트 연구 센터 구축 ○ 사업비 : 16,309백만원 (국 9,000, 도 2,300, 군 3,809, 기타 : 1,200) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>공약내용 변경(21.12.13.)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">변경사항</td> <td style="width: 30%;">당 초</td> <td style="width: 40%;">변 경</td> </tr> <tr> <td>사업내용</td> <td>일라이트 연구센터구축</td> <td>일라이트 지식산업센터 구축</td> </tr> <tr> <td>사업기간</td> <td>2018.~2022.</td> <td>2018~2024</td> </tr> </table> <p>(사유) 사업방법 변경(신축→리모델링)</p> </div>	변경사항	당 초	변 경	사업내용	일라이트 연구센터구축	일라이트 지식산업센터 구축	사업기간	2018.~2022.	2018~2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 채굴권 5개소, 탐사권 1개소 허가·등록 완료 ○ 일라이트 고부가가치 상용화 연구용역 완료 ○ 영동 일라이트 지식산업센터 기본계획수립 및 타당성 조사용역 완료 ○ 영동 일라이트 상표개발 및 출원용역 완료 ○ 국비확보를 위한 중앙부처 방문건의 및 협의 : 20회 ○ 일라이트 소재 상용화 기술개발 지원사업(1차년도 완료) ○ 일라이트산업 현황분석 및 종합육성계획 수립 ○ 시군 지역특화산업 육성사업(진행중) ○ 일라이트 지식산업센터 건립사업 정부예산 확보 : 2020.12. ○ 일라이트 지식산업센터 건립 공유재산심의외 심의의결 : 2021.3. ○ 1차년도 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업 추진 : 2021. 1.~5. ○ 시군 경쟁력강화산업 추진 : 2021.
변경사항	당 초	변 경										
사업내용	일라이트 연구센터구축	일라이트 지식산업센터 구축										
사업기간	2018.~2022.	2018~2024										

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진상황																																	
			<p>2.~2022. 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지식산업센터 건립 공공건축심의위원회 심의 : 2021. 4. ○ 지식산업센터 부지 토질조사, 지형현황측량 완료 : 2021. 5. ○ 지식산업센터 건립 설계 용역업체 선정 : 2021. 6. ○ 일라이트 광산 채굴계획인가 용역 : 2021. 6.~8. ○ 일라이트 해외 학술자료 및 산업 동향 조사 용역 : 2021. 6.~10. ○ 일라이트 고순도 공정시스템 구축 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 추진 : 2021. 7.~10. ○ 지식산업센터 건립 설계 용역 착수보고회 완료 : 2021. 7. ○ 일라이트 산업 활성화를 위한 업무협약 체결 : 2021. 8. <ul style="list-style-type: none"> - 하농, 천지건업, 라이온캠텍(8.10) - 사임당화장품(8.31) ○ 지식산업센터 건립 설계 용역 중간보고회 완료 : 2021. 9. 																																	
5-1	영동문화원 신축 이전 [정상추진]	<p>○ 기간: 2020 ~ 2022년 ○ 위치: 영동읍 계산리 557-2번지외 2필지 ○ 내용: 영동문화원 신축 이전 ○ 사업비: 8,400백만원 (국비5,000/ 군비3,400)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>공약내용 변경(19.11.27.)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">변경사항</th> <th style="text-align: center;">당 초</th> <th style="text-align: center;">변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">위 치</td> <td style="text-align: center;">계산리 484-6번지</td> <td style="text-align: center;">매천리 463외3필지</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">사 업 비</td> <td style="text-align: center;">7,000백만원</td> <td style="text-align: center;">6,250백만원</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">사업기간</td> <td style="text-align: center;">2019.~2022.</td> <td style="text-align: center;">2020.~2022.</td> </tr> </tbody> </table> <p>(사유) 농촌중심지활성화사업 공모신청 대상지로 위치 변경</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>공약내용 변경(20.12.14.)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">변경사항</th> <th style="text-align: center;">당 초</th> <th style="text-align: center;">변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">위 치</td> <td style="text-align: center;">매천리 463외 3필지</td> <td style="text-align: center;">계산리 557-2외2필지</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">사업규모</td> <td style="text-align: center;">2,500㎡</td> <td style="text-align: center;">4,485㎡</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">사 업 비</td> <td style="text-align: center;">6,250백만원</td> <td style="text-align: center;">8,400백만원</td> </tr> </tbody> </table> <p>(사유) 국토교통부 도시재생 뉴딜사업 공모 선정</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>공약내용 변경(21.12.13.)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">변경사항</th> <th style="text-align: center;">당 초</th> <th style="text-align: center;">변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">사업기간</td> <td style="text-align: center;">2020.~2022.</td> <td style="text-align: center;">2020.~2023.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">사 업 비</td> <td style="text-align: center;">8,400백만원</td> <td style="text-align: center;">14,156백만원</td> </tr> </tbody> </table> <p>(사유) 도시재생 뉴딜사업 선정으로 도비 추가확보 / 절차이행 및 건축물 규모 고려 사업기간연장</p> </div>	변경사항	당 초	변 경	위 치	계산리 484-6번지	매천리 463외3필지	사 업 비	7,000백만원	6,250백만원	사업기간	2019.~2022.	2020.~2022.	변경사항	당 초	변 경	위 치	매천리 463외 3필지	계산리 557-2외2필지	사업규모	2,500㎡	4,485㎡	사 업 비	6,250백만원	8,400백만원	변경사항	당 초	변 경	사업기간	2020.~2022.	2020.~2023.	사 업 비	8,400백만원	14,156백만원	<ul style="list-style-type: none"> ○ '19.02 : '20년 농촌중심지활성화 사업 (농림축산식품부) 예산 공모 신청 [미선정] ○ '20.02 : '20년 농촌협약(농림축산식품부) 예산 공모 신청 [미선정] ○ '20.09 : 국토교통부 도시재생 뉴딜사업(인정사업) 공모 선정 ○ '21.05 : 공공건축 사업계획 사전검토 완료 ○ '21.08 : 설계공모 의뢰(조달청) ○ '21.11 : 기본 및 실시설계 용역 착수
변경사항	당 초	변 경																																		
위 치	계산리 484-6번지	매천리 463외3필지																																		
사 업 비	7,000백만원	6,250백만원																																		
사업기간	2019.~2022.	2020.~2022.																																		
변경사항	당 초	변 경																																		
위 치	매천리 463외 3필지	계산리 557-2외2필지																																		
사업규모	2,500㎡	4,485㎡																																		
사 업 비	6,250백만원	8,400백만원																																		
변경사항	당 초	변 경																																		
사업기간	2020.~2022.	2020.~2023.																																		
사 업 비	8,400백만원	14,156백만원																																		
5-2	국악과 과일울	○ 문화콘텐츠형 시티투어 활성화	○ '20.03. : 영동군 관광홍보관 설치																																	

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진상황
	<p style="text-align: center;">활용한 축제관광 산업화 (이행후 계속추진)</p>	<p style="text-align: center;">사업추진</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생생문화재 공모사업 추진 ○ 지역관광추진조직(DMO) 공모사업 선정 ○ 충북 대표 관광상품 개발지원사업 선정 ○ 대한민국 대표 공연예술제 공모 사업 선정 	<p style="text-align: center;">운영(한국관광공사서울센터)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '20.05. : 문화콘텐츠형 시티투어 버스 공모사업 선정 ○ '20.06. : 축제 경쟁력 강화 및 세계적인 축제 육성사업 공모 선정 ○ '20.09. : 생생공모재 사업 선정 ○ '20.10. : 영동군 풍류버스 임시운영 ○ '20.12. : 난계 박연 관광프로그램 개발 ○ '21.03. : 한국관광공사 지역관광 추진 조직(DMO)공모사업 최종선정 ○ '21.03. : 충북 대표 관광상품 개발 지원사업 최종선정 ○ '21.06. : 영동군 풍류버스 운영 ○ '21.06. : 대한민국 대표공연예술제 공모사업 선정 ○ '21.10. : 지역관광추진조직 사업추진 ○ '21.11. : 생생문화재 사업추진 ○ '21.11. : 영동 관광 미니어처 사업추진 ○ '21.12. : 유람유랑 문화유산 활용사업 선정 ○ '21.12. : 대한민국 공연예술제 지원 사업 선정
5-3	<p style="text-align: center;">도마령 일원 관광자원 개발 (용화, 상촌) (이행후 계속추진)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 도마령 일원(용화, 상촌) ○ 기간 : 2019 ~ 2022년 ○ 내용 : 타당성 조사 용역 1식 ○ 사업비 : 100백만원(군비) ※ 임기내 목표 : 사업선정 	<ul style="list-style-type: none"> ○'19.04. : 1회 추경예산 확보 ○'19.05. : 도마령 일원(용화, 상촌) 관광 개발계획 수립 용역 착수 ○'19.07. : 주민설명회(용화, 상촌) ○'19.09. : 사전보고회(도마령 일원 관광개발기본구상 보고 등) ○'19.12. : 최종보고 및 관광개발계획 수립 용역 완료 ○'20.02. : 지역균형발전 기반조성사업 확정(도비 1,500백만원) ○'20.05. : 2020년 제1회 추경예산 편성(도비 1,500백만원) ○'21.01. : 2021년 본예산 편성(군비 1,900백만원) ○'21.03. : 주민설명회(상촌면, 용화면) 개최 ○'20.08. : 기본 및 실시설계 용역 착수 ○'21.04. : 기본 및 실시설계 용역 완료('20.08.06.~'21.04.05.) ○'21.08. : 일상감사 완료 ○'21.11. : 도 계약심사 완료 및 공사 착공
5-4	<p style="text-align: center;">송호 관광지 보행교 설치 조기 보완 추진 (완료)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 양산면 송호관광지~양산팔경 금강둘레길 ○ 기간 : 2018 ~ 2020년 ○ 내용 : 보행교 설치 L=290m, B=2.5m ○ 사업비 : 9,100백만원 (국비 2,700, 군비 6,400) 	<ul style="list-style-type: none"> ○'18.10. : 실시설계 용역 일시정지, 토질조사 용역 착수 ○'18.11. : 토질조사 용역 완료, 교량 설치위치 및 형식공법 검토 ※ 교량 형식 변경(출렁다리→보행교) ○'19.01. : 공법·자재 선정 기술자문 위원회 개최(서면심의) ○'19.04. : 하천점용 협의 ○'19.09. : 하천점용허가 완료

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황																					
		<p>공약내용 변경(19.11.27.)</p> <table border="1" data-bbox="539 347 938 533"> <thead> <tr> <th>변경사항</th> <th>당 초</th> <th>변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>공 약 명</td> <td>송호 관광지 출렁다리 설치 조기 보완 추진</td> <td>송호 관광지 보행교 설치 조기 보완 추진</td> </tr> <tr> <td>사 업 비</td> <td>5,400백만원</td> <td>9,100백만원</td> </tr> <tr> <td>사업기간</td> <td>2018.~2019.</td> <td>2018.~2020.</td> </tr> </tbody> </table> <p>(사유) 기술자문위원회 결과 교량형식 변경 (출렁다리→보행교)</p> <p>공약내용 변경(21.12.13.)</p> <table border="1" data-bbox="539 645 938 745"> <thead> <tr> <th>변경사항</th> <th>당 초</th> <th>변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사 업 비</td> <td>9,100백만원</td> <td>7,300백만원</td> </tr> <tr> <td>사업기간</td> <td>2018.~2020.</td> <td>2018.~2021.</td> </tr> </tbody> </table> <p>(사유) 보행교 상부 자재·공법 변경에 따른 사업비 감소, 집중호우 및 태풍피해로 작업지연에 따른 공사기간 연장</p>	변경사항	당 초	변 경	공 약 명	송호 관광지 출렁다리 설치 조기 보완 추진	송호 관광지 보행교 설치 조기 보완 추진	사 업 비	5,400백만원	9,100백만원	사업기간	2018.~2019.	2018.~2020.	변경사항	당 초	변 경	사 업 비	9,100백만원	7,300백만원	사업기간	2018.~2020.	2018.~2021.	<p>(대전지방국토관리청)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○'19.11. : 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 이행 완료 ○'19.12. : 실시설계용역 완료 ○'20.01. : 공사 착공 ○'20.05. : 2020년 제1회 추경예산 편성 (군비 1,900백만원) ○'20.07. : 보도수순교 상부공 제작 및 설치 계약(조달청) ○'21.06. : 공사 준공 ○'21.08. : 야간경관 조명 설치공사 착공 및 준공 ○'21.09. : 돌계단 설치공사 착공 ○'21.09. : 송호금강 물빛다리 임시개통 ○'21.10. : 돌계단 설치공사 착공 및 준공 ○'21.11. : 송호금강 물빛다리 개통
변경사항	당 초	변 경																						
공 약 명	송호 관광지 출렁다리 설치 조기 보완 추진	송호 관광지 보행교 설치 조기 보완 추진																						
사 업 비	5,400백만원	9,100백만원																						
사업기간	2018.~2019.	2018.~2020.																						
변경사항	당 초	변 경																						
사 업 비	9,100백만원	7,300백만원																						
사업기간	2018.~2020.	2018.~2021.																						
5-5	<p>4번국도 영동군 홍보관문 조기 착공 (완료)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 추풍령면 추풍령리(국도4호선), 학산면 봉소리(국도19호선) ○ 기간 : 2018 ~ 2020년 ○ 내용 : 홍보관문 설치 2개소 ○ 사업비 : 1,800백만원(군비) <p>공약내용 변경(19.11.27)</p> <table border="1" data-bbox="539 1142 938 1350"> <thead> <tr> <th>변경사항</th> <th>당 초</th> <th>변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>위 치</td> <td>추풍령면 추풍령리 (국도4호선), 학산면 서산리 (국도19호선)</td> <td>추풍령면 추풍령리 (국도4호선), 학산면 봉소리 (국도19호선)</td> </tr> <tr> <td>사업기간</td> <td>2018.~2019.</td> <td>2018.~2020.</td> </tr> </tbody> </table> <p>(사유) 도 경계 홍보관문 상징성과 주변 환경 여건 등을 고려 설치 위치 변경 (학산 서산→봉소)</p>	변경사항	당 초	변 경	위 치	추풍령면 추풍령리 (국도4호선), 학산면 서산리 (국도19호선)	추풍령면 추풍령리 (국도4호선), 학산면 봉소리 (국도19호선)	사업기간	2018.~2019.	2018.~2020.	<ul style="list-style-type: none"> ○'18.09. : '18년 2회 추경 예산확보 ○'19.03. : 디자인 및 실시설계 용역 착수(19. 3. ~ 19. 7) ※ 도 경계 홍보관문 상징성과 주변 환경 여건 등을 고려하여 설치 위치 변경 (학산면 서산리→학산면 봉소리) ○'19.05. : 의원간담회 자료 제출 및 의견 수렴 ○'19.08. : 영동군 공공디자인위원회 심의(재심의) ○'19.09. : 영동군 공공디자인위원회 심의(조건부 가결) ○'19.11. : 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 이행 완료 ○'19.12. : 디자인 및 실시설계용역 완료, 공사(토목) 착공 ○'20.05. : 2020년 제1회 추경예산 편성 (군비 450백만원) ○'20.06. : 야간경관 조명 설치공사 착공 ○'20.08. : 공사(토목, 전기) 준공 ○'20.09. : 전광판 설치 완료 												
변경사항	당 초	변 경																						
위 치	추풍령면 추풍령리 (국도4호선), 학산면 서산리 (국도19호선)	추풍령면 추풍령리 (국도4호선), 학산면 봉소리 (국도19호선)																						
사업기간	2018.~2019.	2018.~2020.																						
5-6	<p>국립 난계국악원 유치 (정상추진)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○기간 : 2019년 ~ 2022년 ○위치 : 심천면 고당리 일원 ○내용 : 국립 난계국악원 유치 - 국악연구·제작시설, 국악교육, 연수 시설, 기타 편의시설 등 설치 <p>공약내용 변경(21.12.13.)</p> <table border="1" data-bbox="539 1865 938 1933"> <thead> <tr> <th>변경사항</th> <th>당 초</th> <th>변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사업기간</td> <td>2018.~2021.</td> <td>2018.~2024.</td> </tr> </tbody> </table> <p>(사유) 중앙부처의 분원건립 필요성 도출했으나 신설계획 미정에 따라 목표기간 변경 추진</p>	변경사항	당 초	변 경	사업기간	2018.~2021.	2018.~2024.	<ul style="list-style-type: none"> ○2018. 04. 25 : 중앙기관 관계자 영동 방문 (국립국악원 4명, 문광부 2명, 도 3명) ○2018. 07. 24 : 국립국악원장 면담(도3명, 군4명) ○2018. 11. 14 : 박덕흠 의원 사무실 방문(군 3명) ○2018. 11. 18 : 기획재정부(문화예산과) 담당사무관 면담 (도 2명, 군 3명) -국립국악원 영동 건립을 위한 타당성 용역비(2억) 반영 건의 															
변경사항	당 초	변 경																						
사업기간	2018.~2021.	2018.~2024.																						

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진상황
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 02. 25 : 충북도 문화예술산업과장 군수님 면담, 추진방향 및 의견 수렴 등 ○ 2019. 04. 01 : 박일훈 前 국립국악원장 면담 - 분원 유치 업무추진 자문 ○ 2019. 05. 10 : 한국종합예술학교 음악과장 (민익식) 면담 - 국립국악원 분원 유치 협조 요청 (대외 홍보 등) ○ 2019. 8. ~ 2020. 2. : 국립국악원 소속국악원 건립 타당성 검토 기준마련 연구용역 대응 (주관 : 국립국악원) - 우리군 국악정액 및 국악인프라 등 자료 제출, 유치 당위성 홍보 등 ○ 2020. 7. 14 : 문화체육관광부 방문 담당자 면담 - 분원 건립관련 현재 진행상황 및 향후계획 파악 - 우리군 국악 인프라 및 건립 시 차별성·효율성 등 강점 설명 ○ 2020. 11. 17 : 한국예술종합 대학 민익식 교수 자문 - 국립국악원 분원 및 국악엑스포 유치 추진 자문 - 분원 유치 관련 인적네트워크 등 활용 적극 협조 ○ 2021. 2. 27 : - 대한민국 국·공립예술단 국악 지휘자협회 창립총회 시 유치 당위성 홍보 ○ 2021. 6. 22 : - 국악학과 교수 5명 유치 당위성 홍보 ○ 2021. 9. 9. : 공연발전협의회 실시 ○ 2021. 11. 30 : - 국악학과 교수 5명 유치 당위성 홍보
5-7	<p style="text-align: center;">각 면소재지 경관조명 설치 (완료)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2019년~2022년(4년) ○ 사업내용 : 건축물, 교량, 도로, 가로등에 대한 경관조명 설치 ○ 총사업비 : 400백만원(군비) - 2019년 예산 : 200백만원(군비) - 2020년 예산 : 50백만원(군비) - 2021년 예산 : 50백만원(군비) - 2022년 예산 : 100백만원(군비) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 황간면 경관조명 설치완료('19. 11.) ○ 용화면 여의교 설치완료('20. 02.) ○ 매곡면 노천교 설치완료('20. 02.) ○ 2020년 수요조사('20. 02.) : 심천면 ○ 심천교 설계 및 계약 중('20. 03.) ○ 심천면 심천교 설치완료('20. 06.) ○ 여의교 조명 보강공사('20. 10~12.) ○ 2021년 수요조사('21. 04.) : 상촌면 ○ 상촌면 관기교 설치완료('21. 07.)
5-8	<p style="text-align: center;">레인보우 힐링타운 2021년 완공</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 영동읍 매천리 산35-1번지 일원 ○ 사업기간 : 2014 ~ 2021 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '18.06 : 투자선도지구 지구지정 ○ '18.10. : 영동와인터널 정식개장

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진상황
	<p>(정상추진)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업비 : 140,100백만원 ○ 사업내용 : 영동와인터널, 힐링센터, 문화예술회관, 웰니스단지, 문화마당, 도로, 주차장 등 공공부문 	<ul style="list-style-type: none"> ○'18.10. : 지역개발사업계획 승인고시 ○'18.11. : 투자선도지구 실시계획 승인 ○'18.11. : 웰니스단지 조성사업 3차분 착공 ○'18.12. : 지역개발사업 실시계획 승인 ○'19.04. : 산림조경숲 조성사업 준공 ○'19.05. : 와인터널 주차장 준공 ○'19.06. : 레인보우 힐링타운 광장 조성사업 착공 ○'19.08. : 과일나라 테마공원 연결도로 구축사업 착공 ○'19.09. : 레인보우 힐링센터 건립사업 착공 ○'19.10. : 레인보우 힐링센터 감독 권한대행 감리용역 착공 ○'19.11. : 레인보우 힐링관광지 기반시설 감독권한대행 감리용역 착공 ○'20.01. : 투자선도지구 기반시설 구축사업 2차분 착공 ○'20.03. : 와인터널 방수보강공사 착공 ○'20.03. : 기반시설 전기공사 착공 ○'20.03. : 힐링센터 건축공사 1차분 준공 및 2차분 착공 ○'20.04. : 힐링센터 전기·통신·소방 공사 1차분 준공 및 2차분 착공 ○'20.05. : 레인보우 힐링타운 광장 조성사업 1차분 준공 및 2차분 착공 ○'20.05. : 레인보우 힐링센터 감독 권한대행 감리용역 1차분 준공 및 2차분 착공 ○'20.07. : 과일나라테마공원 연결도로 개설사업 1차분 준공 및 2차분 착공 ○'20.12. : 웰니스단지 조성사업 준공 ○'21.01. : 투자선도지구 기반시설 구축 사업 준공 ○'21.02. : 영동 레인보우 힐링관광지 지정 및 조성계획(변경)승인 ○'21.03. : 힐링센터·건축기계·토목 공사 2차분 준공 및 3차분 착공 ○'21.03. : 힐링센터·전기·통신·소방 공사 2차분 준공 및 3차분 착공 ○'21.03. : 힐링관광지 순환도로 확장 공사 착공 ○'21.03. : 영동 레인보우 힐링관광지 지정 및 조성계획(변경)승인제출 ○'21.03. : 영동군 어린이 교통안전교육장 조성사업 착공 ○'21.06. : 영동 레인보우 힐링관광지 지정 및 조성계획(변경)승인 고시 ○'21.06. : 군계획시설(골프장) 실시계획인가신청 ○'21.07. : 군계획시설(골프장) 실시계획 인가 ○'21.07. : 레인보우 힐링타운 광장 조성사업 준공 ○'21.08. : 영동 레인보우 힐링관광지내

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진상황									
			체육시설(일라이트컨트리클럽) 조성사업 착공 ○'21.11. : 과일나라테마공원 연결도로 구축사업 준공 ○'22.02. : 힐링센터 건립 준공 예정									
6-1	가로·보안 조도개선 (완료)	○ 기간 : 2018 ~ 2022년 ○ 내용 : 11개 읍·면 주민의 야간 보행자편의 제공 및 노후 가로 등의 조도효율 개선 ○ 사업비 : 1,460백만원(군비)	○ 2018년 4월 11개 읍·면 조도개선 214개소 사업추진 완료 ○ 2018년 12월 영동읍외 4개면 225 개소 조도개선 사업추진 완료 ○ 2019년도 조도개선 사업비 (군비) 300백만원 확보 ○ 2019년도 읍·면별 사업수요대상지 수요조사 추진 ○ 2019년 7월 읍·면 가로(보안)등 239개소 설치 및 지급자재구입완료 ○ 2020년 4월중 조도개선 완료 및 누락 및 유지관리 지급자재 구입 ○ 2020년 5월 조도개선 218개소 설치 완료 ○ 2020년 8월 조도개선 11개 읍·면 노후등 178개소 교체 완료 ○ 읍·면별 조도개선사업 2021년(군비) 200백만원 확보 ○ 2021년 읍·면별 조도개선사업 보안등 207개소 수요조사 및 설계완료 ○ 2021년 12월 보안등 조도개선 252개소 교체 완료									
6-2	교통난 해소를 위한 공영주차장 증설 (완료)	○ 기간 : 2018 ~ 2021년 ○ 위치 : 영동읍 계산리 484-6번지 외 3개소 ○ 내용 - 영산동 공영주차장 복층화 사업 - 영동읍 구교리 주차장 조성 사업 - 매천리 공영주차장 조성 사업 - 황간면 남성리 공영주차장 조성 사업 ○ 사업비 : 7,906백만원 (국비 1,740 / 도비 250 / 군비 5,916) <div data-bbox="512 1615 954 1816" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>공약내용 변경(20.12.14.)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">변경사항</th> <th style="text-align: center;">당 초</th> <th style="text-align: center;">변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사업비</td> <td style="text-align: center;">6,350백만원</td> <td style="text-align: center;">7,906백만원</td> </tr> <tr> <td>사업기간</td> <td style="text-align: center;">2018.~2020.</td> <td style="text-align: center;">2018.~2021.</td> </tr> </tbody> </table> <p>(사유) 주민 의견수렴 및 행정절차 이행 으로 사업비 및 사업기간 변경</p> </div>	변경사항	당 초	변 경	사업비	6,350백만원	7,906백만원	사업기간	2018.~2020.	2018.~2021.	○'18.06. : 영동읍 구교리 주차장 조성 사업 착공 ○'18.08. : 공모사업 선정(영산동 공영 주차장 복층화 사업) ○'18.11. : 매천리 공영주차장 조성 사업 토지매입 및 실시설계 ○'18.11. : 황간면 남성리 공영주차장 조성 사업 착공 ○'19.03. : 황간면 남성리 공영주차장 조성 사업 준공 ○'19.04. : 영산동 공영주차장 복층화 사업 주민설명회 실시 ○'19.05. : 영동읍 구교리 주차장 조성 사업 설계변경 ○'19.08. : 영동읍 구교리 주차장 조성 사업 준공 ○'19.09. : 매천리 공영주차장 조성사업 착공 ○'19.10. : 영산동 공영주차장 복층화 사업 주민설명회(2차) 실시 ○'19.12. : 영산동 공영주차장 복층화 사업 BF예비인증 용역 착수 ○'19.12. : 영산동 공영주차장 복층화 사업 BF예비인증 완료
변경사항	당 초	변 경										
사업비	6,350백만원	7,906백만원										
사업기간	2018.~2020.	2018.~2021.										

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황									
			<ul style="list-style-type: none"> ○ '20.01. : 영산동 공영주차장 복층화 사업 BF예비인증 준공 ○ '20.03. : 영산동 공영주차장 복층화 사업 실시설계용역 준공 ○ '20.05. : 매천리 공영주차장 조성사업 준공 ○ '20.06. : 지역개발사업구역 지정 고시 ○ '20.09. : 영산동 공영주차장 복층화 사업 착공 ○ '21.10. : 영산동 공영주차장 복층화 사업 준공 									
6-3	<p style="text-align: center;">국도19호선 확포장 공사 조기 착공 (이행후 계속추진)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2018 ~ 2024년 ○ 위치 : ㉠영동IC ~ 영동산업단지 ㉡영동병원 ~ 울리교차로 ○ 내용 : 도로확포장 : ㉠ L=4.58km ㉡ L=7.34km ○ 사업비 : 156,000백만원(국비) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center;">공약내용 변경(19.11.27.)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">변경사항</th> <th style="text-align: center;">당 초</th> <th style="text-align: center;">변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">사 업 비</td> <td style="text-align: center;">177,000백만원</td> <td style="text-align: center;">156,000백만원</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">사업기간</td> <td style="text-align: center;">2018.~2022.</td> <td style="text-align: center;">2018.~2024.</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">(사유) 영동병원~U1대 교차로 구간 실시 설계 완료로 사업비(*비예산) 변경 및 조기 착공</p> </div>	변경사항	당 초	변 경	사 업 비	177,000백만원	156,000백만원	사업기간	2018.~2022.	2018.~2024.	<ul style="list-style-type: none"> ○ '19.03:영동병원~U1대교차로 착공 ○ U1대교차로~울리교차로 공사 중(공정률 7%) ○ 영동병원~U1대 구간 L=2.1km 공사 중(공정률 62%) ○ 영동IC~영동산업단지 공사및보상
변경사항	당 초	변 경										
사 업 비	177,000백만원	156,000백만원										
사업기간	2018.~2022.	2018.~2024.										
6-4	<p style="text-align: center;">교통난 해소를 위한 회전교차로 설치확대 (완료)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2018 ~ 2021년 ○ 위치 : 관내일원 (구교3, 구교4, 부용4거리) ○ 내용 : 회전교차로 3개소 설치 ○ 사업비 : 2,800백만원 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center;">공약내용 변경(19.11.27.)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">변경사항</th> <th style="text-align: center;">당 초</th> <th style="text-align: center;">변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">사 업 비</td> <td style="text-align: center;">1,000백만원</td> <td style="text-align: center;">2,800백만원</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">사업기간</td> <td style="text-align: center;">2018.~2020.</td> <td style="text-align: center;">2018.~2021.</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">(사유) 사업시행에 따른 추가 사업비 확보 및 사업기간 변경</p> </div>	변경사항	당 초	변 경	사 업 비	1,000백만원	2,800백만원	사업기간	2018.~2020.	2018.~2021.	<ul style="list-style-type: none"> ○ '18.1:회전교차로 2개소 실시설계 용역 준공(구교삼,사거리) ○ '18.2:주민설명회 개최 ○ '18.3:관계기관 및 보상협의 완료 ○ '19.6:구교삼거리 및 구교사거리 회전 교차로 설치공사 착공(2019년 12월 준공) ○ '20.1~: 국도병목지점 개선 6단계('18~'22) 기본계획 반영 ○ '20.4: 부용4거리 국비건의(군수님) ○ '20.6: 부용4거리 국비건의(도로팀) ○ '20.8: 부용4거리 국비건의(건설교통과장) ○ '20.12: 부용4거리 실시설계용역 착수
변경사항	당 초	변 경										
사 업 비	1,000백만원	2,800백만원										
사업기간	2018.~2020.	2018.~2021.										
6-5	<p style="text-align: center;">군도 확포장공사 추진 (정상추진)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2018~2021년 ○ 위치 : 관내일원 (양강(구강~죽산), 추풍령(사부리)) ○ 내용 : 도로확포장 ○ 사업비 : 5,250백만원(군비) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '18.3:실시설계용역 준공(사부리) ○ '18.6:기공승낙서 징구(구강-죽산) ○ '18.10:보상금지금결정(사부리) ○ '18.11:주민설명회개최(구강-죽산) ○ '19.2:추풍령(사부리)도로확포장공사 공사집행 ○ '19.4: 관계기관협의및보상협의(구강죽산) ○ '19.8:추풍령(사부리)도로확포장 준공 ○ '20.6: 하천구역제외요청(구강~죽산) ○ '20.8:호우피해개선복구요청(구강~죽산) ※국가하천 기본계획변경 수립중 ('21년 12월 완료예정) 									

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황									
		<p>공약내용 변경(21.12.13.)</p> <table border="1" data-bbox="539 309 938 376"> <tr> <td>변경사항</td> <td>당 초</td> <td>변 경</td> </tr> <tr> <td>사업기간</td> <td>2018.~2021.</td> <td>2018.~2026.</td> </tr> </table> <p>(사유) 국가하천(금강천) 기본계획 재수립 지연 및 국토관리청 구강지구 제방 정비사업과 중복구간으로 제방정비 후 추진 가능으로 사업기간 변경</p>	변경사항	당 초	변 경	사업기간	2018.~2021.	2018.~2026.				
변경사항	당 초	변 경										
사업기간	2018.~2021.	2018.~2026.										
6-6	<p>농어촌도로 확보장공사 추진 (완료)</p>	<p>○ 기간 : 2018~2022년 ○ 위치 : 관내일원 (계룡리,어촌리, 학촌-마곡, 명덕-영국사) ○ 내용 : 도로확포장 ○ 사업비 : 5,465백만원</p> <p>공약내용 변경(19.11.27.)</p> <table border="1" data-bbox="539 745 938 846"> <tr> <td>변경사항</td> <td>당 초</td> <td>변 경</td> </tr> <tr> <td>사업비</td> <td>8,000백만원</td> <td>5,465백만원</td> </tr> <tr> <td>사업기간</td> <td>2018.~2022.</td> <td>2018.~2022.</td> </tr> </table> <p>(사유) 보상협약, 노선조정 등으로 사업비 및 사업기간 변경</p>	변경사항	당 초	변 경	사업비	8,000백만원	5,465백만원	사업기간	2018.~2022.	2018.~2022.	<p>○'18.1~12:보상협약(어촌도로) ○'18.3:실시설계용역 준공(계룡리) ○'18.2:주민설명회개최(학촌~마곡) ○'18.5:보상금지급결정 및 관련법 협의(계룡리) ○'18.8:보상협약(학촌~마곡) ○'18.11:공사착공(계룡리) ○'18.12:실시설계용역추진(명덕-영국사) ○'19.3:실시설계용역준공(명덕-영국사) ○'19.9:추풍령 계룡리 도로 준공 ○'19.12:학촌-마곡간도로, 어촌도로, 명덕~영국사간 도로 착공 ○'20.6~: 학촌-마곡, 어촌도로 공사 추진 중 ○'20.8:명덕~영국사간 준공 ○'20.12:어촌리도로확포장 준공 ○'21.3:학촌~마곡간 도로 준공</p>
변경사항	당 초	변 경										
사업비	8,000백만원	5,465백만원										
사업기간	2018.~2022.	2018.~2022.										
6-7	<p>농촌중심지 활성화사업 조기완공 (임기후)(임기중75%) [정상추진]</p>	<p>○ 기 간 : 2012 ~ 2023년 ○ 위 치 : 영동군 1개 읍, 10개면 ○ 내 용 : 기초기반확충, 경관개선, 역량강화 등 ○ 사업비 : 77,485백만원 (국비70%, 군비30%)</p>	<p>○ '21. 2. :추풍령, 용산면 사업 준공 ○ '21. 3. -황간, 양강, 양산면 시행계획 수립 중 ○ '21. 3. : 용화, 매곡면 공사 착공 ○ '21. 10. : 용화면 공사 진행 중(50%) ○ '21. 12. : 용화면 공사 진행 중(90%)</p>									
6-8	<p>창조적마을만들기 사업추진(학산면 압치리, 철동리 및 심천면 고당리) (완료)</p>	<p>○ 위치 : 영동군 학산면 압치리, 철동리 및 심천면 고당1리 ○ 사업기간 : 2017~2020년 ○ 사업규모 : 3개 마을 ○ 사업비 : 1,473백만원 (국비 1,031, 도비 6, 군비 436) ○ 내용 - 학산면 압치리: 공동생활홈, 마을회관 리모델링, 주민역량강화 등 - 학산면 철동리: 자연생태복원, 가로경관조성, 주민역량강화 등 - 심천면 고당1리 : 수생태경관조성, 가로경관조성, 주민역량강화 등</p>	<p>○'19.6. :심천면 고당리 시설공사 착공 ○'19.7. :학산면 압치기 공공디자인 심의 ○'19.9. :학산면 철동리 시설공사 착공 ○'19.10. 학산면 압치리 기본계획 및 시행계획(안) 승인(예정) ○19.12: 학산면 압치리 기본 및 시행계획 수립 ○19.12: 철동리 준공 및 준공검사 완료 ○19.12: 고당1리 준공완료 ○19.12: 철동리 준공완료 ○20.01: 압치리 건축공사 착공 ○20.09: 압치리 공사 진행중 ○20.12: 압치리 준공 및 준공검사 완료</p>									
6-9	<p>황간 큰썩골 소하천 정비사업 (정상추진)</p>	<p>○ 사업위치 : 영동군 황간면 용암리 88-4 번지 일원 ○ 사업기간 : 2019 ~ 2021 ○ 사업내용 : 소하천 정비 L=2.5km ○ 사업비 : 3,227백만원(지방이양) (국비 186, 지방비 3,041)</p>	<p>○'18.01. : 2019년 소하천 정비사업 수요조사 내역서 및 관리카드 제출 ○'18.10. : 2019년도 소하천정비 사업비 확정에 따른 사업계획서 제출 ○'19.03. : 실시설계용역 착수 ○'19.05. : 주민설명회 개최</p>									

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진상황															
		<p>공약내용 변경(20.12.14.)</p> <table border="1" data-bbox="539 315 938 450"> <thead> <tr> <th>변경사항</th> <th>당 초</th> <th>변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사 업 비</td> <td>3,000백만원</td> <td>3,227백만원</td> </tr> <tr> <td>사 업 량</td> <td>L=2.5km</td> <td>L=1.26km, 압거BOX 11개소</td> </tr> </tbody> </table> <p>(사유) 사전설계검토 심의결과 반영으로 사업량 및 사업비 변경</p>	변경사항	당 초	변 경	사 업 비	3,000백만원	3,227백만원	사 업 량	L=2.5km	L=1.26km, 압거BOX 11개소	<ul style="list-style-type: none"> ○ '19.06. : 지반조사용역 착수 ○ '19.09 : 소규모환경영향평가용역 착수 ○ '19.12 : 사전설계검토심의 ○ '20.03 : 사전설계 조치계획서 제출 ○ '20.04 : 일상감사, 계약심사 추진 ○ '20.05. : 실시설계용역 준공 ○ '20.05. : 편입토지 등 감정평가 실시 ○ '20.06. : 큰썩골소하천 정비사업(전체분, 1차분) 집행(계약의뢰) ○ '20.07. : 보상금 지급결정 및 협의 ○ '20.07. : 큰썩골소하천 정비사업(전체분, 1차분) /폐기물처리용역 착공 ○ '20.08. : 1차분 선급금 신청 및 지급 ○ '20.11. : 비도로관리청 도로공사시행 허가 변경고시 ○ '20.12. : 1차분(1회) 기성신청 및 지급 ○ '21.02. : 비도로관리청 도로공사(지방도 901호선) 착수신고서 제출 ○ '21.06. : 지방도 901호선 수로BOX 설치 및 도로 개통 완료 ○ '21.09. : 1차분 준공 및 2차분 착공 						
변경사항	당 초	변 경																
사 업 비	3,000백만원	3,227백만원																
사 업 량	L=2.5km	L=1.26km, 압거BOX 11개소																
6-10	<p>자연재해위험지구 정비사업 추진 (정상추진)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 황간면,상촌면,양양면,영동읍 일원 ○ 기간 : 2016~2022 ○ 사업규모 <ul style="list-style-type: none"> - 하천정비 L=4.79m, 배수펌프시설 및 증설, 우수관거 정비 ○ 사업비 : 63,520백만원 (국비 31,760 도비 9,528 군비 22,232) ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> -마산지구 호안정비 L=3.79km, 교량3개소, 보개량 1개소, 우수관거개량 L=1.07km -계산2지구 배수펌프시설 증설, 우수관거정비 L=1.2km -둔전2지구 축제 및 호안정비 L=0.6km, 교량 3개소 -두평지구 배수펌프시설, 소하천정비 L=0.4km <p>공약내용 변경(19.11.27.)</p> <table border="1" data-bbox="539 1653 938 1720"> <thead> <tr> <th>변경사항</th> <th>당 초</th> <th>변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사 업 비</td> <td>53,546백만원</td> <td>56,540백만원</td> </tr> </tbody> </table> <p>(사유) 충청북도 사전설계 심의 의견 반영 총사업비 증액 (계산2지구)</p> <p>공약내용 변경(20.12.14.)</p> <table border="1" data-bbox="539 1843 938 1933"> <thead> <tr> <th>변경사항</th> <th>당 초</th> <th>변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사 업 비</td> <td>56,540백만원</td> <td>63,520백만원</td> </tr> <tr> <td>사 업 량</td> <td>L=3.78km</td> <td>L=4.79km</td> </tr> </tbody> </table> <p>(사유) 마산지구 하천기본계획 및 주민 건의사항 반영으로 사업량, 사업비 변경</p>	변경사항	당 초	변 경	사 업 비	53,546백만원	56,540백만원	변경사항	당 초	변 경	사 업 비	56,540백만원	63,520백만원	사 업 량	L=3.78km	L=4.79km	<ul style="list-style-type: none"> ○ '19.05 : 마산재해위험개선지구 2차분 준공 ○ '19.12 : 계산2 자연재해위험지구 정비사업 1차분 착공 ○ '20.04 : 마산재해위험개선지구 3차분 준공 ○ '20.05 : 마산재해위험개선지구 4차분 착공 ○ '20.06 : 계산2 자연재해위험지구 정비사업 전체사업 발주 ○ '20.06. : 둔전2 자연재해위험지구 정비사업 사전설계심의 ○ '20.09. : 두평 자연재해위험지구 정비사업 사전설계심의 완료 ○ '21.01. : 둔전2 자연재해위험지구 정비사업 사전설계심의 완료 ○ '21.02. : 두평,둔전2 소규모환경영향평가용역 완료 ○ '21.03. : 마산 자연재해위험지구 4차분 준공 및 5차분 착공 ○ '21.09. : 두평 1차분 착공 ○ '21.10. : 둔전2 1차분 착공
변경사항	당 초	변 경																
사 업 비	53,546백만원	56,540백만원																
변경사항	당 초	변 경																
사 업 비	56,540백만원	63,520백만원																
사 업 량	L=3.78km	L=4.79km																

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진상황									
		<p>공약내용 변경(21.12.13)</p> <table border="1" data-bbox="534 309 933 403"> <tr> <td>변경사항</td> <td>당 초</td> <td>변 경</td> </tr> <tr> <td>사 업 비</td> <td>63,520백만원</td> <td>64,152백만원</td> </tr> <tr> <td>사업기간</td> <td>2019~2021</td> <td>2019~2022</td> </tr> </table> <p>(사유) 두평, 둔전2지구 충북도 사전설계 심의 내용 반영</p>	변경사항	당 초	변 경	사 업 비	63,520백만원	64,152백만원	사업기간	2019~2021	2019~2022	
변경사항	당 초	변 경										
사 업 비	63,520백만원	64,152백만원										
사업기간	2019~2021	2019~2022										
6-11	<p>영동천,용화천 지방하천 정비사업 조기 착공 (임기후)(임기중97%) [정상추진]</p>	<p>○ 위치 -영동천 : 영동읍 부용리~양강면 산막리 -용화천 : 용화면 용화리~월전리</p> <p>○ 기간 -영동천 : 2017년~2022년 -용화천 : 2019년~2023년</p> <p>○ 사업규모 -하천정비 L=20.4km</p> <p>○ 사업비 : 74,184백만원 (국비 33,135, 도비 33,135 군비 7,914)</p> <p>○ 주요내용 -영동천 제방보강 L=7.89km, 저수호안 L=1.66km, 교량 7개소, 보 및 낙차공 13개소 개량, 배수시설물 25개소 등</p> <p>-용화천 제방축제 L=5.3km,보축 L=1.1km, 고 수호안 3개소, 교량 12개소 및 낙차 공 9개소 등</p>	<p>-영동천</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '17.06. : 실시설계 용역 착수 ○ '18.03. : 주민설명회(1차) ○ '18.06. : 주민설명회(2차) ○ '19.02. : 1차분 착공 ○ '19.12. : 1차분 준공 ○ '20.02. : 2차분 착공 ○ '20.12. : 2차분 준공 ○ '21.02. : 3차분 착공 <p>-용화천</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '19.03. : 실시설계 PQ심사 ○ '19.04. : 실시설계 착수 ○ '19.10. : 주민설명회 									
6-12	<p>지방하천(시향천) 정비사업 추진 (임기후)(임기중7%) [정상추진]</p>	<p>○ 위치 : 학산면 범화리~도덕리</p> <p>○ 기간 : 2022년~2026년</p> <p>○ 사업규모 : 하천정비 L=3.0km</p> <p>○ 사업비 : 10,500백만원 (국비 5,250 도비 5,250)</p> <p>○ 주요내용 : 축제 및 호안정비 L=3.0km, 교량 5개소, 낙차공 4개소 등</p>	<p>○ 지방하천 정비 중기계획 우선순위 및 신규사업으로 지방하천(시향천) 정비 사업 선정 지속 건의 중</p>									
6-13	<p>마을 안전용 CCTV 확대 설치 [완료]</p>	<p>○ 농촌마을의 범죄예방 대책의 일 환으로 CCTV 설치</p> <p>○ 기 간 : 2019. 1. ~ 12.</p> <p>○ 대 상 : 황간면</p> <p>○ 사업비 : 258백만원(군비)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ '19년 사업예산 확보 : 18.12. 현재 ○ '19.04. : 황간면 일원 사업대상지 선정을 위한 CCTV 신규수요 설치 대수 조사 ○ '19.07. : 사업설계 및 발주 ○ '19.10. : 준공완료 									
6-14	<p>철길주변 햇살기둥 다담길 정비사업 [완료]</p>	<p>○ 사업위치 : 영동읍 계산리 일원 (중앙지구대 ~ 소화의원)</p> <p>○ 총사업비 : 3,145백만원 (국비 1,435, 군비 1,710)</p> <p>○ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년(4년)</p> <p>○ 사업내용 - 옹벽 및 도로 등 기반시설 정비(4,959㎡) - 다담길(보행로) 정비(L=575m, B=1.5m)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018. 10. 30. : 철도시설공단 업무협의 ○ 2018. 11. 26. : 지역개발사업 시행자 지정 ○ 2018. 12. 05. : 사업장 현지 점검 (철도공사, 철도시설공단) ○ 2018. 12. 20. : 주민설명회, 의견수렴 ○ 2019. 01. 20. : 실시설계 완료 ○ 2019. 01. 30. : 공사 일상감사 완료 ○ 2019. 03. 07. : 공사 계약심사 완료(충북도) ○ 2019. 03. 21. : 포장마차 보상결정 및 공사 집행 ○ 2019. 04. 11. : 공사 착공 									

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진상황						
		<p>공약내용 변경(20.12.14.)</p> <table border="1" data-bbox="539 309 938 376"> <tr> <td>변경사항</td> <td>당 초</td> <td>변 경</td> </tr> <tr> <td>사업기간</td> <td>2018.~2020.</td> <td>2018.~2021.</td> </tr> </table> <p>(사유) 전선지중화사업과 과업구간 중첩으로 인해 공사정지하여 사업기간 변경</p>	변경사항	당 초	변 경	사업기간	2018.~2020.	2018.~2021.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 05. 28. : 철도보호지구 행위신고 협의 완료 ○ 2019. 07. 12. : 공사정지(전선지중화 사업 연계 지장전주 이설) ○ 2019. 12. 20. : 철도시설공단 통신맨홀 (광케이블) 이설 협의 진행 ○ 2020. 03. 05. : 철도시설공단 통신맨홀 (광케이블) 이설 위수탁 협의 ○ 2020. 03. 30. : 일시정지 해지 및 1차분 재착공 ○ 2020. 6. 25. : 1차분 준공 및 2차분 착공 ○ 2020. 7. 31. ~ 11. 26. : 전기공사 착공 및 준공 ○ 2020. 8. 24. : 지역개발사업구역 지정(변경) 및 실시계획용역 착공 ○ 2020. 11. 20. : 지역개발사업구역 변경 고시 ○ 2020. 12. 16. : 2차분 기성 ○ 2020. 12. 24. : 햇살가득 다담길 돌레길 조성사업 실시계획용역 착공 ○ 2021. 02. 23. : 지역개발사업구역 지정(변경) 및 실시계획용역 준공 ○ 2021. 03. 23. : 햇살가득 다담길 돌레길 조성사업 실시계획용역 준공 ○ 2021. 12. 29. : 2차분 기성(2회)
변경사항	당 초	변 경							
사업기간	2018.~2020.	2018.~2021.							
6-15	<p>경부선 영동가도교 확장사업 [정상추진]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업위치 : 영동읍 계산리 56-3 (영동가도교) ○ 총사업비 : 11,000백만원 (국비 4,000, 군비 7,000) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> -가도교 확장 L=20m, B=20.0m -접속도로 정비 L=180m, B=20.0m -가도교 배수펌프시설 설치 1개소 <p>공약내용 변경(20.12.14.)</p> <table border="1" data-bbox="539 1485 938 1552"> <tr> <td>변경사항</td> <td>당 초</td> <td>변 경</td> </tr> <tr> <td>사업기간</td> <td>2018.~2020.</td> <td>2018.~2022.</td> </tr> </table> <p>(사유) 국비지원 지연에 따른 사업기간 변경</p>	변경사항	당 초	변 경	사업기간	2018.~2020.	2018.~2022.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018. 10. 30. : 철도시설공단 업무협의 ○ 2018. 11. 26. : 지역개발사업 시행자 지정 ○ 2018. 12. 05. : 사업장 현지 점검 (철도공사, 철도시설공단) ○ 2018. 12. 11. : 편입물건 보상협의(1차) ○ 2019. 03. 14. : 실시계획 반영 사항 협의(한국철도시설공단) ○ 2019. 05. 16. : 주민설명회 개최 및 의견 수렴 (철도시설공단) ○ 2019. 10. : 실시계획 완료(철도시설공단) ○ 2019. 12. : 한국철도시설공단 업무협약 ○ 2020. 02. : 사업 시행자 지정 및 실시 계획인가 고시 ○ 2020. 06. : 사업 시공자 및 감리 선정 ○ 2020. 07. : 지장선로 이설관련 회의 ○ 2020. 11. : 지역개발계획 및 지역개발 사업구역 변경 고시(기간연장) ○ 2021. 04. : 지역개발사업구역 및 지형 도면 변경 고시(면적변경)
변경사항	당 초	변 경							
사업기간	2018.~2020.	2018.~2022.							
6-16	<p>도시재생(뉴딜)사업 적극 추진 (임기후)임기중80% [정상추진]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2020년~2023년(4년) ○ 공모신청 : 영동읍 1개소(141.56억), 황간면 1개소(90억) ○ 사업비 : 231.56억원 (국비 39%, 지방비 61%) ○ 주요사업 : 노후주택 및 상가 정비 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시재생전략계획 수립 : 2019. 05. 15. ○ 황간터미널부지 매입 추진 : 2020. 01. ~ 03.(보상비 지급) ○ 인정사업 선정 : 2020. 09.(영동읍) ○ 우동살 선정 : 2020. 10.(황간면) ○ 사전검토 완료 : 2021. 06.(영동읍) 						

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진상황									
		사업, 공동이용 및 생활편의시설 등 공급, 일자리창출, 지역문화 활성화, 골목경제 활성화, 지역공동체 활성화 공약내용 변경(20.12.14.) <table border="1" data-bbox="534 414 933 504"> <tr> <td>변경사항</td> <td>당 초</td> <td>변 경</td> </tr> <tr> <td>위 치</td> <td>계산1리 일원</td> <td>계산1 557-2 일원</td> </tr> <tr> <td>사 업 비</td> <td>23,400백만원</td> <td>23,156백만원</td> </tr> </table> (사유) 사업유형 변경(인정사업) 신청하여 공모사업에 선정	변경사항	당 초	변 경	위 치	계산1리 일원	계산1 557-2 일원	사 업 비	23,400백만원	23,156백만원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소규모재생사업(착공) : 2021. 06.(황간면) ○ 구터미널 철거 공사 설계용역 완료: 2021. 09 ○ 구터미널 철거 공사 중 : 2021. 11 ~ 2022. 1 ○ 인정사업 설계 : 2021. 11 ~ 2022. 7
변경사항	당 초	변 경										
위 치	계산1리 일원	계산1 557-2 일원										
사 업 비	23,400백만원	23,156백만원										
6-17	새뜰마을 조기 완공 [완료]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2016년 ~ 2020년(5년) ○ 위치 : 영동읍 부용리 일원 ○ 사업비 : 2,416백만원 (균특 1,690, 도비 218, 군비 508) ○ 내용 - 기초생활 인프라사업 : 방재/위생, 생활환경, 주민공동 - 집수리 사업, 휴먼케어사업, 주민 역량사업 공약내용 변경(20.12.14.) <table border="1" data-bbox="534 940 933 1008"> <tr> <td>변경사항</td> <td>당 초</td> <td>변 경</td> </tr> <tr> <td>사업기간</td> <td>2016.~2019.</td> <td>2016.~2020.</td> </tr> </table> (사유) 사회적협동조합 인가에 따른 사업기간 변경	변경사항	당 초	변 경	사업기간	2016.~2019.	2016.~2020.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 거점공간 완공 : 2019. 11. ○ 공동작업장 완공 : 2019. 11. ○ 주민역량강화 교육 : 수시 - 분야 : 미술, 다도, 목공, 손뜨개인형 ○ 거점공간 내부 인테리어 완료, 사회적협동조합 인가 : 2020. 08. ○ 거점공간 주변 공사 완료 : 2020. 09. ○ 담백사회적협동조합 거점공간 운영 : 2020. 10. 20.~ 			
변경사항	당 초	변 경										
사업기간	2016.~2019.	2016.~2020.										
6-18	영동산업단지 주변마을 지방상수도공급 [정상추진]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2018년 ~ 2022년 ○ 위치 : 용산면 금곡리 외 ○ 내용 : 수원고갈, 수질불량 등으로 식수공급에 어려움이 있는 지역에 지방상수도 공급 ○ 사업비 : 11,780백만원 공약내용 변경(21.12.13.) <table border="1" data-bbox="534 1344 933 1411"> <tr> <td>변경사항</td> <td>당 초</td> <td>변 경</td> </tr> <tr> <td>사업기간</td> <td>2018.~2021.</td> <td>2018.~2022.</td> </tr> </table> (사유) 2022년 예산확보에 따른 사업기간 변경	변경사항	당 초	변 경	사업기간	2018.~2021.	2018.~2022.	<ul style="list-style-type: none"> ○'18.10. : 기본 및 실시설계용역 집행 ○'18.12. : 기본 및 실시설계용역 착수 ○'19.03. : 주민설명회개최(면사무소) ○'20.02. : 관련기관 협의 완료 ○'20.03. : 일일감사 및 계약심사 완료 ○'20.04. : 공사 및 감리용역 집행 ○'20.06. : 전체분, 1차분 공사 착공 ○'21.03. : 2차분 공사 착공 ○'21.08. : 1차분 공사 준공 			
변경사항	당 초	변 경										
사업기간	2018.~2021.	2018.~2022.										
6-19	심천면 구탄, 장동리 지방상수도 공급 [완료]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2019년 ~ 2021년 ○ 위치 : 심천면 장동리, 구탄리 ○ 내용 : 수원고갈, 수질불량 등으로 식수공급에 어려움이 있는 지역에 지방상수도 공급 ○ 사업비 : 1,412백만원 	<ul style="list-style-type: none"> ○'19.01. : 기본 및 실시설계용역 집행 ○'19.03. : 기본 및 실시설계용역 완료 ○'19.09. : 공사 집행 ○'19.10. : 공사 착공 ○'21.06. : 공사 준공 									
6-20	황산리 일원 지방상수도 공급 [완료]	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2020년 ~ 2021년 ○ 위치 : 학산면 황산리(죽촌,모정등) ○ 내용 : 수원고갈, 수질불량 등으로 식수공급에 어려움이 있는 지역에 지방상수도 공급 ○ 사업비 : 1,500백만원 	<ul style="list-style-type: none"> ○'20.02. : 기본 및 실시설계용역 착수 ○'20.04. : 설계용역 준공 및 공사 집행 ○'20.05. : 공사 착공 ○'21.06. : 공사 준공 									

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황												
		<p>공약내용 변경(20.12.14.)</p> <table border="1" data-bbox="534 309 933 398"> <tr> <td>변경사항</td> <td>당 초</td> <td>변 경</td> </tr> <tr> <td>사업비</td> <td>2,561백만원</td> <td>1,500백만원</td> </tr> <tr> <td>사업기간</td> <td>2020.~2022.</td> <td>2020.~2021.</td> </tr> </table> <p>(사유) 하수관로 정비사업과 병행추진 및 실시설계로 사업비 감소</p>	변경사항	당 초	변 경	사업비	2,561백만원	1,500백만원	사업기간	2020.~2022.	2020.~2021.				
변경사항	당 초	변 경													
사업비	2,561백만원	1,500백만원													
사업기간	2020.~2022.	2020.~2021.													
7-1	<p>그라운드 골프장, 정구장등 스포츠시설 현대화 추진 [완료]</p>	<p>○ 기간 : 2019 ~ 2022년 ○ 위치 : 영동읍 계산리 745번지 일원 ○ 내용 -그라운드골프장 막구조 돔 설치, -정구장 코트관리용 스프링클러 설치 ○ 사업비 : 2,200백만원 (국비660, 도비770, 군비770)</p>	<p>○ 18.10 사업비 확보 가내시 통보 ○ 19.02 공유재산 및 지방재정 투자심의 완료 ○ 19.03 제1회 추경예산편성(그라운드골프) ○ 19.05 실시설계용역 착수(그라운드골프) ○ 19.06 착공 (군민정구장) ○ 19.09 준공 (군민정구장) ○ 19.09 실시설계용역 준공(그라운드골프) ○ 19.09 공공디자인심의(그라운드골프) ○ 19.10 실시계획인가변경(그라운드골프) ○ 19.12 공사계약 추진(그라운드골프) ○ 20.03 공사착공(그라운드골프) ○ 20.09 건축공정 제1회차 기성 완료(그라운드골프) ○ 20.10 공사준공(그라운드골프)</p>												
7-2	<p>영동체육공원 조성사업 조기착공 [정상추진]</p>	<p>○ 기간 : 2018. ~ 2022년 ○ 위치 : 영동읍 매천리 125-2번지 일원 ○ 내용 : 실내배드민턴장, 축구장, 풋살장, 다목적구장 등 설치 ○ 사업비 : 19,800백만원 (국비3,870 도비4,515 군비11,415)</p> <p>공약내용 변경(21.12.13.)</p> <table border="1" data-bbox="534 1317 933 1438"> <tr> <td>변경사항</td> <td>당 초</td> <td>변 경</td> </tr> <tr> <td>사업비</td> <td>19,800백만원</td> <td>35,600백만원</td> </tr> <tr> <td>사업기간</td> <td>2018.~2022.</td> <td>2018.~2023.</td> </tr> <tr> <td>사업규모</td> <td>2,100㎡</td> <td>3,520㎡</td> </tr> </table> <p>(사유) 사업규모 증가에 따른 사업비 변경 및 행정절차 이행을 위한 사업기간 변경</p>	변경사항	당 초	변 경	사업비	19,800백만원	35,600백만원	사업기간	2018.~2022.	2018.~2023.	사업규모	2,100㎡	3,520㎡	<p>○ 18.05. 편입토지 및 지장물 보상 ○ 18.10. 체육진흥시설 지원 사업비 확보 ○ 19.07. 기본 및 실시설계 착수 ○ 19.07. 감정 재평가(2차) ○ 19.09. 기본 및 실시설계 착수보고회 개최 ○ 19.12. 기본설계 계획(안) 주민설명회 개최 ○ 19.12. 편입토지 및 지장물 보상(80%) ○ 20.02. 중간보고회 개최 ○ 20.03. 선진지견학(거창, 진주) ○ 20.04. 토론회 개최(의견수렴) ○ 20.08. 충청북도 경관심의 완료 ○ 20.09. 설계VE(설계경제성검토)완료 ○ 20.10. 편입토지 등 보상 중(90%) ○ 20.11. 재해영향평가 및 소규모환경평가협의 완료 ○ 20.12. 충청북도 건설기술심의 완료 및 실시계획인가 협의 중 ○ 21.02. 기본 및 실시설계용역 최종보고회 개최 ○ 21.03. 지방재정(중앙) 투자심사 심의(2단계심사 ⇒ 재검토) ○ 21.03.~06. 체육공원 조성 타당성조사(자체)용역 착수 / 완료 ○ 21.06. 실시계획인가(사업인정고시) 및 실시설계용역 완료 ○ 21.06. 지방재정(중앙)투자심사 심의 의뢰(2단계심사 재상정) ○ 21.08. 지방재정(중앙) 투자심사</p>
변경사항	당 초	변 경													
사업비	19,800백만원	35,600백만원													
사업기간	2018.~2022.	2018.~2023.													
사업규모	2,100㎡	3,520㎡													

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황									
			<p>조건부 승인(2단계심사 이행)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○21.08. 토목/조경공사, 건설사업관리용역, 건설폐기물처리용역 일상감사 및 계약심의위원회 심의 완료 ○21.09. 건설폐기물처리용역 충청북도 계약심사 완료 ○21.09. 토목/조경공사, 건설사업관리용역 조달청 원가심사 등 계약 의뢰 ○21.10. 건설폐기물 및 입목폐기물 처리용역 계약 의뢰 ○21.11. 편입토지(국유지) 매입 (보상율 99%) ○21.12. 충청북도 지방토지수용 위원회 수용재결신청(미등기토지 3필지) ○21.12. 건설사업관리용역 착수 ○22.01.(예정) 토목/조경공사 및 폐기물 처리용역 착공 									
7-3	<p>각종생활체육시설 태양광 설치 및 경관 조성 추진 (정상추진)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2019 ~ 2021 ○ 위치 : 영동체육공원, 군민탁구장, 궁도장(영무정) ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 태양광발전 설비 100kW - 경관조명 및 체육시설 간판 설치 각 1식 ○ 사업비 : 500백만원 (국비90, 도비105, 군비305) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>공약내용 변경(21.12.13.)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="font-size: small;">변경사항</th> <th style="font-size: small;">당 초</th> <th style="font-size: small;">변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="font-size: small;">사업비</td> <td style="font-size: small;">500백만원</td> <td style="font-size: small;">110백만원</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">사업기간</td> <td style="font-size: small;">2019.~2022.</td> <td style="font-size: small;">2019.~2023.</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">(사유) 영동체육공원 조성사업 편입 분 사업비 감액</p> </div>	변경사항	당 초	변 경	사업비	500백만원	110백만원	사업기간	2019.~2022.	2019.~2023.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 18.10. 체육진흥시설 지원 사업비 확보 ○ 19.01. 군민탁구장 태양광설치사업 완료 ○ 19.05. 궁도장 태양광 발전 설치 완료 ○ 19.06. 군민탁구장 경관간판 설치 완료 ○ 19.07. 영동체육공원 기본 및 실시설계 착수 - 기본 및 실시설계(2021. 2.완료) ○ 20.08. 충청북도 경관심의 완료 ○ 20.11. ~ 21.03. 건축물에너지효율등급 및 제로에너지건축물 예비인증취득 ○ 21.06. : 실시계획인가(사업인정고시) 및실 시설계용역 완료 ○ 21.06. 지방재정(중앙) 투자심사 심의 의뢰(2 단계심사 재상정) ○ 21.08. 지방재정(중앙) 투자심사 조건부 승인(2 단계심사 이행) ○ 21.09. 토목/조경공사, 건설사업관리용역 조달청 원가심사 등 계약 의뢰 ○ 21.12. 건설사업관리용역 착수 ○ 22.01.(예정) 토목/조경공사 및 폐기물 처리용역 착공
변경사항	당 초	변 경										
사업비	500백만원	110백만원										
사업기간	2019.~2022.	2019.~2023.										
8-1	<p>자원봉사센터 빨래방차증차운영 (이행후 계속추진)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2018. ~ 2022. ○ 사업규모 <ul style="list-style-type: none"> - 이동빨래차 2대 / 연 250회 운영 ○ 사업비 : 427백만원(군비 427) ○ 대형 빨래를 힘들어하는 노인을 대상으로 11개 읍·면을 순회하며 실시하는 이동빨래 서비스 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기존 이동빨래차 노후화된 세탁기 4대 교체완료 ○ 2019년 이동빨래차 운영 : 141회 ○ 차량운영 인력 추가 채용 : 1명 ○ 이동빨래차 추가 구입 및 차량등록 : 2020. 5. 15 ○ 2020년 이동빨래차 운영 : 164회 ○ 2021년 이동빨래차 운영 : 354회 									
8-2	<p>대중목욕탕, 사우나 등 군민편의시설 확충 (완료)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위치 : 황간, 추풍령, 매곡, 용화면 일원 ○ 사업기간 : 2019. ~ 2020. ○ 사업규모 : 1개소(개소당 104㎡) ○ 사업비 : 300백만원(군비100%) ○ 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> - 1개소 추진 : 목욕탕, 찜질방 파우더룸 등 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019년 본예산 200백만원 확보 ○ 건축허가 사전협의 : 2019. 02. 14. ○ 기본 및 실시설계 발주 : 2019. 02. 21. ○ 분할착량 : 2019. 03. 22. ○ 2019년 2회추경 100백만원 추가 확보 									

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황												
		<p>(추풍령면)</p> <p>공약내용 변경(19.11.27.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>변경사항</th> <th>당 초</th> <th>변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사업비</td> <td>200백만원</td> <td>300백만원</td> </tr> <tr> <td>사업기간</td> <td>2018.~2020.</td> <td>2019.~2020.</td> </tr> </tbody> </table> <p>(사유) 목욕탕 동수 축소 (남녀,2동→격일제,1동) 기계실 추가 설치</p>	변경사항	당 초	변 경	사업비	200백만원	300백만원	사업기간	2018.~2020.	2019.~2020.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사착공 : 2019.11.18. ○ 공사준공 : 2020.02.11. ○ 시설내 TV 등 물품 구입 : 2020.12.28. ○ 목욕탕 관리 및 운영 조례 제정 : 2020.02.11. 			
변경사항	당 초	변 경													
사업비	200백만원	300백만원													
사업기간	2018.~2020.	2019.~2020.													
8-3	<p>어르신 보청기 지원 사업 (이행후 계속추진)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2019. ~ 2022. ○ 사업대상 : 만70세이상 기초연금 수급자 ○ 사업비 : 520백만원(군비100%) ○ 주요내용 <ul style="list-style-type: none"> - 선정기준 : 순음청력검사 청력역치가 한쪽 귀 40dB 이상 60dB미만, 다른 귀 40dB 이상 80dB 미만 - 급여수준 : 1인1측 지원, 실구입비 중 최대 1,179천원까지 지원 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019년 본예산 130백만원 확보 ○ 사회보장제도 신설에 따른 보건복지부 협의완료 : 2019. 5. 14. ○ 조례제정 추진 : 2019. 12. 31 공포 ○ 2019년 보청기지원 : 106명/125백만원 ○ 2020년 보청기지원 : 110명/130백만원 ○ 2021년 보청기지원 : 110명/130백만원 												
8-4	<p>장애인전용 건강지원센터 건립 (정상추진)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2019 ~ 2022년 ○ 내용 : 장애인전용 건강지원 센터 신축 ○ 사업비 : 3,480백만원(군비) <p>공약내용 변경(20.12.14.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>변경사항</th> <th>당 초</th> <th>변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사업규모</td> <td>660㎡</td> <td>1,000㎡</td> </tr> <tr> <td>사업비</td> <td>2,500백만원</td> <td>3,480백만원</td> </tr> <tr> <td>사업기간</td> <td>2019.~2021.</td> <td>2019.~2022.</td> </tr> </tbody> </table> <p>(사유) 건축면적 증가에 따른 사업비 및 사업기간 변경</p>	변경사항	당 초	변 경	사업규모	660㎡	1,000㎡	사업비	2,500백만원	3,480백만원	사업기간	2019.~2021.	2019.~2022.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복지시설 부지조성 작업 중 ○ 2020. 03. 공유재산심의회 심의 ○ 2020. 12. 기획설계용역 준공 ○ 2020. 12. 공공건축심의위원회 심의 ○ 2021.07 영동군농촌생활권활성화 계획농림부승인 ○ 2021. 09. 건강지원센터 기본 및 실시 설계 용역 착수 ○ 2021. 10. 건강지원센터 기본 및 실시 설계 용역 착수 보고회 ○ 2021. 12. 건강지원센터 기본 및 실시 설계 용역 중간 보고회
변경사항	당 초	변 경													
사업규모	660㎡	1,000㎡													
사업비	2,500백만원	3,480백만원													
사업기간	2019.~2021.	2019.~2022.													
8-5	<p>장애인전용차량증치로 중증장애인지원사업 확대추진 (이행후 계속추진)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2019 ~ 2022년 ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 리프트차량 1대 - 운영에 따른 인건비 및 운영비 ○ 사업비 : 200백만원(군비) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 차량구입 : 차량구입 완료 69,723천원 ○ 인건비 추가지원 : 40,000천원 												
8-6	<p>장애인 등록 검사비지원 (이행후 계속추진)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2019 ~ 2022년 ○ 내용 : 장애인등록 검사비 지원 ○ 사업비 : 30백만원(군비) <p>공약내용 변경(20.12.14.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>변경사항</th> <th>당 초</th> <th>변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사업비</td> <td>160백만원</td> <td>30백만원</td> </tr> </tbody> </table> <p>(사유) 사업대상자 감소하여 사업비 변경</p>	변경사항	당 초	변 경	사업비	160백만원	30백만원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조례제정 (19.12월) ○ 2020년 1회 추경예산 확보 (20,000천원) ○ 하반기 사업개시 ○ 2020년 3회 추경예산 변경 (10,000천원) ○ 공약사업 변경(예산변경) (160백만원→30백만원) ○ 2020년말 기준 3,075천원 집행 ○ 2021년말 9월기준 1,500천원 집행 						
변경사항	당 초	변 경													
사업비	160백만원	30백만원													
8-7	<p>여성안심환경조성사업 (이행후 계속추진)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2018. ~ 2022. ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 여성안심보안관 운영 - 몰래카메라 탐지장비 구입 및 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '18.11. : 몰래카메라 탐지장비 구입(13세트) ○ '18.12. : 화장실 안심스크린 설치(10개소 183면) 												

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황									
		<p>안심스크린 설치 - 무료 여성위생용품 자판기 설치 ○ 사업비 : 157백만원</p>	<p>○ '19.03. : 여성안심보안관 2명 채용 ○ '19.04. : 여성안심보안관 운영(~11월) ○ '19.06. ~ : 무료 여성위생용품 자판기 설치 및 운영(7개소) ○ '19.12. : 화장실 안심스크린 설치(10개소 170면) ○ '20.03. : 여성안심보안관 2명 채용 ○ '20.04. : 여성안심보안관 운영(~11월) ○ '20.05~ : 무료 여성위생용품 자판기 설치 및 운영(10개소) ○ '21.03~ : 무료 여성위생용품 자판기 설치 및 운영(3개소) ○ '21.03. : 여성안심보안관 2명 채용 ○ '21.04. : 여성안심보안관 운영(~11월)</p>									
8-8	<p>한부모가족 지원강화 [이행후 계속추진]</p>	<p>○ 기간 : 2019. ~ 2022. ○ 대상 : 한부모가족 지원법에 따른 지원대상 ○ 내용 : 안과검진비 및 안경구입비 (1인, 연1회100천원 이내) 사고, 질병등 검사비 및 의료비지원 (1인, 연1회 50~500천원 이내) ○ 사업비 : 80백만원(지방비80)</p> <p>공약내용 변경(21.12.13.)</p> <table border="1" data-bbox="534 1122 933 1189"> <thead> <tr> <th>변경사항</th> <th>당 초</th> <th>변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사업비</td> <td>80백만원</td> <td>20백만원</td> </tr> </tbody> </table> <p>(사유) 사업대상자 규모에 맞춰 사업비 변경</p>	변경사항	당 초	변 경	사업비	80백만원	20백만원	<p>○ '18.12. : 세부사업계획 검토 ○ '19.02. : 의료비지원계획 수립 ○ '19.03. ~ : 대상자 신청접수 및 지원(30명, 4,6백만원) ○ '20.03. ~ : 대상자 신청접수 및 지원(29명, 3,5백만원) ○ '21.09. ~ : 제2회 추경예산 2백만원 확보 ○ '21.10. ~ : 대상자 신청접수 및 지원(47명, .7백만원)</p>			
변경사항	당 초	변 경										
사업비	80백만원	20백만원										
8-9	<p>산단형 행복주택 200호 조기공급 [완료]</p>	<p>○ 위 치 : 용산면 구촌리 170-1 일원 ○ 사업기간 : 2017.12.~2021.07. ○ 사업규모 : 200호 ○ 사 업 비 : 21,560백만원 ○ 시 행 자 : LH공사</p> <p>공약내용 변경(20.12.14.)</p> <table border="1" data-bbox="534 1491 933 1648"> <thead> <tr> <th>변경사항</th> <th>당 초</th> <th>변 경</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>사업기간</td> <td>2017.~2020.</td> <td>2017.~2021.</td> </tr> <tr> <td>사업규모</td> <td>200호(2동/ 16㎡:22호, 26㎡:93호, 36㎡:85호)</td> <td>200호(2동/ 16㎡:22호, 26㎡:96호, 36㎡:82호)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(사유) 추가공사로 인한 사업기간 변경과 설계개선으로 단위세대 면적 조정</p>	변경사항	당 초	변 경	사업기간	2017.~2020.	2017.~2021.	사업규모	200호(2동/ 16㎡:22호, 26㎡:93호, 36㎡:85호)	200호(2동/ 16㎡:22호, 26㎡:96호, 36㎡:82호)	<p>○ 2018.12. 공사 발주 ○ 2019.05. 시공사 선정 ○ 2019.07. 공사 착공 ○ 2020.09. 입주자 모집 공고 ○ 2020.10. 청약 접수 ○ 2020.11. 서류 접수 ○ 2020.12. 공정률 67% ○ 2021. 2. 행복주택 입주 계약(44호) ○ 2021. 3. 공정률 80% ○ 2021. 6. 행복주택 추가모집 공고 ○ 2021. 7. 공정률 100%</p>
변경사항	당 초	변 경										
사업기간	2017.~2020.	2017.~2021.										
사업규모	200호(2동/ 16㎡:22호, 26㎡:93호, 36㎡:85호)	200호(2동/ 16㎡:22호, 26㎡:96호, 36㎡:82호)										
8-10	<p>청년, 노인, 여성 취업지원센터 설치 [이행후 계속추진]</p>	<p>○ 기간 : 2019 ~ ○ 내용 : 영동군 일자리센터, 대한노인회, 여성새로일하기 센터의 독립성을 유지하는 대신 유관기관 간 주기적 정보 공유 및 적극적 협업 ○ 사업비 : 1,934백만원</p>	<p>○ '19. 4 : 상반기 여성새로일하기 센터 운영위원회 참석 ○ '19. 4 : 자활고용분과회의 참석 ○ '19.11 : 취업박람회 개최 ○ '19.12 : 하반기 여성새로일하기 센터 운영위원회 참석 ○ '20. 2 : 자활고용분과 회의 참석 ○ '20. 12 : 정기 구인구직실적 공유 ○ '21. 2 : 자활고용분과 회의 참석</p>									

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
		(국 1,514, 군 420)	<ul style="list-style-type: none"> ○ '21. 6 : 자활고용분과 회의 참석 ○ '21. 7 : 자활고용분과 컨설팅 개최 ○ '21.12. 21. : 자활고용분과 사업평가회
8-11	<p style="text-align: center;">오지마을 100원 무지개택시 주6일 확대운영 (이행후 계속추진)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2018 ~ 2022년 ○ 대상 : 23개 마을(농어촌버스 미운행 마을) ○ 내용 <ul style="list-style-type: none"> - 주6일(1일 3회) - 해당마을에서 관할 읍면소재지 또는 최단거리 읍면 소재지 재래시장 까지 운행 ○ 사업비 : 981백만원 (국비 250 / 도비 285 / 군비 446) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '18.11. : 조례 개정 ○ '19.02. : 확대 운행
8-12	<p style="text-align: center;">영동병원 내 안과 신설 (완료)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 의료법인 조운의료재단 영동병원 ○ 사업기간 : 2018년 ~ 2019년 ○ 사업규모 : 안과 1개과 ○ 사 업 비 : 2,648백만원 (병원자체재원) ○ 주요내용 : 영동병원 내 안과 신설 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018. 12월 : 시설 및 장비 확충 완료 ○ 2018. 12월 : 안과전문의 채용 ○ 2019. 2월 : 안과 운영
8-13	<p style="text-align: center;">치매안심센터 확대 운영으로 건강한 노후보장 (이행후 계속추진)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2018 ~ 2022년 ○ 내용 : 치매안심센터 설치 치매안심센터 운영 ○ 사업비 : 3,384백만원 (국비 2431, 도비 120, 군비 833) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '18. 01 ~ 현재 : 치매안심센터 운영 ○ '18. 06. : 센터 공사 착공 ○ '18. 11. : 센터 공사 완료 ○ '18. 12. : 인테리어 공사 ○ '19. 03. : 센터 개소식 및 지속운영 ○ '21. 12. : 코로나 19와 관련하여 치매안심센터 운영 일부사업 비대면 사업 전환추진 및 1:1 대면사업 추진
9-1	<p style="text-align: center;">지속적 규제개혁 · 발전저해요소 혁파 (이행후 계속추진)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2018 ~ 2022년 ○ 내용 : 불합리한 법령규제 정비 및 규제혁신 기반 추진역량 강화 ○ 사업비 : 비예산 	<ul style="list-style-type: none"> ○ '19. 2. : 규제혁신 추진계획 수립 ○ '19. 2. 28. : 규제개선 과제 보고회 개최 ○ '19. 5. 7. : 공직자 규제개혁 교육(92명 참석) ○ '19. 6. 10. : 2019년 제1차 규제개혁 위원회 개최 ○ '19. 7. 23. : 충북 규제개혁 우수 사례 경진대회 참가(장려상) ○ '19. 8. 20. : 영동군 적극행정 실행계획 수립 ○ 「찾아가는 규제신고센터」 : 총2회 (5개 기업체 방문) ○ 규제개혁 및 적극행정 우수공무원 포상 : 총13명 / 180만원 ○ 규제개혁 및 적극행정 교육 : 2회 추가 실시 (122명) ○ 2019 기업환경 우수지역 평가 결과 : 기업체감도 도내 3위 A등급(전국 30위) 경제활동친화성 도내 3위 S등급(전국 31위) ○ '20. 2. 26. : 규제 발굴 및 적극행정 우수사례 보고회 ○ '20. 3. 19. ~3. 20. : 2020년 제1차 규제개혁위원회 개최 ○ '20. 6. 17. ~6. 18. : 2020년 제2차

관리 번호	공약사업명	사업개요	추진상황
			<p style="text-align: center;">규제개혁위원회 개최</p> <ul style="list-style-type: none"> ○'20. 7. 17. : 충북 규제개혁 우수사례 경진대회 참가(장려상 수상) ○'20. 7. ~ 11. : 적극행정 사이버 교육 실시 (총 652명 이수) ○'20. 10. 23. / 10. 26. : 「찾아가는 규제 신고센터」 운영 ○'20. 11. 3. : 규제학과 과제 발굴 보고회 개최 ○'20. 11. 5. : 「영동군 규제개혁위원회 설치 등에 관한 조례」 제정 ○'21. 3. : 규제혁신 추진계획 수립 ○'21. 3. 22 : 규제개혁 과제 발굴 보고회 개최 ○'21. 5. 25. / 6. 18. : 「찾아가는 규제 신고센터」 운영 ○ 2021년 상반기 적극행정 우수공무원 포상 : 총6명 / 115만원 ○'21. 9. 13. : 규제개혁 과제 발굴 보고회 개최 ○'21. 10. 7. ~ 10. 8. : 2021년 제1차 규제개혁위원회 개최 ○'21. 10. 25./ 11. 5./ 11. 17. : 「찾아가는 규제 신고센터」 운영 ○ 2021년 하반기 적극행정 우수공무원 선발 : 총6명 / 340만 원
9-2	민·관 합동, 공직감찰 운영 (이행후계속추진)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 군민감사관 회의 <ul style="list-style-type: none"> - 상하반기 각1회 이상 ○ 군민감사관과의 현장대화 <ul style="list-style-type: none"> - 군민감사관 제보시 현지 출장 ○ 건설사업장 합동점검 <ul style="list-style-type: none"> - 상하반기 각1회 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 군민감사관 신규 위촉 : 2018.4.10. <ul style="list-style-type: none"> - 총 30명(신규 12명, 기존 18명) ○ 군민감사관 회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 상반기(1) : 3. 21 <ul style="list-style-type: none"> · 건의 13건 접수 - 2019년 상반기(2) : 6. 24 <ul style="list-style-type: none"> · 건의 9건 접수 - 2019년 하반기(1) : 9. 24 <ul style="list-style-type: none"> · 건의 8건 접수 - 2019년 하반기(2) : 12. 9 <ul style="list-style-type: none"> · 국회 견학 대체 ○ 군민감사관 현장대화 : 19.2.13 ○ 2019 건설사업장 점검 <ul style="list-style-type: none"> - 상반기 : 6. 17 ~ 6. 21 <ul style="list-style-type: none"> · 점검 17개소 / 지적 13건 - 하반기 : 11. 13 ~ 11. 27 <ul style="list-style-type: none"> · 점검 25개소 / 지적 13건 ○ 2020 건설사업장 합동점검 <ul style="list-style-type: none"> - 상반기 : 20. 5. 20. ~ 6. 12. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 점검 20개소 / 지적 8건 - 하반기 : 20. 11. 10. ~ 11. 24. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 점검 29개소 / 지적 11건 ○ 군민감사관 신규 및 재위촉 : 2020.4. <ul style="list-style-type: none"> - 총 30명(신규 1명, 재위촉 12명) ○ 군민감사관 회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 21년 1~3분기 : '코로나19' 사회적 거리두기 조치에 따른 미개최 ○ 군민감사관 현장대화 : 제보 시

관리번호	공약사업명	사업개요	추진상황
			<ul style="list-style-type: none"> - 1~3분기 제보 0건 ○ 군민감사관 재위촉 : 2021.8.1. <ul style="list-style-type: none"> - 총 30명(기존 12명, 재위촉 18명) ○ 2021 건설사업장 합동점검 <ul style="list-style-type: none"> - 상반기 : 21. 6. 9. ~ 6. 25. ⇒ 점검 31개소 / 지적 10건 - 하반기 : 11월 실시 예정
9-3	<p style="text-align: center;">공무원 성과중심 발탁 인사시스템 운영 [이행후 계속추진]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조직을 일과 성과 중심으로 전환하여 열심히 일하는 조직분위기 조성 ○ 남들이 하기 싫어하는 업무, 어려운 업무 등을 열심히 일하는 직원에 대한 인센티브 부여 ○ 근무성적, 근무태도 불량자, 품위 유지 위반자에 대한 페널티 강화 ○ 공정한 결정을 위한 심사위원회 구성 운영 ○ 활기찬 조직문화 조성을 위한 경쟁력 강화 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019년 인사운영계획 수립 (2018. 12. 26.) <ul style="list-style-type: none"> - 실적가점 및 페널티 기준 수립 ○ 2020년 인사운영계획 수립 (2019. 12. 30.) <ul style="list-style-type: none"> - 실적가점 및 페널티 기준 수립 ○ 2021년 인사운영계획 수립 (2020. 12. 30.) <ul style="list-style-type: none"> - 실적가점 및 페널티 기준 수립
9-4	<p style="text-align: center;">군민과의 소통 강화 확대 [이행후 계속추진]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 대상별 간담회를 통한 군정참여 및 공감대 형성 ○ 군정에 대한 지속적인 관심 제고 및 발전 방향 의견 수렴 ○ 상생 발전 방향 제시 및 애로사항 청취 및 검토결과 통보로 상호 소통 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018년 간담회 개최 횟수 : 8회 ○ 2019년 간담회 개최 횟수 : 10회 ○ 2020년 간담회 개최 횟수 : 코로나-19 확산방지에 따른 미개최 ○ 2020년 군정설명회 개최 횟수 : 52회
9-5	<p style="text-align: center;">원스톱 행정처리 확대 시행 [이행후 계속추진]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2018 ~ 2022년 ○ 내용 : 인허가 민원 처리시 민원인이 여러 부서를 일일이 방문하여 접수해야 하는 불편을 해소하기 위해 사전심사청구제 및 원스톱서비스 시행 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원스톱 행정처리 확대시행 업무 발굴 <ul style="list-style-type: none"> - 건물표시변경 등기촉탁 원스톱 서비스 - 지적공부정리 원스톱서비스 ○ 안심상속 원스톱서비스 재산조회 항목 2종 추가 <ul style="list-style-type: none"> - 건설근로자 퇴직공제금 가입여부 - 건축물 소유여부 ○ 행복출산 원스톱서비스를 통해 아동수당 신청 서비스 확대 ○ 민원안내도우미제 운영 지속 추진 ○ 「맘편한 임신」 원스톱 서비스 실시 (21. 4월 전국 시행)

끝.
