

2024년 민선8기 공약사업 추진상황



2024년 민선8기 공약사업 추진상황

< '24년 말 기준 >

1 총괄 ➡ **이행완료 41건**(완료 12건, 이행후계속추진 29건), 정상추진 19건

총 공약수	완료	이행 후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타	비고
60	12	29	19	-	-	-	-	-

※ 총 공약수 = 완료 + 이행 후 계속추진 + 정상추진 + 일부추진 + 보류 + 폐기 + 기타 공약 수

2 분야별 현황

분야별	핵심과제		공 약 이 행 상 황				비고
			완 료 (이행후 계속추진)	정상 추진	일부 추진	미착수	
5대분야	10개 핵심과제	60	41(29)	19	0	0	
앞서가는 미래농업	1. 미래농업 준비로 영동살림	5	3(1)	2			
	2. 쾌적한 농촌환경 조성	6	3(2)	3			
생동하는 지역경제	3. 선순환하는 영동경제 실현	7	5(3)	2			
	4. 영동의 심장! 두근두근 청년지원	2	-	2			
머무르는 힐링관광	5. 지속가능 영동을 위한 힐링관광 육성	10	5(1)	5			
감동주는 맞춤복지	6. 웃는 아이 행복한 영동	6	5(5)	1			
	7. 활기뽕뽕! 건강한 청소년 환경 조성	7	7(5)	-			
	8. 영동에서 누리는 노년의 즐거움	5	3(3)	2			
만족하는 열린행정	9. 다누리는 복지 영동! 내가 가서 닿을게	7	5(5)	2			
	10. 행정혁신으로 군민 서비스 향상	5	5(4)	-			

점검결과 기준

※ 한국매니페스토실천본부 '전국기초단체장 공약이행 및 정보공개평가' 기준 참조

- ▶ 완 료 : 공약이행이 완료되거나 완료 후 계속 추진하는 사업
- ▶ 정상추진 : 내용이 정상적으로 추진 중이고 임기종료시점까지 이행완료가 되는 사업
- ▶ 일부추진 : 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업
- ▶ 미 착 수 : 사업이 진행되지 않고 추진을 보류하고 있는 사업

3 부서별 공약사업 추진현황

연번	부서명	공약(수)	이행완료	이행후 계속추진	정상추진 (미완료)	비고
	합 계	60	12	29	19	
1	기획감사과	3	0	2	1	
2	미래전략과	4	0	2	2	
3	경 제 과	5	2	2	1	
4	농촌신활력과	3	1	0	2	
5	행 정 과	2	1	1	0	
6	관 광 과	5	1	1	3	
7	국악문화예술과	1	1	0	0	
8	주민복지과	6	0	4	2	
9	가족행복과	9	0	8	1	
10	민 원 과	1	0	1	0	
11	스마트농업과	5	1	2	2	
12	산림녹지과	3	1	0	2	
13	건설교통과	3	1	1	1	
14	재난안전과	1	1	0	0	
15	도시건축과	1	0	1	0	
16	농업기술센터	1	0	0	1	
17	보 건 소	4	0	4	0	
18	체육시설사업소	3	2	0	1	

4 이행완료 공약사업(41건)

관리 번호	공 약 명	담당부서	비고
1-3	로컬푸드 운영 확대 및 직매장 운영	스마트농업과	이행 후 계속추진
1-4	학산면 서부지역 유통시설 현대화 추진	스마트농업과	완료
1-5	물한계곡 임산물 쇼핑센터 건립	산림녹지과	완료
2-1	외국인근로자 전용숙소 리모델링 사업	스마트농업과	이행 후 계속추진
2-3	마을개발 자치사업(1억원) 추진	도시건축과	이행 후 계속추진
2-5	심천면 마을 공영주차장 조성	농촌신활력과	완료
3-2	외식업 소상공인 지원 확대	가족행복과	이행 후 계속추진
3-3	전통시장 활성화	경 제 과	이행 후 계속추진
3-4	전통시장 환경 및 인식개선 추진	경 제 과	이행 후 계속추진
3-5	레인보우영동페이 구매한도 일시적 상향	경 제 과	완료
3-6	황간 일반산업단지 조성 및 기업유치	경 제 과	완료
5-1	관광 컨트롤 타워 조직 설치	행 정 과	완료
5-2	상촌면 물한계곡 주차장 확충 및 정비	관 광 과	완료
5-3	안전한 야영(캠핑) 환경조성	관 광 과	이행 후 계속추진
5-4	2025 영동 세계국악엑스포 유치	국악문화예술과	완료
5-10	송호리 급커브길 선형 개량	건설교통과	완료
6-1	결혼부터 자녀양육까지 1억원 성장 프로젝트	미래전략과	이행 후 계속추진
6-2	장애아동 발달 서비스 지원	주민복지과	이행 후 계속추진
6-3	교재,교구 배달서비스와 놀이선생님 서비스 운영	가족행복과	이행 후 계속추진
6-5	다목적 어린이 체험시설 운영 활성화	가족행복과	이행 후 계속추진
6-6	보육 긴급시스템 구축	가족행복과	이행 후 계속추진
7-1	어린이와 청소년 문화혜택 지원	가족행복과	이행 후 계속추진

7-2	장학생 확대 지원	가족행복과	이행 후 계속추진
7-3	청소년 해외연수 다변화	가족행복과	이행 후 계속추진
7-4	청소년 교육바우처 추진	가족행복과	이행 후 계속추진
7-5	18세 이하 어린이, 청소년, 장애인 버스비 무료 지원	건설교통과	이행 후 계속추진
7-6	아동청소년 전용 익스트림 스포츠장 설치	체육시설사업소	완료
7-7	청소년 길거리 농구, 풋살장 설치	체육시설사업소	완료
8-1	노인 일자리 사업 확대 시행	주민복지과	이행 후 계속추진
8-2	독거노인 공동주거시설 운영	주민복지과	이행 후 계속추진
8-4	어르신 백내장, 무릎 인공관절 수술비 지원	보 건 소	이행 후 계속추진
9-1	다자녀가구, 신혼부부 주택 구입(전세)자금 대출이자 지원	미래전략과	이행 후 계속추진
9-3	요양보호사, 사회복지사, 생활지도사 처우 개선	주민복지과	이행 후 계속추진
9-5	찾아가는 의료서비스 확대	보 건 소	이행 후 계속추진
9-6	군민이 안전한 방역체계 구축	보 건 소	이행 후 계속추진
9-7	스마트 헬스케어 의료지원사업 확대	보 건 소	이행 후 계속추진
10-1	민간협동 군정회의체 신설로 군민의견 군정 적극 반영	기획감사과	이행 후 계속추진
10-2	민관합동 공직감찰 시스템 운영	기획감사과	이행 후 계속추진
10-3	부서장 온라인 회의 개최 및 유튜브 중계	재난안전과	완료
10-4	영동형 스마트데이터 플랫폼 구축	행 정 과	이행 후 계속추진
10-5	원스톱 행정처리 확대 시행	민 원 과	이행 후 계속추진

5 정상추진 공약사업(19건)

관리 번호	공 약 명	24년 목표	24년 주요 추진실적
1-1	[기획감사과] 농업예산 1,500억원으로 확대	▶ 1,300억원 편성	[공약 이행률 : 90%] ▶ 3회추경 농업예산 1,302억원 편성
1-2	[스마트농업과] 스마트농업 육성발전	▶ 단지조성 2개소 ▶ 개별농가 보급 50농가	[공약 이행률 : 35%] ▶ 공모사업 선정 (2개사업) - 지역특화 임대형 스마트팜 - 저탄소에너지 공동이용시설
2-2	[스마트농업과] 농업인 안전재해보험 확대지원	▶ 재해보험 가입자 10,000명	[공약 이행률 : 70%] ▶ 7,747명 가입 완료(누적 15,142명)
2-4	[농촌신활력과] 귀농귀촌인 마을 조성	▶ 공정률 50%	[공약 이행률 : 25%] ▶ 기본계획 수립 및 고시, 주민열람
2-6	[농업기술센터] 북부 농업기계 임대사업장 설치	▶ 사업 대상지 선정 (2개소) ▶ 행정절차 이행	[공약 이행률 : 40%] ▶ 지방재정투자심사 승인 ▶ 공모사업 선정 및 균특회계 선정 (농식품부)
3-1	[관 광 과] 추풍령역 육교 설치	▶ 국비예산확보	[공약 이행률 : 15%] ▶ 기본구상 및 타당성 조사용역 완료
3-7	[경 제 과] 황간 일반산단 투자유치촉진센터 건립	▶ 추진율 40%	[공약 이행률 : 20%] ▶ 조성부지 토지보상금 지급결정 및 보상 협의
4-1	[미래전략과] 영동군 청년센터 건립	▶ 설계공모 ▶ 기본 및 실시설계	[공약 이행률 : 30%] ▶ 기본 및 실시설계 착수 ▶ BF예비인증 신청
4-2	[농촌신활력과] 청년보급자리 임대주택 공급사업	▶ 공정률 50%	[공약 이행률 : 20%] ▶ 지방재정투자심사 완료 ▶ 사업부지 추가매입 및 측량 완료
5-5	[산림녹지과] 민주지산 탐방로 조성사업	▶ 공정률 60%	[공약 이행률 : 60%] ▶ 일상감사 및 충북도 계약심사 완료 ▶ 공사 착공
5-6	[산림녹지과] 백화산 자연휴양림 신규 조성사업	▶ 사업예산확보	[공약 이행률 : 20%] ▶ 사전입지조사 및 타당성평가 완료
5-7	[미래전략과] 양수발전소 주변 산림문화 휴양 명소 조성계획 수립	▶ 기본 및 실시설계 용역 진행	[공약 이행률 : 20%] ▶ 사업대상지 사유지 토지 매입 협의
5-8	[관 광 과] 힐링관광지 전망대 조성	▶ 공정률 40%	[공약 이행률 : 50%] ▶ 실시설계 완료 및 공장 제작 실시
5-9	[관 광 과] 과일나라테마공원 기능 보강	▶ 사전 행정절차 이행 등	[공약 이행률 : 50%] ▶ 기본 및 실시설계 용역 준공 ▶ 체험형 놀이터 조성공사 착공

관리 번호	공 약 명	24년 목표	24년 주요 추진실적
6-4	[가족행복과] 아동·청소년 통합 안심돌봄센터 구축	▶ 센터 운영 실시	[공약 이행률 : 50%] ▶ 다함께돌봄센터 위수탁 계약 체결
8-3	[주민복지과] 남부 4개면 통합 노인복지관 설립	▶ 사업 착공	[공약 이행률 : 15%] ▶ BF시설보완공사 실시설계 준공 ▶ 찾아가는 노인복지관 수요 및 타당성 조사 실시
8-5	[체육시설사업소] 양산면 그라운드골프장 이전 설치	▶ 사업 완료(준공)	[공약 이행률 : 50%] ▶ 공사 착공
9-2	[주민복지과] 영동군 공설 자연장지(수목장림) 조성	▶ 사전절차 완료	[공약 이행률 : 30%] ▶ 사업대상지 조정 ▶ 입지 타당성조사 준비
9-4	[건설교통과] 교통약자 바우처 택시	▶ 예산확보 및 사업시행	[공약 이행률 : 50%] ▶ 카드결제 시스템 개발 협의

1. 기획감사과

- 공약사업수 : 3개 사업
- 추진상황 : 이행완료 2 / **정상추진 1**

1-1 농업예산 1,500억원으로 확대

추진상황	정상추진	이행률(%)	90%	사업구분	계속
완료시기	임기내	완료년도	2026년	추진부서	기획감사과

☐ 사업목표

- 농업예산 확대를 통한 농업경쟁력 강화 및 농가 소득증대 도모

☐ 사업개요

- 임기내 농업예산 1,500억원 이상 확대
 - 미래농업에 대한 투자확대로 농가소득 향상

☐ 추진계획

(단위 : 억원)

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
농업예산	1,100	1,300	1,350	1,400	1,500	

☐ 2024년 추진실적

- 2024 본예산 농업예산 902억원 편성 2024. 1.
- 2024 1회 추경 농업예산 1,172억원 편성 예정 2024. 4.
- 2024 2회 추경 농업예산 1,279억원 편성 2024. 9.
- 2024 3회 추경 농업예산 1,302억원 편성(최종) 2024. 12.

☐ 2024년 주요성과(우수사례 등)

- 2024년 최종 농업예산 1,302억원 편성을 통해 농업경쟁력 강화 및 농가 소득증대에 기여

☐ 문제점 및 대책(공약달성을 위한 방안)

- 해당없음

☐ 향후계획

- 2025년 농업예산 1,400억원 확대편성(최종) 예정
- 2026년 농업예산 1,500억원 확대편성(최종) 예정

2. 미래전략과

- 공약사업수 : 4개 사업
- 추진상황 : 이행완료 2 / **정상추진 2**

4-1 청년센터 건립

추진상황	정상추진	이행률(%)	30%	사업구분	신규
완료시기	임기내	완료년도	2026년	추진부서	미래전략과

□ 사업목표

- 청년센터 건립으로 청년들의 소통·협업·공동체 거점 활동 공간을 제공하며
- 일자리, 교육, 문화·복지, 참여·권리 분야의 다양한 정책을 지원하여 청년 활동 활성화, 청년인구 외부 유출 최소화 유도

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 12. ~ 2026. 03.
- 위 치 : 영동읍 계산리 43-3번지 외 1필지 / 부지면적 2,775㎡
- 총사업비 : 70억원(지방소멸대응기금 44억원, 군비 26억원)
- 건축규모 : 건축연면적 925㎡
 - 상담실, 클래스룸, 스터디룸, 창업 입주공간, 디지털스튜디오, 동아리실, 공유주방, 스포츠룸, 라운지, 다목적 잔디마당

□ 투자계획대비 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구 분	사업비					확보율 (%)
	계	국비	도비	군비	기타	
계획	7,000	-	4,400	2,600	-	
확보	6,300	-	4,400	1,900	-	90%

☐ 2024년 추진실적

- 공공건축 사전검토 완료 2024. 2.
- 공공건축심의회 심의 완료 2024. 3.
- 설계공모 당선작 선정 2024. 5.
- 기본 및 실시설계 착수 2024. 6.
- 착수보고회 개최 2024. 8.
- 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청 2024. 9.
- 건축물 에너지효율등급 예비인증 완료 2024. 11.

☐ 2024년 주요성과(우수사례 등)

- 공공건축물 설계공모를 통해 가장 적합한 설계안을 선정
- 실시설계 착수보고회를 개최하여 설계공모 당선작의 설계내역 설명 및 주요내용 공유, 문제점과 개선방안 도출

☐ 문제점 및 대책(공약달성을 위한 방안)

- 해당없음

☐ 향후계획

- 2025. 2. : 기본 및 실시설계 완료
- 2025. 4. : 계약 체결 및 공사 착공

☐ 관련자료(사진 등)



착수보고회



청년센터 조감도(안)

5-7

양수발전소 주변 산림문화·휴양 명소 조성계획 수립

추진상황	정상추진	이행률(%)	20%	사업구분	계속
완료시기	임기내	완료년도	2026년	추진부서	미래전략과

☐ 사업목표

- 영동 양수발전소 하부댐 주변의 빼어난 자연경관과 풍부한 산림자원을 활용한 관광인프라 구축을 위한 산림문화·휴양 명소 조성계획 수립

☐ 사업개요

- 산림문화·휴양 명소 입지 사전조사 및 기본구상 용역, 기본 및 실시설계 용역
 - 입지 사전조사 및 기본구상, 사업성분석 용역, 지방재정투자심사, 기본 및 실시설계
 - 건축 설계 공모, 사전재해영향성 검토, 입지타당성 평가, 전략 및 소규모환경영향평가 등산림문화 휴양시설 조성계획 수립(30ha)

☐ 투자계획대비 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구 분	사업비					확보율 (%)
	계	국비	도비	군비	기타	
계획	2,000			2,000		
확보	22			22		0.5%

☐ 2024년 추진실적

- 양수발전소 주변 산림문화·휴양명소 사업대상지 토지매입 협의
- 공약사업 변경 검토
 - 양수발전소 건설공사 진행상황을 고려하여 사업기간을 1년 늦추고, 사업실행 가능성 확보를 위해 개방형 산림 문화 휴양 공간 조성으로 사업내용 변경

☐ 문제점 및 대책(공약달성을 위한 방안)

○ 공약사업 변경 검토

- 양수발전소 건설공사 진행상황을 고려하여 사업기간을 1년 늦추고, 사업실행 가능성 확보를 위해 개방형 산림 문화 휴양 공간 조성으로 사업내용 변경

3. 경 제 과

- 공약사업수 : 5개 사업
- 추진상황 : 이행완료 4 / **정상추진 1**

3-7 황간 일반산업단지 투자유치촉진센터 건립

추진상황	정상추진	이행률(%)	20%	사업구분	신규
완료시기	임기내	완료년도	2026년	추진부서	경제과

☐ 사업목표

- 황간 일반산업단지의 준공에 맞춰 체계적 투자유치 활동의 역할을 수행 할 투자유치촉진센터를 건립하여 우수기업 유치 경쟁력 확보

☐ 사업개요

- 위 치 : 충북 영동군 황간면 마산리 일원(황간 산업단지 내)
- 사업기간 : 2024년 ~ 2026년
- 총사업비 : 15억원(도비 5, 군비 10)
- 시 행 자 : 영동군(공공개발)
- 사업내용 : 투자유치촉진센터 건립 1동

☐ 투자계획대비 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구 분	사업비					확보율 (%)
	계	국비	도비	군비	기타	
계획	15	-	5	10	-	
확보	-	-	-	-	-	0%

☐ 2024년 추진실적

- 2024. 09. : 황간일반산업단지 공사착공

☐ **문제점 및 대책(공약달성을 위한 방안)**

- 지방소멸대응기금 등 센터 건립 사업비 확보 추진

☐ **향후계획**

- 2025. 4. : 건축기획업무 용역비 1회 추경 편성
- 2025. 9. : 기본 및 실시설계 용역비 2회 추경 편성
- 2026. 1. : 공사 발주 및 착공
- 2026. 12. : 공사 준공 및 개관

4. 농촌신활력과

- 공약사업수 : 3개 사업
- 추진상황 : 이행완료 1 / **정상추진 2**

2-4 귀농귀촌인 마을 조성

추진상황	정상추진	이행률(%)	25%	사업구분	계속
완료시기	임기내	완료년도	2026년	추진부서	농촌신활력과

☐ 사업목표

- 농촌에 쾌적한 주거공간을 조성하여 귀농귀촌자, 도시민 유입을 촉진하고 농촌활력 및 공동체 활성화 제고

☐ 사업개요

- 위 치 : 양산면 누교리
- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 사 업 비 : 3,000백만원
- 규 모 : 세대수 40호 ~ 50호

☐ 투자계획대비 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구 분	사업비					확보율 (%)
	계	국비	도비	군비	기타	
계획	3,500			3,500		
확보	1,200			1,200		35%

☐ 2024년 추진실적

- 2024. 05. : 누교지구 기본계획(안)변경 접수
- 2024. 06. : 누교지구 기본계획 수립을 위한 각 부서 협의
- 2024. 09. : 누교지구 기본계획 수립 및 고시
- 2024. 10. : 농업·농촌 및 식품산업 정책심의 위원회 심의
- 2024. 12. : 마을정비구역 지정에 따른 주민열람

☐ 2024년 주요성과(우수사례 등)

- 누교지구 기본계획 수립 및 고시
- 농업·농촌 및 식품산업 정책심의 위원회 심의

☐ 문제점 및 대책(공약달성을 위한 방안)

- 건축비의 공모 기준 단가가 낮게 책정되어 공모 선정 사업비 보다 증액 예상
- 연계할 수 있는 공모사업을 발굴하여 정부 지원금 최대 확보

☐ 향후계획

- 2025. 04. : 마을정비구역 지정 및 고시(충청북도지사)
- 2025. 05. : 사업시행계획 수립 및 승인(영동군수)
- 2026. 07. : 마을기반시설 및 대지조성공사 시행 및 완료
- 2026. 08. : 주택건설공사 시행(조합원 시행)

4-2 청년보금자리 임대주택 공급사업

추진상황	정상추진	이행률(%)	20%	사업구분	신규
완료시기	임기후	완료년도	2027년	추진부서	농촌신활력과

☐ 사업목표

- 귀농·귀촌인 등 농촌 청년의 주거부담을 완화하여 안정적인 농촌 정착 지원, 농촌 인구감소 위기에 대응
- 청년센터 건립사업과 연계하여 청년 인재 유출을 방지하고 청년의 정책 참여 등 다양한 활동을 펼칠 수 있는 환경을 제공

☐ 사업개요

- 위 치 : 영동군 영동읍 계산리 51-1, 52-2, 52-3, 53-2
- 사업기간 : 2023 ~ 2027
- 사 업 비 : 9,500백만원
 - 주택기금 : 7,600백만원 (출자 3,700백만원, 융자 3,900백만원)
 - 군 비 : 1,900백만원(토지매입비 1,900백만원 별도)
- 규 모 : 임대주택 1동(지상 4층) 50호

☐ 투자계획대비 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구 분	사업비					확보율 (%)
	계	국비(기금)	도비	군비	기타(융자)	
계획	9,500	3,700	-	1,900	3,900	
확보	1,936	-	-	1,936	-	20%

☐ 2024년 추진실적

- 2024. 02. : 사업부지 추가 매입(2필지)
- 2024. 04. : 도 지방재정투자심사 의뢰
- 2024. 07. : 도 지방재정투자심사 완료
- 2024. 12. : 경계측량 완료

☐ 2024년 주요성과(우수사례 등)

- 2024. 07. : 지방재정투자심사 조건부 승인(도)

☐ 문제점 및 대책(공약달성을 위한 방안)

- 물가상승률 반영 및 「건설기술 진흥법」 제39조의2 및 시행령 제59조의2에 따른 건설사업관리계획(감독권한대행)대상으로 추가 비용 예상
- 비용 상승으로 지방재정투자심사 재심사(30%이상 증액)를 시행할 시 사업기간 연장 예상

☐ 향후계획

- 2024. 01. : 공공건축 사업계획 사전검토
- 2024. 02. : 공공건축심의위원회 심의
- 2025. 04. : 공공건축물 건축기획 완료
- 2025. 05. : 공공건축물 설계공모 진행
- 2025. 09. : 공공건축물 설계자 선정
- 2026. 06. : 기본계획 및 실시설계 완료
- 2026. 07. : 주택건설 사업계획 승인(도)
- 2026. 08. : 공사 착공
- 2027. 06. : 입주자 모집공고
- 2028. 02. : 입주자 최종발표
- 2028. 05. : 공사 준공
- 2028. 10. : 임대주택 입주

5. 관 광 과

- 공약사업수 : 5개 사업
- 추진상황 : 이행완료 2 / **정상추진 3**

3-1 추풍령역 육교 설치

추진상황	일부추진	이행률(%)	15%	사업구분	신규
완료시기	임기내	완료년도	2025년	추진부서	관광과

□ 사업목표

- 추풍령역 일원에 근대문화 유산인 급수탑을 중심으로 자연·생태 개념의 문화공원으로 추풍령 급수탑이 조성되어 있으나 지역주민 및 기차를 이용하는 관광객들이 철로를 횡단하여 공원으로 이동하는 것이 어려움.
- 현재 공원으로 접근은 철도안전법에 근거하여 열차 운용 및 고객 안전상 문제로 철로 횡단 육교 설치가 유일한 대안임.
- 육교 설치 시 공원 접근성이 높아져 지역주민 뿐만 아니라 관광객 수요가 늘어나 공원 활성화 및 지역경제 활성화 기여.

□ 사업개요

- 사업명 : 추풍령역 급수탑공원 육교 설치
- 위치 : 추풍령 급수탑 공원 ~ 추풍령역
- 총사업비 : 40억원(국비 20, 기타 20)
- 사업기간 : 2023. 01. ~ 2025. 12.
- 사업내용 : 보행 육교(L=132.0m, B=4.0m, H=7.0m), 엘리베이터 2대 등

□ 투자계획대비 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구분	사업비					확보율 (%)
	계	국비	도비	군비	기타	
계획	4,000	2,000		2,000		
확보	20	-	-	20	-	1%

☐ 2024년 추진실적

- (2024.01.) 기본 구상 및 타당성조사용역 실시
- (2024.01.) 국가철도공단 방문 업무협의
- (2024.03.) 국가철도공단 방문 업무협의
- (2024.04.) 영동군 → 한국철도공사 검토 요청(공문)
- (2024.04.) 한국철도공사 → 영동군 회신: 조건부 可(공문)
- (2024.06.) 추풍령면 주민설명회(이장) 개최
- (2024.08.) 기본 구상 및 타당성조사용역 완료

☐ 2024년 주요성과

- 기본 구상 및 타당성조사용역 완료

☐ 문제점 및 대책

- 국가철도공단에서는 건널목 개량촉진법에 근거하여 원인자부담 원칙에 따라 공원과의 연결 건널목 등을 설치 시 비용은 지자체에서 부담 의견
- 경부선 추풍령역 이용객들이 열차 탑승을 위해 철도 위를 횡단하여 승강장으로 이동하는 실정이며, 노약자들의 통행이 어렵고 안전사고 위험이 있어 승하차장 연결통로를 설치하는 사업으로 국비 확보를 위해 국회 및 기재부 방문

☐ 향후계획

- 육교 설치를 통해 주민의 안전성 확보와 추풍령 지역경제 활성화를 위한 육교 설치 국비예산 확보를 위해 관련부처 및 국회 협조 요청

5-8 힐링관광지 전망대 조성

추진상황	정상추진	이행률(%)	50%	사업구분	신규
완료시기	임기내	완료년도	2025년	추진부서	관광과

☐ 사업목표

- '25년 개최될 세계국악엑스포와 레인보우 힐링관광지의 랜드마크 조형물로서 군민의 자긍심 향상과 브랜드 가치 제고

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 사업위치 : 영동읍 매천리 산35-1번지 일원
- 사업규모 : 전망대설치 H=40~60m
- 사업내용 : 전망 조형물설치 및 주변 기반시설 설치
- 사 업 비 : 8,000백만원(기금 5,200, 군비 2,800)

☐ 투자계획대비 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구 분	사업비					확보율 (%)
	계	국비	도비	군비	기타	
계획	8,000	5,200		2,800		
확보	6,500	5,200		1,300		81%

☐ 2024년 추진실적

- 2024. 1. : 부대공사 용역(측량,토질) 준공
- 2024. 3. : 전망대(조형물) 구입 공고
- 2024. 5. : 전망대(조형물) 제작·설치사업 계약 및 착수
- 2024. 9. : 전망대 실시설계 및 공장 제작 실시
- 2024. 12. : 전망대 실시설계 설계 완료


☐ 2024년 주요성과

- 전망대(조형물) 제작·설치 추진(공장 제작 중)

☐ 향후계획

- 2025. 1. : 전망대 기반조성공사 착공
- 2025. 3. : 경관조명 및 부대시설(조경 등) 공사 착공
- 2025. 6. : 사업 준공

☐ 관련자료

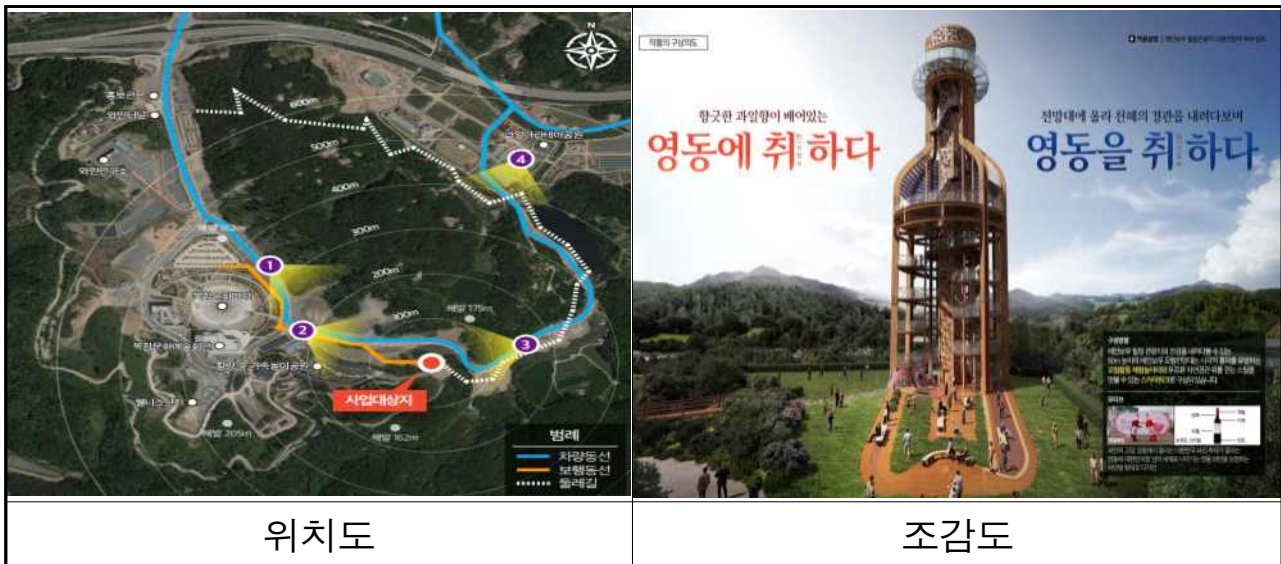

5-9 과일나라테마공원 기능 보강

추진상황	정상추진	이행률(%)	50%	사업구분	신규
완료시기	임기내	완료년도	2025년	추진부서	관광과

☐ 사업목표

- 과일나라테마공원의 편의시설 보강으로 방문객 만족도를 향상시키고 시설물 보완으로 테마공원의 효율적인 운영

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 사업비 : 2,000백만원(도비 491 군비 1,509)
- 사업규모 : 과일나라테마공원(87,170㎡)
- 사업내용 : 콘텐츠 개발 및 운영프로그램 리뉴얼, 시설물 보완, 신규 시설물 설치

☐ 투자계획대비 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구분	사업비					확보율 (%)
	계	국비	도비	군비	기타	
계획	2,000	491		1,509		
확보	855		491	364		42.75%

☐ 2024년 추진실적

- 2024. 2. : 기능보강사업(체험형 어린이 놀이터) 계획 수립
- 2024. 3. : 체험형 어린이 놀이터 조성 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2024. 9. : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2024. 9. : 체험형 놀이터 조성 및 조합놀이대 설치 용역 입찰 중
- 2024. 11. : 공사착공

☐ 향후계획

- 2025. 3. : 과일나라 테마공원 체험형 놀이터 준공

6. 주민복지과

- 공약사업수 : 6개 사업
- 추진상황 : 이행완료 4 / **정상추진 2**

8-3 남부 4개면 통합 노인복지관 설립

추진상황	정상추진	이행률(%)	15%	사업구분	신규
완료시기	임기내	완료년도	2025년	추진부서	주민복지과

☐ 사업목표

- 황간면 노인복지회관(황간면 노인회분회)을 증축하여 남부 4개면 어르신들이 이용할 수 있는 노인복지관 분원을 설립

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12. 31.
- 사업위치 : 황간면 남성리 624번지(황간면 노인복지회관)
- 사 업 비 : 1,000백만원(전액 군비)
- 사업내용 : 증축 336㎡ (리모델링 포함) 1식

☐ 투자계획대비 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구 분	사업비					확보율 (%)
	계	국비	도비	군비	기타	
계획	1,000			1,000		
확보	110			110		11%

☐ 2024년 추진실적

- 2024. 3. : 황간면 노인복지회관 BF시설보완공사 설계용역 준공
- 2024. 9. : 수요 및 타당성 조사 ‘찾아가는 노인복지관 교육프로그램 추진’

☐ 문제점 및 대책(공약달성을 위한 방안)

- 분원설립의 수요부족, 중복사업에 따른 실효성 결여 및 지속운영 예산의 과다로
‘지역어르신을 찾아가는 노인복지관’ 으로 공약 변경

☐ 향후계획

- 공약실천계획 변경 확정 : 2025. 2.
- 찾아가는 노인복지관 운영 : 2025. 3. ~

9-2 영동군 공설 자연장지(수목장림) 조성

추진상황	정상추진	이행률(%)	30%	사업구분	신규
완료시기	임기내	완료년도	2026년	추진부서	주민복지과

☐ 사업목표

- 군민들에게 추모와 휴식이 공존하는 주민친화 공설 자연장지 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 영동군 일원
- 사업기간 : 2024년 ~ 2026년(3년)
- 사업규모 : 수목장 등 추모공원 조성 1식
- 총사업비 : 5,022백만원(국비 70%, 도비 15%, 군비 15%)
- 주요내용 : 봉안당 및 자연장지(수목장림 등) 시설 조성

☐ 투자계획대비 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구 분	사업비					확보율 (%)
	계	국비	도비	군비	기타	
계획	5,022	3,500	750	772		
확보	22			22		0.4%

☐ 2024년 추진실적

- 공공건축심의·의결(봉안당) : 2024. 2.
- 심천면 명천리주민설명회 개최 : 2024. 2.
- 기본 및 실시설계용역 계약 의뢰 : 2024. 2.
- 명천4길 반대주민 민원제기 : 2024. 3.
- 사업부지 변경을 위한 수요조사 실시 : 2024. 10.
- 신규 사업대상후보지 검토 중 : 2024. 12.

□ 2024년 주요성과(우수사례 등)

- 기존 사업부지 주민의 집단민원으로 사업대상지 변경이 불가피함에 따라 신규 사업부지 수요조사 신청지와 추천지 및 군유지 검토를 통해 입지 타당성 조사 후보지 6개소 선정하여 차질 없는 장사시설 조성 노력

□ 문제점 및 대책(공약달성을 위한 방안)

- 혐오적인 시각이 존재하여 이미지 훼손 및 지가 저평가 우려 등 기피 시설로 인식되어 집단민원 발생 등 대상지 마련 난항
- 새로운 후보지 입지타당성 조사 용역 완료 후 신규 대상지 확정 결과에 따라 사업기간, 사업규모, 총사업비 등 변경 추진
- 추모 공원의 자연 친화적인 공간 구성 및 명칭 순화 등을 통해 인식개선을 꾀하고, 신규 대상지 주변 마을 주민에 대한 실질적 인센티브 마련

□ 향후계획

- 공설 추모공원 입지분석 및 사업대상지 확정 : 2025. 01. ~ 04.
- 주민공청회 및 사전행정절차 이행 : 2025. 05. ~ 11.
- 기본계획 및 기본설계, 토지보상 결정 : 2026. 01. ~ 06.
- 2027년 장사시설 조성 국비 신청(보건복지부) : 2026. 03.
- 실시설계 : 2026. 06. ~ 10.
- 공사착공 : 2026. 10.

7. 가족행복과

- 공약사업수 : 9개 사업
- 추진상황 : 이행완료 8 / **정상추진 1**

6-4 아동·청소년 통합 안심돌봄센터 구축

추진상황	정상추진	이행률(%)	50%	사업구분	신규
완료시기	임기내	완료년도	2024년	추진부서	가족행복과

☐ 사업목표

- 다자녀가구 및 맞벌이 가정 아동에게 안심 돌봄서비스 제공
- 안심 돌봄 센터를 구축하여 초등 돌봄 사각지대 해소

☐ 사업개요

- 방과 후 돌봄 아동을 위한 안심 돌봄 센터 구축 및 운영
 - 황간면SOC 다함께돌봄센터
 - 영동국민건강체육센터SOC 다함께돌봄센터

☐ 투자계획대비 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구 분	사업비					확보율 (%)
	계	국비	도비	군비	기타	
계획	358	200	63	95		
확보	391	235	78	78		100%

☐ 2024년 추진실적

- (2024. 6.) 영동군다함께돌봄센터1호점 민간위탁 계획 수립
- (2024. 9.) 영동군다함께돌봄센터1호점 민간위탁 의회 동의
- (2024. 12.) 영동군다함께돌봄센터1호점 민간위탁 수탁자 심의회
- (2024. 12.) 영동군다함께돌봄센터1호점 수탁자 선정 공고
- (2024. 12.) 영동군다함께돌봄센터1호점 리모델링 계약 및 착공
- (2024. 12.) 영동군다함께돌봄센터1호점 위·수탁 계약 체결

☐ 2024년 주요성과(우수사례 등)

- 영동군다함께돌봄센터1호점의 민간위탁 계약체결 및 리모델링 계약으로 운영을 위한 기반 마련

☐ 문제점

- 국민건강체육센터의 개소가 지연되어 다함께돌봄센터1호점의 운영이 늦어짐

☐ 향후계획

- 황간면SOC 다함께돌봄센터 2호점의 예산(설치비, 인건비, 운영비 등) 확보하여 2026년 리모델링 사업 착수

8. 스마트농업과

- 공약사업수 : 5개 사업
- 추진상황 : 이행완료 3 / **정상추진 2**

1-2 스마트농업 육성발전

추진상황	정상추진	이행률(%)	35%	사업구분	신규
완료시기	임기내	완료년도	2026년	추진부서	스마트농업과

☐ 사업목표

- 임대형 스마트팜 조성으로 스마트농업에 도전하는 청년들의 재배역량 향상, 농업경영 기회 제공 및 인구소멸 위기 대응
- 농업의 자동화·정밀화·무인화 등 스마트농업을 통해 농가소득 증대 및 지역경제 활성화 도모

☐ 사업개요

- 1,016억원 / 단지(팜) 조성 6개소[118ha] 조성, 개별농가 ICT시설 지원 200개소
 - 경영실습 임대농장 조성 : 2개소 [16.7억(국3, 도0.4, 군3.3, 특조10) / 1.5ha]
 - 영동 알천터 스마트팜단지 조성 : 1개소 [55억(군25, 특조30) / 2.1ha]
 - 지역특화(청년) 임대형 스마트팜 조성 : 1개소 [200억(국140,도30,군30) / 5.0ha]
 - 노지(포도) 스마트단지 조성 : 1개소[315억 / 80.2ha]
 - 스마트농업 육성단지 조성 : 1개소[390억 / 30ha]
 - 개별농가 스마트농업 보급 지원사업 : 200개소, 40억원

☐ 투자계획대비 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구 분	사업비					확보율 (%)
	계	국비	도비	군비	기타	
계획	101,600	52,800	9,800	34,700	4,300	
확보	16,421	3,100	4,639	8,072	600	16.0%

□ 2024년 추진실적

○ 경영실습 임대농장 조성사업 추진

- 시설공사비(토목공사 및 온실CT 설계변경) 추경 반영(2억원)
- 청년농업인 임차인 공고 및 모집 완료(2명)
- 시설공사 준공(10월) 및 임대온실 운영(딸기 재배)

○ 영동 알천터 스마트팜단지 조성사업 추진

- 알천터 스마트팜 세부설계용역 준공(10월) 및 운영계획서 작성
- 본공사(건축, 토목, 전기, 통신) 조달계약 및 착공(12월)

○ 영동 지역특화 스마트팜 복합단지 조성(2개 사업)

- ▶ 지역특화(청년) 임대형 스마트팜 단지 조성(공모사업)
- ▶ 청년 임대 일라이트 스마트팜 단지 조성(2024년도 지방소멸대응기금)
- 24년 ~ 26년 지역특화 임대형 스마트팜 단지 공모사업
 - ※ 공모사업 신청(2.7), 발표평가(2.22), 선정 확정(2. 26.) / 국도비 170억 확보
- 지방소멸대응기금 A등급 확정(40억 확보)
- 스마트팜 복합단지 조성(2개 사업) 일괄 위수탁(영동군 ↔ 한국농어촌공사)
- 기본계획 및 세부설계 용역업체 선정(농어촌공사, 6월)
- 지역특화 기본계획 승인 완료(농림축산식품부, 8월), 세부설계 추진
- 지장물 철거공사 추진 및 문화재 표본조사 실시
- 지역특화 스마트팜 공기관 대행사업비 교부(1차/ 28억-한국농어촌공사)
- 일라이트 스마트팜 공기관 대행사업비 교부(1,2차/ 53.4억-한국농어촌공사)

○ 저탄소에너지 공동이용시설 지원(공모사업) 추진

- 24년 ~ 25년 저탄소에너지 공동이용 지원시설 공모사업
 - ※ 24년 공모사업 신청(8월), 현장,발표평가(8월), 선정 확정(9월) / 국도비 34억원 확보

○ 2024년 개별농가 스마트농업 보급 지원사업 추진 : 50명, 1,000백만원

- 보조금 교부결정 및 사업추진 중(48농가 완료)
- 개별농가 스마트농업 보급 지원사업 참여자 현장교육 추진

○ 그 외 추진사항

- 스마트농업 육성발전 전략사업 추진을 위한 4대 혁신밸리(고흥군, 상주시) 시설 견학
- 저탄소에너지공동이용시설 공모사업 전략적 준비(공모 당선)
- 영동군 스마트농업 발전방안 마련을 위한 정부의 스마트팜 확산 정책 및 발전방향 교육 추진(60명 교육참여)
- 영동군 스마트농업 발전방안 마련을 위한 『(사)충북경제포럼 영동군 세미나』 개최
- 스마트농업 육성지구지정 공모사업 전략적 준비(공모 미선정)

□ 2024년 주요성과(우수사례 등)

○ 2024 ~ 2026년 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업

➡ 경쟁률 5:1 [접수 : 5개소, 선정 : 1개소] / **국비 140억원 확보**

사 업 개 요

- 사업위치 : 충북 영동군 양산면 가곡리 679번지 일원
- 사업기간 : 2024. 03. ~ 2026. 12.(3년간)
- 총사업비 : 246억원 (국비 140, 도비 30, 군비 76)
- 주요내용 : 기반조성 6.3ha, 온실 4ha, 지원센터 및 선별장 등

○ 2025 ~ 2026년 저탄소에너지공동이용시설 지원사업

➡ 경쟁률 3:1 [접수 : 3개소, 선정 : 1개소] / **국비 30억원 확보**

사 업 개 요

- 사업위치 : 충북 영동군 양산면 가곡리 679번지 일원
- 사업기간 : 2025. 01. ~ 2026. 12.(2년간)
- 총사업비 : 43억원 (국비 30, 도비 4, 군비 9)
- 주요내용 : 영동 지역특화 스마트팜 복합단지에 지열냉난방시설 설치

○ 2025년 농업계학교 실습장 지원사업

➡ 경쟁률 2.4:1 [접수 : 12개소, 선정 : 5개소] / **국비 5억원 확보**

사 업 개 요

- 사업위치 : 영동산업과학고등학교
- 사업기간 : 2025. 01. ~ 2025. 12.(1년간)
- 총사업비 : 5억원 (국비 100%)
- 주요내용 : 스마트팜 테스트베드 설치 지원

□ 문제점 및 대책

○ 스마트팜 단지 대규모 사업비(583억원) 투입에 대한 군비 부담(292억원)

- 국비 공모사업을 연이어 확보하였으나 대규모 군비투입이 불가피

➡ 사업추진 규모, 예산상황 등을 감안하여 향후 대규모 신규시설 투자 사업은 지양하고, 진행중인 사업에 대한 내실화 중점 추진

※ 공약사업 실천계획 변경 추진 (당초 : 1,016억원 ⇒ 변경 : 643억원)

☐ 향후계획

- 2025.01. : 알천터 스마트팜 단지 조성사업(건축) 착공
- 2025.03. : 지역특화 복합단지 세부설계용역 준공 및 시행계획(사업인정) 고시
- 2025.05. : 지역특화 스마트팜 복합단지 조성 본공사 착공
- 2025.06. : 알천터 스마트팜 단지 조성사업 임대농 선발(3인)
- 2025.11. : 알천터 스마트팜 단지 조성사업 준공

☐ 관련자료(조감도)

	
<알천터 스마트팜 단지>	<지역특화 스마트팜 복합단지>

2-2 농업인 안전재해보험 확대지원

추진상황	정상추진	이행률(%)	70%	사업구분	신규
완료시기	임기내	완료년도	2026년	추진부서	스마트농업과

☐ 사업목표

- 농작업 중 발생하는 신체상해를 보상함으로써 농업인과 농작업 근로자를 보호
- 생활안정 도모 및 사회안전망 구축으로 안심하고 일할 수 있는 농업환경 조성

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 총사업비 : 8,379백만원(국비 50%, 도비 5%, 군비 35%, 자부담 10%)
- 사업내용 : 가입자수 10,000명/년 확보
 - 피보험자당 주계약 보험료 지원(보험료는 가입자당 1구좌 지원)
 - 실손보험 가입자는 상해·질병치료 급여금 부(不)담보형으로 가입

☐ 투자계획대비 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구 분	사업비					확보율 (%)
	계	국비	도비	군비	기타	
계획	8,379	4,189	421	2,760	1,009	
확보	4,974	2,428	239	1,560	747	59%

☐ 2024년 추진실적

- (2024. 01.) 농협 및 농업기술센터 등 협조체계 구축
- (2024. 01.) 군비 25% 추가지원 중점 홍보
- (2024. 02.) 읍면 및 각 지역농협 홍보
- (2024. 07.) 미가입자 가입 독려(읍·면 및 각 지역농협 홍보)
- (2024. 12.) 안전보험 7,447명 가입 완료

☐ 2024년 주요성과

- 군비 25% 추가 지원을 통해 농업인의 경제적 부담을 경감하고, 보험 가입률을 상승시킴
- 2023년 기준 농업인 15,613명 중 7,447명 가입, 전체 농업인의 약 47.7%가 보험에 가입
- 농작업 중 발생 가능한 사고에 대비하여 사회안전망을 강화하고 농업인들의 안정적인 작업 환경을 조성

☐ 문제점 및 대책

- 일부 농업인들에게 보험의 필요성과 혜택이 충분히 홍보되지 않아 미가입자 발생
 - ➡ 팜플렛, 현수막, 마을 방송 등 다양한 홍보 채널을 활용하여 보험의 중요성과 혜택을 적극 알림

☐ 향후계획

- 2025.01. : 미가입 농업인을 대상으로 지역별 맞춤형 홍보 자료 배포
- 2025.03. : 가입률 분석 및 취약 지역 집중 홍보 전략 수립
- 2025.05. : 농업 관련 행사와 연계한 홍보 캠페인 진행
- 2025.06. : 미가입자 가입 독려(읍·면사무소 및 농협 연계)
- 2025.11. : 가입률 목표 달성 여부 점검 및 추가 지원 검토

9. 산림복지과

- 공약사업수 : 3개 사업
- 추진상황 : 이행완료 1 / **정상추진 2**

5-5 민주지산 탐방로 조성사업

추진상황	정상추진	이행률(%)	60%	사업구분	신규
완료시기	임기후	완료년도	2025년	추진부서	산림복지과

☐ 사업목표

- 영동군 상촌면 지역의 자연자원과 연계한 숲길 조성으로 숲길 이용객들에게 산림복지서비스 제공
- 100대 명산 민주지산에 위치한 옥소폭포, 음주암폭포등을 연결하는 탐방로 조성으로 숲길문화확대

☐ 사업개요

- 사업위치 : 영동군 상촌면 물한리 산50-1번지 일원(민주지산)
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2025. 12.
- 총사업비 : 3,020백만원(균특이양 1500, 도비 450, 시군비 1,070)
- 사업내용
 - 탐방로 개설, 출렁다리 및 데크로드 설치, 쉼터조성등

☐ 투자계획대비 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구 분	사업비					확보율 (%)
	계	국비	도비	군비	기타	
계획	3,020	1,500	450	1,070		
확보	1,600	-	1,040	560		52%

☐ 2024년 추진실적

- (2024.4.) 영동군 일상감사 완료
- (2024.5.) 도 계약심사 완료
- (2024.7.) 공사 착공
- (2024.12.) 동절기 공사 일시정지

☐ **문제점 및 대책(공약달성을 위한 방안)**

- 동절기 공사 정지 및 관급공사(조형물 및 안내판 설치) 계약방법 검토로 마무리하지 못한 24년도 사업을 25년도 사업과 병행하여 추진

☐ **향후계획**

- 2025. 1. ~ 2. : 24년도 관급공사(조형물 및 안내판 설치) 협상에 의한 계약 추진
- 2025. 3. ~ 8. : 24년도 사업(이월) 및 25년도 사업 추진

5-6 백화산 자연휴양림 신규 조성사업

추진상황	정상추진	이행률(%)	20%	사업구분	신규
완료시기	임기후	완료년도	2027년	추진부서	산림복지과

☐ 사업목표

- 체험·휴양·문화·치유·힐링 등 복합 건강 휴양지 조성
- 산림자원을 활용한 관광휴양시설 확충하여 지역경제 활성화

☐ 사업개요

- 사업위치 : 영동군 황간면 우매리 산57번지 일원
- 사업기간 : 22. 7. ~ 27. 12.
- 총사업비 : 8,700백만원(도비 6,450 군비 2,250)
- 사업내용
 - 숲(자연)으로 돌아가는길, 숲체험원, 숲공유 명상원
 - 치유형 숙박 및 편의시설(포레스트 쉼어빌), 관리사 및 안내시설

☐ 투자계획대비 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구 분	사업비					확보율 (%)
	계	국비	도비	군비	기타	
계획	8,700		6,450	2,250		
확보	80	-	-	80	-	1%

☐ 2024년 추진실적

- 2024. 1. : 2024년 제1차 지방재정 투자심사 철회
- 2024. 3. : 2024년 제3차 지방재정 투자심사 의뢰서 검토회의
- 2024. 6. : 사전입지조사 및 타당성 평가 용역보고서 1차 검토회의
- 2024. 9. : 사전입지조사 및 타당성 평가 용역보고서 완료

☐ 2024년 주요성과(우수사례 등)

- 백화산 자연휴양림 조성 사전입지조사 및 타당성 평가 용역 완료
 - 5개 평가부문 3개 항목을 조사 평가한 결과, 총 평점 150점으로 적지 판정기준(120점) 이상이므로 승인이 적절하다고 판단됨

☐ 문제점 및 대책(공약달성을 위한 방안)

- 2025년 상반기 내 자연휴양림 지정고시를 위해 산림청 및 환경부 협의 긴급 추진 예정

☐ 향후계획

- 2025. 6. : 자연휴양림 지정고시 신청

10. 건설교통과

- 공약사업수 : 3개 사업
- 추진상황 : 이행완료 2 / **정상추진 1**

9-4 교통약자 바우처 택시

추진상황	정상추진	이행률(%)	50%	사업구분	신규
완료시기	임기내	완료년도	2025년	추진부서	건설교통과

☐ 사업목표

- 임산부 바우처 택시를 운영하여, 교통약자인 임부 및 출산 후 24개월 이내 산부 가정의 원활한 출산과 육아 지원
- 바우처 택시 운영으로 거동불편 장애인 중 비휠체어 장애인의 이동권 보장

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2024. 3. ~
- 사업내용 : 영동군에 주민등록을 둔 임산부(임부 및 출산 후 24개월 이내 산부) 가정(유아 동반) 및 거동 불편 장애인 대상으로 택시 바우처 지원

☐ 투자계획대비 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구 분	사업비					확보율 (%)
	계	국비	도비	군비	기타	
계획	3,500			3,500		
확보	500	-	-	500	-	14%

☐ 2024년 추진실적

- 2024. 03. ~ 현재 : 교통약자 바우처 택시 카드결제 시스템 개발 협의

□ 문제점 및 대책(공약달성을 위한 방안)

○ 소프트웨어진흥법, 판로지원법 등 관련법 저촉으로 (주)마이비와 계약 불가

* 소프트웨어진흥법 시행령 제44조 : 소프트웨어사업 계약 체결 경우
협상에 의한 계약 및 경쟁적 대화에 의한 계약 체결하여야 함

** 판로지원법 제7조 : 중소기업자간 경쟁제품에 대하여는 중소기업자 간
경쟁입찰에 따라 조달계약 체결

→ 통합콜 시스템 구축업체 및 계약팀과 시스템 개발 협의중

□ 향후계획

- 교통약자 바우처 시스템 구축 업무협약 : '25. 1.~2.
- 2회추경 예산 편성 : '25. 4.
- 교통약자 바우처 시스템 구축 계약 체결 : '25. 5.
- 신청 홍보 및 접수 : '25. 5. ~ 6.
- 교통약자 바우처 택시 시행 : '25. 7.

12. 농업기술센터

- 공약사업수 : 1개 사업
- 추진상황 : **정상추진 1**

2-6 북부 농업기계 임대사업장 설치

추진상황	정상추진	이행률(%)	40%	사업구분	신규
완료시기	임기내	완료년도	2025년	추진부서	농업기술센터

☐ 사업목표

- 용산면, 심천면 농업인에 농업기계 임대 행정 서비스 제공
- 북부지역 농업특성에 맞는 임대사업장 설치로 농업환경 개선

☐ 사업개요

- 사업명 : 북부 농업기계 임대사업장 설치사업
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2025. 12.
- 위치 : 영동군 북부지역(용산면, 심천면)
- 사업량 : 임대사업장 설치 2개소
- 소요예산 : 5,000백만원(국비 950, 도비 225, 군비 3,825)
- 사업내용 : 토지매입, 임대사업장 건축, 농업기계 구입

☐ 투자계획대비 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구분	사업비					확보율 (%)
	계	국비	도비	군비	기타	
계획	5,000	950	225	3,825		
확보	612	-	-	600		12%

☐ 2024년 추진실적

- (2024. 2.) 농식품부, 법제처 임대사업장 설치 법령 관련 면담
농진청 농촌지도기반조성 공모
- (2024. 3.) 임대사업장 설치 변경안 업무보고
용산면 구촌리 227, 심천면 심천리 435번지(토지 매도 의향서 접수)
국·도비 예산 확보 협의(농림부, 충북 스마트농산과, 기술원)

- (2024. 4.) 임대사업장 설치 추진계획 변경
- (2024. 5.) 공유재산심의 원안가결
- (2024. 8.) 지방재정투자심사 승인
- (2024. 10.) (용산면)2025 지역균형발전특별회계 선정(사업비10억원)
(심천면)2025 농식품부 농기계 임대사업 선정(사업비9억원)
감정평가 및 토지매입
- (2024. 12.) 공공건축심의

☐ 2024년 주요성과(우수사례 등)

- 북부 임대사업장 2개소 공모사업 선정(국·도비 확보)
 - (용산면) 2025 농촌진흥청 농촌지도기반 조성사업 선정(10억원)
 - (심천면) 2025 농림축산식품부 농기계 임대사업 설치사업 선정(9억원)

☐ 문제점 및 대책(공약달성을 위한 방안)

- 관리·운영 : 시간선택제임기제(2명), 기간제(4명) 등 인력 활용
 - 농업기계화촉진법 시행규칙 제2조의6에 따라 수리인력 3명 이상 상근(개소당)
 - 영동군 기간제근로자 운용(채용)계획 반영 협조 → 행정과

☐ 향후계획

- 2025. 1. ~ 5. : 공공건축심의 및 실시설계
- 2025. 6. ~ 12. : 착공 및 준공

☐ 관련자료(사진 등)

		
예산확보 협의(충북도청)	예산확보 협의(충북농업기술원)	예산확보 협의(농식품부)

14. 체육시설사업소

- 공약사업수 : 3개 사업
- 추진상황 : 이행완료 2, **정상추진 1**

8-5 양산면 그라운드골프장 이전 설치

추진상황	정상추진	이행률(%)	50%	사업구분	신규
완료시기	임기내	완료년도	2025년	추진부서	체육시설사업소

☐ 사업목표

- 하천구역 內 기존 “그라운드골프장” 의 상습 침수로 이용자의 위험성과 불편함 상존하여 양산면 “그라운드골프장” 이용자의 편의 제공을 위한 이전 설치 추진

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 위 치 : 양산면 송호리 304-1번지 일원
- 사 업 비 : 1,990백만원(국비 402, 도비 469, 군비 1,119)
- 사업내용 :
 - 그라운드골프장(80×30m), 주차장 및 부대시설 등(2,500㎡)
 - 클럽사무실(지상1층, 약 200㎡), 주차장(29면) 및 부대시설 등

☐ 투자계획대비 예산확보실적

(단위 : 백만원)

구 분	사업비					확보율 (%)
	계	국비	도비	군비	기타	
계획	1,990	402	469	1,119		
확보	2,100	-	871	1,229		100%

☐ **2024년 추진실적**

- (2024. 02.) 기본 및 실시설계용역 준공
- (2024. 04.) 일상감사 완료
- (2024. 07.) 공사 계약
- (2024. 09.) 공사 착공

☐ **향후계획**

- (2025. 05.) 공사 준공

☐ **관련자료**



현장 사진
